



INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
(01 abril al 30 junio de 2025)

PROYECTO 7638
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE
APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C

ANDRES IVANNO GALEANO TORO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Elaborado por:

Luis Alberto Cantor – Contratista DDE
María Ayde Jiménez Porras – Contratista DCCEE
Miller Antonio Cifuentes Largo – Contratista DCCEE

JUNIO DE 2025

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.1. <i>Objetivo General</i>	4
1.2. <i>Objetivos Específicos</i>	4
2. ALCANDE DEL PROYECTO	4
3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA.....	5
3.1. <i>Ejecución presupuestal acumulada.....</i>	5
3.2. <i>Ejecución presupuestal por actividad - componente</i>	7
3.3. <i>Ejecución de reservas presupuestales</i>	9
3.4. <i>Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto</i>	10
4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	11
4.1 <i>Objetivo Específico 1.</i>	12
4.1.1 <i>Producto</i>	12
4.1.1.1 <i>Metas proyecto asociadas al objetivo</i>	12
4.2 <i>Objetivo Específico 2.</i>	13
4.2.1 <i>Producto</i>	13
4.2.1.1 <i>Metas proyecto asociadas al objetivo</i>	14
4.3 <i>Objetivo Específico 3.</i>	14
4.3.1 <i>Producto</i>	15
4.3.1.1 <i>Metas proyecto asociadas al objetivo</i>	15
5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	16
5.1. <i>Meta Plan 2258. Mejoramientos.....</i>	16
5.2. <i>Meta Plan 2257. Colegios Nuevos.....</i>	17
5.3. <i>Meta Plan 2256. Colegios Restituidos</i>	18
6. CONCLUSIONES.....	19

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Ejecución Presupuestal 2025	6
Ilustración 2: Ejecución Presupuestal abril a junio 2025	6
Ilustración 3: Ejecución Presupuestal por Componente.....	9
Ilustración 4: Ejecución Reservas Presupuestales	10

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Presupuesto Inicial 2025.....	5
Tabla 2: Ejecución Presupuestal abril a junio 2025	6
Tabla 3: Ejecución Reservas Presupuestales	9
Tabla 4: Plan de Adquisiciones abril a junio 2025	11
<i>Tabla 5: Productos</i>	12
<i>Tabla 6: Productos</i>	13
<i>Tabla 7: Productos</i>	15
Tabla 8: Metas plan de desarrollo.....	16
Tabla 9: Metas plan de desarrollo.....	18
Tabla 10: Metas plan de desarrollo	19

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incorporar los objetivos del proyecto.

1.1. Objetivo General

Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.

1.2. Objetivos Específicos

- Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.
- Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbanas y rurales.
- Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

2. ALCANDE DEL PROYECTO

Con este proyecto se fortalecerá y dotará la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general, cuenten con espacios educativos dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y el acceso a la educación. El proyecto de desarrolla a través de cinco (5) objetivos específicos asociados a:

- 1. Construcción y terminación:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de construcción, restitución, y ampliación, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje.
- 2. Mejoramiento (conservación):** mediante las acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura se priorizará y desarrollaran intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la necesidad, riesgo y población beneficiada, así como el mejoramiento de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se puedan presentar, garantizando la continuidad del servicio, y en los casos requeridos, la reubicación de la población escolar, en sedes alternas alquiladas, durante la ejecución de las obras, en atención al principio de programación integral de la inversión, así como el aseguramiento de los bienes inmuebles de la SED.

Todo esto bajo el principio de optimización de los recursos destinados para estas actividades.

3. **Dotación:** desde este componente se atenderán las necesidades de colegios y áreas administrativas, de igual forma, se adelantarán acciones orientadas a garantizar las dotación y renovación de los elementos requeridos y necesarios para atender el aumento de cobertura en los distintos niveles de educación, así como la compra y entrega de dispositivos tecnológicos y de conectividad, de los cuales se beneficiarán los estudiantes más vulnerables de la ciudad, aportando así a la disminución de la brecha digital de la comunidad educativa de la ciudad. De otra parte, se garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar las dotaciones adquiridas por la SED.
4. **Colegios Nuevos:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de obra nuevos, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje
5. **Colegios Restituidos:** en este componente se adelantarán acciones de estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de restitución de sedes existentes, buscando mejorar la calidad de infraestructura y fortalecer los ambientes de aprendizaje.

3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1. Ejecución presupuestal acumulada

En el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, se ejecuta el Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá”, el cual inició su ejecución presupuestal el 1 de enero de 2025 con una asignación de \$416,453,259,000, distribuidos de la siguiente manera:


- 02 MEJORAMIENTOS \$70,940,352,000
- 03 DOTACIONES \$108,797,468,000
- 04 COLEGIOS NUEVOS \$184,513,370,000
- 05 COLEGIOS RESTITUIDOS \$52.202.069.000

Tabla 1: Presupuesto Inicial 2025

PRESUPUESTO VIGENCIA 2025	
Componente	Vigente
Mejoramientos	\$70,940,352,000
Dotaciones	\$108,797,468,000
Colegios nuevos	\$184,513,370,000
Colegios restituidos	\$52,202,069,000
TOTALES	\$416,453,259,000

Fuente: SED – DCCEE - DDE

Ilustración 1: Presupuesto inicial vigencia 2025

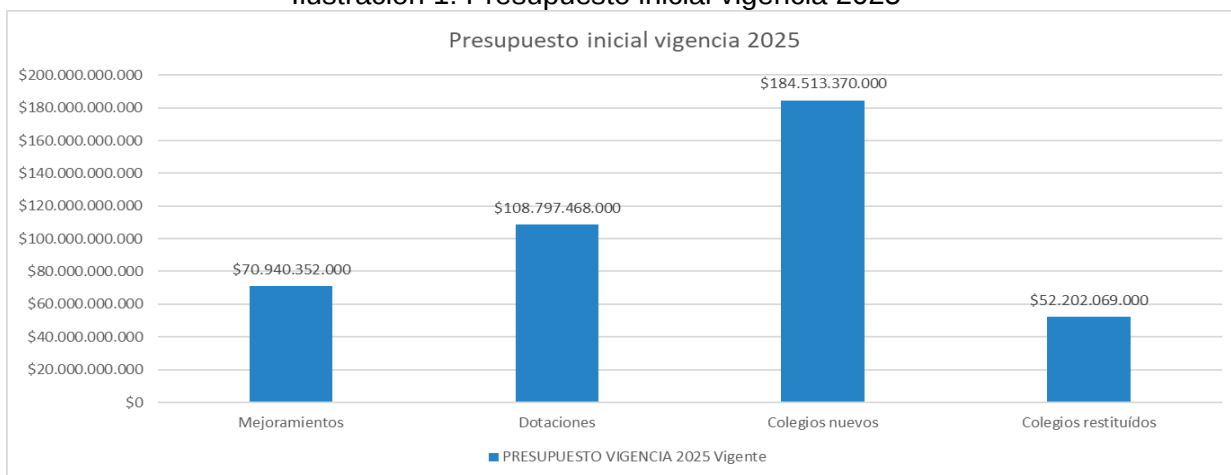

Fuente: SED – DCCEE - DDE


Con relación a la ejecución presupuestal del trimestre comprendido entre abril y junio de 2025, se tiene una distribución así:

Tabla 2: Ejecución Presupuestal abril a junio 2025

PRESUPUESTO VIGENCIA 2025 Abril a Junio 2025			
Componente	Vigente	Comprometido	Girado
Mejoramientos	\$70.940.352.000	\$9.507.807.752	\$4.893.766.903
Dotaciones	\$108.797.468.000	\$45.155.830.059	\$6.519.574.567
Colegios nuevos	\$184.513.370.000	\$129.366.728.810	\$121.062.644.208
Colegios restituidos	\$52.202.069.000	\$46.540.422.532	\$16.760.710.796
TOTALES	\$416.453.259.000	\$230.570.789.153	\$149.236.696.474

Fuente: SED – DCCEE - DDE

Ilustración 2: Ejecución Presupuestal abril a junio 2025

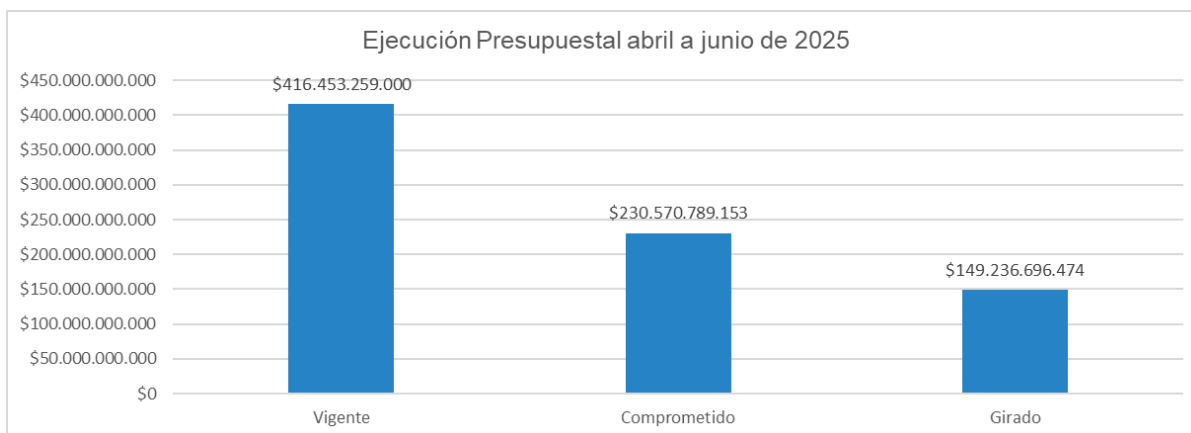

Fuente: SED – DCCEE -DDE

Por otro lado, para los meses de abril a junio 2025 no se realizaron modificaciones presupuestales al proyecto de inversión.

3.2. Ejecución presupuestal por actividad - componente

Durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2025, la ejecución presupuestal del proyecto 7638 se desarrolló a través de cuatro componentes:

- 02 Mejoramientos
- 03 Dotaciones
- 04 Colegios Nuevos
- 05 Colegios Restituidos

Al 30 de junio de 2025, la ejecución por componente fue la siguiente:

- Mejoramientos: 13%
- Dotaciones: 42%
- Colegios Nuevos: 70%
- Colegios Restituidos: 89%

En total, se realizaron giros por un valor de \$149.236.696.474, como se detalló en la tabla anterior.

En cuanto al comportamiento general de la ejecución presupuestal del proyecto 7638, a corte del 30 de junio de 2025, se había comprometido el 55% del presupuesto vigente, distribuido por componente de la siguiente manera:

A continuación, se presenta el detalle de los compromisos presupuestales por componente del proyecto 7638, con corte al 30 de junio de 2025:

- Componente 02 – Mejoramientos

Este componente presenta compromisos por un valor de \$9.507.807.752, equivalentes al 13% de la asignación. Los recursos se destinaron a la contratación de obras e interventorías con cargo a vigencias futuras 2025 en la localidad de Sumapaz. Asimismo, se realizaron adiciones a contratos de obra e interventoría, ejecución de obras para la legalización de servicios públicos, pago de sentencias judiciales y financiación parcial de la póliza de bienes inmuebles.

- Componente 03 – Dotaciones

La ejecución presupuestal alcanzó el 42%, con compromisos por \$45.155.830.059. Estos recursos se orientaron a la adquisición de dotaciones escolares, incluyendo mobiliario escolar y administrativo. También se implementaron acciones y estrategias para fortalecer los procesos de adquisición y control de bienes, así como la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar el personal necesario para la ejecución del componente.

- Componente 04 – Colegios Nuevos

Se comprometieron \$129.366.728.810, lo que representa el 70% de la asignación. Los recursos se destinaron a la contratación de obras e interventorías con vigencias futuras

2025, pago de pasivos exigibles, trámites ante curadurías y órdenes de prestación de servicios.


- Componente 05 – Colegios Restituidos

Este componente presenta compromisos por \$46.540.422.532, correspondientes al 89% de la asignación. Los recursos se dirigieron a la contratación de obras e interventorías con cargo a vigencias futuras 2025.

A continuación, se relaciona el detallado de recursos vigencia 2025 por componente colegios nuevos y restituciones referente a los valores programados, comprometidos y girados a corte 30 de junio 2025.

LocNombre	UPL	Colegio	Tipo_Proye	2025		
				Recursos programados	Recursos comprometidos	Recursos girados
KENNEDY	18_KENNEDY	Maria Betzabe Espinel - Boita	Colegio Nuevo			
CIUDAD BOLIVAR	3_ARBORIZADO RA	San Francisco Sede B	Restitución			
KENNEDY	13_TINTAL	Luz Gabriela Arango - La Paz *	Colegio Nuevo			
BOSA	16_EDEN	Hena Rodríguez Parra-Indusel	Colegio Nuevo			
USAQUEN	26_TOBERIN	General Santander	Restitución	\$ 12,687,041,577	\$ 12,687,041,577	
BOSA	16_EDEN	Villas del Progreso (compra)	Colegio Nuevo	\$ 29,240,392,635	\$ 29,240,392,635	\$ 29,240,392,635
BOSA	16_EDEN	Villas del Progreso (Cesión)	Colegio Nuevo	\$ 20,379,476,863	\$ 20,379,476,863	\$ 20,379,476,863
ENGATIVA	11_ENGATIVA	Antonio Villavicencio-3ªSede A	Restitución	\$ 4,704,253,764	\$ 4,704,253,764	\$ 4,704,253,764
SUBA	10_TIBABUYES	Maria Teresa Pulido-Ciudadela Cafam II	Colegio Nuevo	\$ 20,345,488,409	\$ 20,345,488,409	\$ 20,345,488,409
RAFAEL URIBE URIBE	20_RAFAEL URIBR	Alexander Fleming	Restitución	\$ 7,550,471,064	\$ 7,550,471,064	\$ 807,789,442
RAFAEL URIBE URIBE	22_RESTREPO	Liceo Femenino Mercedes Nariño (patrimonial)	Restitución			
BOSA	15_PORVENIR	Porvenir II	Colegio Nuevo	\$ 5,126,465,889	\$ 5,126,465,889	\$ 5,126,465,889
ENGATIVA	11_ENGATIVA	Antonio Villavicencio Cesión	Colegio Nuevo	\$ 23,775,552,807	\$ 23,775,552,807	\$ 23,775,552,807
ENGATIVA	11_ENGATIVA	Ines Ochoa Perez-Cardenal Luque	Restitución	\$ 10,349,988,537	\$ 10,349,988,537	
SUBA	9_SUBA	María Anantilde Bulla Nivia-Theilard de Chardan	Colegio Nuevo	\$ 5,908,326,209	\$ 5,908,326,209	\$ 5,908,326,209
SUBA	10_TIBABUYES	Omaira Sanchez Garzon-Fontanar del Rio	Colegio nuevo - Primera Infancia	\$ 6,170,037,302	\$ 6,170,037,302	\$ 6,170,037,302
ENGATIVA	11_ENGATIVA	Ana Galvis Hotz-Plazuela de Alamos (Concreto Premezclado)	Colegio nuevo - Primera Infancia			
USME	5_USME ENTRE NUBES	La Parroquia	Restitución Primera Infancia			
CIUDAD BOLIVAR	3_ARBORIZADO RA	Flor Elvia Maldonado - Madelena	Colegio nuevo - Primera Infancia			
SAN CRISTOBAL	21_SAN CRISTOBAL	Barbara Forero-Las Brisas	Colegio nuevo - Primera Infancia			
SANTA FE	23_CENTRO HISTORICO	Juana Perea Plata (Altos de Egipto)	Colegio Nuevo			
BOSA	17_BOSA	Francisco de Paula Santander (patrimonial)	Restitución			
LOS MARTIRES	23_CENTRO HISTORICO	Agustinn Nieto Caballero (patrimonial)	Restitución			
CIUDAD BOLIVAR	4_LUCERO	Brisas del Diamante	Restitución	\$ 11,248,667,591	\$ 11,248,667,591	\$ 11,248,667,591
SANTA FE	23_CENTRO HISTORICO	San Diego Ocho Policarpa Salavarrieta IED	Restitución			
DISTRITAL	N/A	INVERSIÓN DISTRITAL	Restitución	\$ 5,661,646,467	\$ -	\$ -
		INVERSIÓN DISTRITAL	Colegio Nuevo	\$ 73,567,629,886	\$ 18,420,988,695	\$ 10,116,904,093
TOTALES				\$236,715,439,000	\$175,907,151,342	\$137,823,355,004

Ilustración 3: Ejecución Presupuestal por Componente

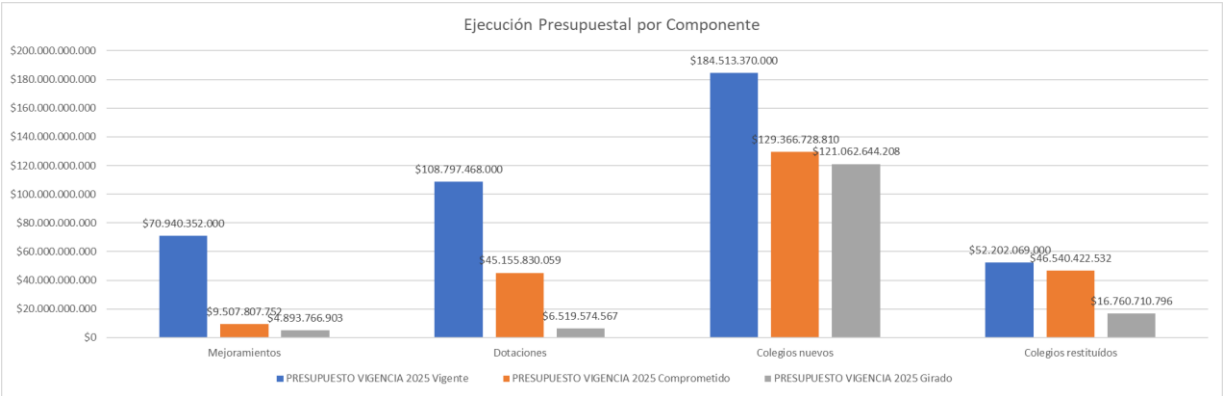

Fuente: SED – DCCEE - DDE

3.3. Ejecución de reservas presupuestales

En el marco del proyecto 7638 denominado fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C del PDD 2024-2027 Bogotá Camina Segura, Se han constituido reservas como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3: Ejecución Reservas Presupuestales

Componente	Reservas Constituidas a 01/01/2025	Giros al 30 de junio 2025	Anulación Definitiva (Saldos Liberados)	% Reservas Gestionadas	Saldo por Gestionar 30 de junio 2025
Mejoramientos	\$5.994.452.193	\$4.005.806.187		67%	1.988.646.006
Dotaciones	\$31.814.636.092	\$14.785.817.295	0	46%	17.028.818.797
Colegios nuevos	\$1.977.409.935	\$352.112.388		18%	1.625.297.547
Colegios restituidos					
Total	\$39.786.498.220	\$19.143.735.870	\$0	48%	\$20.642.762.350

Fuente: SED – DCCEE - DDE

Ilustración 4: Ejecución Reservas Presupuestales



Fuente: DCCEE - DDE

3.4. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, el Plan Anual de Adquisiciones del proyecto 7638 programó un total de 20 ítems, los cuales fueron ejecutados en su totalidad.

La ejecución por componente fue la siguiente:

- Componente 02 – Mejoramientos

Se programó 1 ítem, el cual fue ejecutado. Este correspondió a la contratación del proceso de elaboración e instalación de avisos en diferentes instituciones educativas.

- Componente 03 – Dotaciones

Se programaron 13 ítems, todos ejecutados, incluyendo tres prórrogas a contratos en curso. Las contrataciones permitieron:

- Dotar y mantener el mobiliario escolar para primera infancia y nivel administrativo.
- Adquirir e instalar parques infantiles en instituciones educativas.
- Proveer calculadoras graficadoras para fortalecer el programa de Bachillerato Internacional.
- Adquirir equipos, herramientas y recursos tecnológicos, comunicacionales y audiovisuales.
- Adicionar un contrato de mantenimiento correctivo de bienes muebles en las dependencias del nivel central de la SED.
- Contratar dos profesionales para apoyar las actividades del proyecto.
- Contratar una póliza de seguros “todo riesgo daño material” para proteger las dotaciones, garantizando la cobertura y permanencia de los estudiantes en todos los niveles educativos y sedes administrativas.

- Componente 04 – Colegios Nuevos

Se programaron y ejecutaron 6 ítems, destinados a:

- Adicionar contratos en ejecución para finalizar obras de infraestructura educativa.
- Contratar personal de apoyo profesional y técnico para asegurar la correcta ejecución del componente.

Tabla 4: Plan de Adquisiciones abril a junio 2025

COMPONENTE	OBJETO DE GASTO	N.º DE	N.º DE	VALOR EJECUTADO
		CONTRATOS PROGRAMADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	
COLEGIOS NUEVOS	Compra de lotes, diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa nuevas y existentes en modalidades de: colegio nuevo, restitución, terminación o ampliación y/o adicionales	1,00	1,00	\$ 3.094.462.579,00
	Suministrar el personal de apoyo profesional y técnico para garantizar la adecuada ejecución del proyecto	5,00	5,00	\$ 197.064.000,00
02 MEJORAMIENTOS	Adelantar diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento menor complementarias a la infraestructura de los colegios distritales y/o adicionales	1,00	1,00	\$ -
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar los inmuebles de propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito, bajo su responsabilidad, tenencia, control y/o custodia.	0,00	0	\$ -
03 DOTACIONES	Dotar mobiliario, equipos, maquinaria, herramientas e implementos de cómputo, tecnología, comunicaciones, audiovisuales, laboratorio, taller, recreación, deporte, cocina y comedor, recursos bibliotecas, arte, cultura, instrumentos y su mantenimiento.	9,00	8,00	\$ 30.834.338.585,00
	Implementar acciones o estrategias que permitan fortalecer las actividades de adquisición y control de los bienes dotacionales y su mantenimiento; desde la innovación y la aplicación de mejoras, que respalden el propósito pedagógico y el buen uso de los bienes públicos que adquiere la Dirección de Dotaciones Escolares.	2,00	2,00	\$0
	Garantizar el personal de apoyo profesional y técnico en la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; así como el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución del componente.	2,00	2,00	\$ 4.531.733.300,00
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar las dotaciones para atender la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación, y sus sedes administrativas.	0,00	1,00	\$ 1.449.000.000,00
	Total	20	20	\$40.106.598.464

Fuente: DCCEE - DDE

4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

4.1 Objetivo Específico 1.

Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.

4.1.1 Producto

Infraestructura educativa construida.

Tabla 5: Productos

Producto	Programado 2025	Ejecutado 2025	Avance del Producto
Sedes educativas construidas	9*	1	Entre abril y junio de 2025 se dio la terminación del proyecto Eloísa Garzón (La Paz) ubicado en las localidades de Kennedy, dicho proyecto beneficiara a 1060 niñas, niños y jóvenes.

* 5 Nuevos. 4 Restituidos (meta vigencia)

4.1.1.1 Metas proyecto asociadas al objetivo

4.1.1.1. Meta 1: Colegios nuevos

Actividades:

Durante el periodo correspondiente a este informe, se finalizó el proyecto Eloísa Garzón (La Paz), ubicado en la localidad de Kennedy. Esta obra beneficiará a 1.060 niñas, niños y jóvenes, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la infraestructura educativa en la ciudad.

Paralelamente, continúa la ejecución de seis nuevos colegios en distintas localidades. De estos, cinco se encuentran en fase activa de construcción, mientras que uno permanece suspendido. Además, se adelantan los estudios y diseños de siete proyectos adicionales, los cuales cuentan con financiación dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

En el marco del desarrollo de estos proyectos constructivos del componente de colegios nuevos, se siguen llevando a cabo actividades fundamentales como el diagnóstico de necesidades educativas, el análisis del entorno y la población, y la formulación del plan de infraestructura. También se avanza en la elaboración de anteproyectos y proyectos arquitectónicos, así como en los estudios técnicos estructurales, eléctricos y sanitarios. Todos los diseños se desarrollan bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y enfoque pedagógico.

Asimismo, se gestionan cuando se requieren las licencias de construcción ante las curadurías urbanas, junto con los permisos ambientales y sanitarios

requeridos. Se garantiza el cumplimiento de las normativas locales, como la NSR-10 y los lineamientos de accesibilidad. El proceso incluye la contratación de constructores y supervisores, así como la coordinación con gerencias externas. Finalmente, se realiza el control de calidad, la supervisión técnica y arquitectónica, la verificación técnica en la recepción de obra, y la dotación de mobiliario y equipos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura educativa.

4.1.1.2. Meta 2: Colegios restituidos

Actividades:

Actualmente, se están ejecutando (5) cinco proyectos de restitución en diversas localidades de la ciudad. Dos (2) de estos proyectos son gestionados por gerencias externas y tres directamente por la SED. Además, (6) seis proyectos están en la fase de consultoría para estudios y diseños.

En el marco del desarrollo de estos proyectos constructivos de restitución, se siguen llevando a cabo actividades fundamentales como el diagnóstico de necesidades educativas, el análisis del entorno y la población, y la formulación del plan de infraestructura. También se avanza en la elaboración de anteproyectos y proyectos arquitectónicos, así como en los estudios técnicos estructurales, eléctricos y sanitarios. Todos los diseños se desarrollan bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y enfoque pedagógico.

Asimismo, se garantiza el cumplimiento de las normativas locales, como la NSR-10 y los lineamientos de accesibilidad. El proceso incluye la contratación de constructores y supervisores, así como la coordinación con gerencias externas. Finalmente, se realiza el control de calidad, la supervisión técnica y arquitectónica, la verificación técnica en la recepción de obra, y la dotación de mobiliario y equipos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura educativa.

4.2 Objetivo Específico 2.

Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbanas y rurales.

4.2.1 Producto

Infraestructura educativa Mejorada

Tabla 6: Productos

Producto	Programado 2025	Ejecutado 2025	Avance del Producto
Sedes educativas mejoradas	98	0	A la fecha no se han dado entregas de mejoramientos que permitan dar soporte del cumplimiento de la meta, se avanza a la fecha en la estructuración de los procesos, de los

			cuales se espera que inicie su ejecución en el segundo semestre de la presente vigencia.
--	--	--	--

4.2.1.1 Metas proyecto asociadas al objetivo

4.1.1.3. Meta 1: Mejoramientos

Actividades:

Mediante el contrato de mejoramiento No. CO1.PCCNTR.5305650-2023, correspondiente al Grupo 7, se llevaron a cabo obras de mejoramiento, atención de emergencias y trabajos prioritarios en sedes educativas y administrativas. Este contrato, al igual que el No. CO1.PCCNTR.5305915-2023 del Grupo 9 —que contempló intervenciones similares—, finalizó recientemente.

Como resultado, durante el periodo actual no se han recibido ni programado nuevas emergencias ni obras prioritarias, dado que los contratos que cubrían dichas atenciones ya concluyeron. Es importante destacar que, en su fase final, uno de estos contratos se centró en atender observaciones relacionadas con intervenciones ejecutadas en meses anteriores.

Por otro lado, continúa en ejecución el contrato No. CO1.PCCNTR.7004833 de 2024, suscrito con el Consorcio ZF, el cual contempla intervenciones en la localidad de Sumapaz. Este proyecto incluye trabajos en tres sedes del Colegio Campestre Jaime Garzón y en dos sedes del Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, con un valor estimado de \$4.135.404.054. Recientemente, este contrato fue prorrogado, extendiendo su plazo de ejecución.

Adicionalmente, se encuentra publicado en el SECOP II el proceso de concurso de méritos SED-CM-A-DCCEE-018-2025, cuyo objetivo es seleccionar las interventorías encargadas del seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de los contratos de obra de mejoramiento correspondientes a la vigencia 2025.

En paralelo, se continúan desarrollando las acciones propias de los procesos de mejoramiento, que incluyen la inspección técnica del estado actual de las instituciones, la identificación de riesgos estructurales, sanitarios y eléctricos, y la priorización de necesidades como cubiertas, baños, aulas y accesibilidad. También se avanza en la definición del alcance de los proyectos, la elaboración de estudios técnicos y diseños, la estructuración de presupuestos y cronogramas, y la coordinación con entidades distritales como el IDIGER y la Secretaría de Planeación. Las intervenciones, tanto estructurales como no estructurales, se ejecutan bajo estrictos controles de calidad y supervisión técnica, garantizando la seguridad de estudiantes y personal. Finalmente, se evalúa el impacto de las mejoras implementadas, asegurando su efectividad y sostenibilidad.

4.3 Objetivo Específico 3.

Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y

cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

4.3.1 Producto

Dotaciones

Tabla 7: Productos

Producto	Programado 2025	Ejecutado 2025	Avance del Producto
Sedes dotadas	228	118	51.7%

4.3.1.1 Metas proyecto asociadas al objetivo

4.1.1.4. Meta 1: Dotaciones

Acciones:

Durante el primer semestre de 2025, la gestión del Componente de Dotaciones ha mostrado avances significativos en el fortalecimiento de las instituciones educativas distritales y las áreas administrativas de la SED, a través de la ejecución de recursos de vigencias anteriores y actuales. Se comprometieron recursos importantes para la adquisición de kits escolares mediante el contrato No. 7116104 suscrito al finalizar la vigencia 2024 respaldado con vigencias futuras, y se continuó con la entrega de dotaciones contratadas en 2024, respaldadas y justificadas en la reserva presupuestal por un valor definitivo de \$31.814 millones. A la fecha, se ha alcanzado una ejecución del 46% de dicha reserva, con entregas por más de \$14.785 millones, incluyendo servicios asociados.

En apoyo a la gestión operativa, se suscribieron 52 contratos de prestación de servicios (30 profesionales y 22 técnicos de apoyo), por un valor superior a \$2.382 millones, de los cuales se han girado más de \$1.192 millones. Estos contratos han sido clave para apoyar la gestión contractual en el marco del proyecto de inversión; fundamentalmente en actividades de estructuración, coordinación y seguimiento de los procesos de compra y entrega de dotaciones destinadas a los colegios y áreas administrativas de la Secretaría de Educación Distrital (SED), dichas actividades comprenden la ejecución de contratos relacionados con la adquisición de mobiliario, laboratorios, implementos deportivos, material didáctico, instrumentos musicales, parques infantiles, entre otros bienes. Así mismo, incluyen la administración de los bienes adquiridos, el seguimiento poscontractual, su aseguramiento, y la verificación jurídica y financiera de las actuaciones lideradas por la Dirección de Dotaciones

Durante este periodo también se celebraron tres contratos estratégicos por más de \$26.368 millones, orientados a la dotación de áreas administrativas, adquisición de mobiliario escolar y administrativo, y compra de etiquetas para inventario. A esto se suman 18 adiciones contractuales por más de \$7.130 millones, que permitieron atender nuevas necesidades priorizadas, incluyendo material pedagógico, equipos tecnológicos, instrumentos musicales, bibliografía, parques infantiles y servicios logísticos.

Se ejecutaron además cuatro procesos clave por un valor de \$4.255 millones, entre ellos el mantenimiento correctivo de bienes muebles, adquisición de

mobiliario para primera infancia, calculadoras graficadoras para el programa de Bachillerato Internacional y equipos tecnológicos para sedes educativas y administrativas. Actualmente, se encuentran en curso dos procesos contractuales por más de \$3.043 millones, destinados a dotaciones para ludotecas e instrumentos musicales especializados.

En paralelo, se avanza en la estructuración de seis nuevos procesos contractuales enfocados en fortalecer la dotación tecnológica, mejorar el control y mantenimiento de bienes, y cumplir con las metas del Plan Anual de Adquisiciones 2025. En materia de aseguramiento, se suscribió el contrato No. 7731280 con la Unión Temporal MAPFRE – La Previsora – AXA Colpatría, mediante el cual se comprometieron y giraron \$1.449 millones para la póliza Todo Riesgo Daño Material, garantizando la protección de los bienes patrimoniales y la continuidad del servicio educativo.

A pesar de estos avances, la gestión también ha enfrentado desafíos importantes, especialmente relacionados con condiciones climáticas adversas que han afectado la ejecución de obras y la logística de transporte de materiales y personal hacia algunas sedes educativas. Estas dificultades han requerido la activación de planes de contingencia por parte de los contratistas, así como ajustes contractuales y administrativos para mitigar los impactos y asegurar la continuidad de las acciones programadas.

5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

5.1. Meta Plan 2258. Mejoramientos

2258 - Intervenir, 310, Sede(s), educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje.

Indicador 4182 Número de sedes intervenidas con mejoramientos

Tabla 8: Metas plan de desarrollo

METAPLAN	ANUALIZACION	MAGNITUD META PLAN DE DESARROLLO EN LO CORRIDO DEL PLAN		MAGNITUD META VIGENCIA		
		PROGRAMADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	PROGRAMADA	CUMPLIDA	%
2258	Suma	310	0	98	0	0%

a. Avances y logros:

Gracias a la ejecución del contrato de mejoramiento No. CO1.PCCNTR.5305650-2023 (Grupo 7), se logró una intervención significativa en múltiples sedes educativas y administrativas, mediante la realización de obras de mejoramiento, atención oportuna de emergencias y ejecución de trabajos prioritarios. Este contrato culminó exitosamente, cumpliendo con los objetivos establecidos.

De igual manera, el contrato No. CO1.PCCNTR.5305915-2023 (Grupo 9) permitió avanzar de forma efectiva en la mejora de la infraestructura educativa y administrativa, con resultados concretos en la atención de situaciones críticas y la ejecución de obras

prioritarias. Ambos contratos representaron un avance importante en la mejora de las condiciones físicas de las instituciones intervenidas.

Como resultado de estas intervenciones, durante el mes en curso no se presentaron nuevas emergencias ni fue necesario programar obras prioritarias adicionales, lo cual evidencia la efectividad de las acciones ejecutadas. Cabe destacar que, en su fase final, uno de los contratos se enfocó en atender observaciones derivadas de intervenciones anteriores, consolidando así la calidad de los trabajos realizados.

Por otra parte, continúa en desarrollo el contrato No. CO1.PCCNTR.7004833 de 2024, suscrito con el Consorcio ZF, el cual representa un avance estratégico en la Localidad de Sumapaz. Este proyecto contempla intervenciones en tres sedes del Colegio Campestre Jaime Garzón y dos sedes del Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, con una inversión estimada de \$4.135.404.054. La prórroga recientemente otorgada a este contrato permitirá consolidar los avances alcanzados y garantizar la finalización exitosa de las obras.

Adicionalmente, se encuentra en curso el proceso de concurso de méritos SED-CM-A-DCCEE-018-2025, publicado en el SECOP II, con el objetivo de seleccionar las interventorías que realizarán el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a los contratos de mejoramiento previstos para la presente vigencia. Este proceso fortalecerá la supervisión y asegurará la calidad en la ejecución de los futuros proyectos.

b. Retrasos y dificultades

En el marco del contrato CO1.PCCNTR.7004833 de 2024, suscrito con el Consorcio ZF, se han presentado dificultades que han impactado el ritmo de ejecución de las obras. Durante el último mes, las condiciones climáticas adversas, especialmente las lluvias intensas, han generado afectaciones tanto en el desarrollo de las actividades constructivas como en la movilidad hacia las sedes educativas intervenidas. Estas condiciones han dificultado el transporte de materiales y personal, debido al deterioro de las vías de acceso.

Ante esta situación, se solicitó formalmente al contratista la presentación de planes de contingencia que permitan mitigar los efectos de estas contingencias climáticas y garantizar la continuidad de las obras en condiciones seguras y eficientes.

Adicionalmente, el contrato fue prorrogado por un periodo de tres meses, decisión que permitió cerrar el Proceso Sancionatorio Administrativo que se encontraba en curso. Es importante destacar que los costos asociados a la mayor permanencia de la interventoría durante este periodo adicional serán asumidos por el contratista de obra, sin generar sobrecostos para la entidad contratante.

5.2. Meta Plan 2257. Colegios Nuevos

2257 - Entregar, 16, Colegio(s), nuevos y dotados para ampliar la oferta educativa.

Indicador 4181 Número de colegios nuevos entregados

Tabla 9: Metas plan de desarrollo

METAPLAN	ANUALIZACION	MAGNITUD META PLAN DE DESARROLLO EN LO CORRIDO DEL PLAN		MAGNITUD META VIGENCIA		
		PROGRAMADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	PROGRAMADA	CUMPLIDA	%
2257	Suma	16	2**	8*	1	0

*Corresponde a la meta vigencia 2025 (5) más la meta de reserva 2024 (3).

** Correspondiente a la entregada en la vigencia 2024.

c. Avances y logros:

Durante el periodo correspondiente a este informe, se logró la finalización exitosa del proyecto educativo Eloísa Garzón (La Paz), ubicado en la localidad de Kennedy. Esta importante obra beneficiará a 1.060 niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo el acceso a una educación de calidad en la ciudad.

Adicionalmente, se avanza en la construcción de seis (6) nuevos colegios distribuidos en distintas localidades. De estos, cinco (5) se encuentran actualmente en ejecución y uno (1) permanece suspendido. Paralelamente, se desarrollan los estudios y diseños de siete (7) nuevos proyectos educativos, todos ellos con financiación asegurada dentro del marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, lo que evidencia el compromiso continuo con el fortalecimiento de la infraestructura educativa en la ciudad.

d. Retrasos y dificultades

Con corte al 30 de junio de 2025, se evidencia un retraso en el componente de colegios nuevos, particularmente en el proyecto Hena Rodríguez Parra (Indusel). Este proyecto permanece suspendido desde noviembre de 2024, debido a la falta de aprobación de los permisos requeridos por parte de la Secretaría de Movilidad y Transmilenio, necesarios para ejecutar las obras relacionadas con las conexiones de servicios públicos.

La suspensión prolongada ha limitado el avance físico del proyecto y ha generado irresolución en la programación general del componente. Esta situación refleja la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y agilizar los trámites administrativos que inciden directamente en la ejecución de obras estratégicas para el sector educativo.

5.3. Meta Plan 2256. Colegios Restituidos

2256 - Entregar, 12, Colegio(s), restituidos y dotados para mejorar la calidad de la oferta educativa.

Indicador 4180 Número de colegios restituidos entregados

Tabla 10: Metas plan de desarrollo

METAPLAN	ANUALIZACION	MAGNITUD META PLAN DE DESARROLLO EN LO CORRIDO DEL PLAN		MAGNITUD META VIGENCIA		
		PROGRAMADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	PROGRAMADA	CUMPLIDA	%
2256	Suma	12	1	4	0	0

e. Avances y logros:

Proyectos de Restitución: Actualmente, se están ejecutando (5) cinco proyectos de restitución en diversas localidades de la ciudad. Dos (2) de estos proyectos son gestionados por gerencias externas y tres directamente por la SED. Además, (7) siete proyectos están en la fase de consultoría para estudios y diseños.

f. Retrasos y dificultades

Para el periodo del presente informe, se evidencia un retraso en la ejecución del proyecto correspondiente a la sede Cardenal Luque, ubicada en la localidad de Engativá. Esta situación ha generado inquietud debido al bajo avance físico y financiero reportado, lo cual afecta el cumplimiento del cronograma establecido. En atención a esta situación, la Oficina de Contratos de la SED ha iniciado un proceso de presunto incumplimiento contra el contratista, con el fin de evaluar las responsabilidades y tomar las medidas contractuales correspondientes.

6. CONCLUSIONES

Durante el periodo reportado, el proyecto de inversión 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.” presentó avances significativos en sus componentes estratégicos, consolidando su impacto en el fortalecimiento del sistema educativo distrital.

Entre los hitos más relevantes se encuentra la finalización del proyecto Eloísa Garzón (La Paz) en la localidad de Kennedy, que beneficiará a 1.060 estudiantes, así como la continuidad en la ejecución de seis nuevos colegios, cinco de ellos en obra y uno suspendido. De manera paralela, se avanzó en los estudios y diseños de siete proyectos priorizados en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

En el componente de colegios nuevos, se mantuvo el desarrollo de actividades clave como el diagnóstico de necesidades educativas, el análisis del entorno y la población, la formulación del plan de infraestructura, y la elaboración de anteproyectos y diseños técnicos bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y enfoque pedagógico. Estas acciones se complementaron con la gestión de licencias y permisos, la contratación de constructores y supervisores, y la implementación de controles de calidad y dotación de mobiliario, garantizando así la funcionalidad y pertinencia de las nuevas infraestructuras.

En cuanto al mejoramiento de infraestructura, se concluyeron los contratos correspondientes a los Grupos 7 y 9, que permitieron atender emergencias y ejecutar obras prioritarias en sedes educativas y administrativas. A su vez, continúa la ejecución del contrato en la localidad de Sumapaz, con intervenciones en cinco sedes educativas y una inversión superior a los \$4.135 millones.

Respecto al componente de dotaciones, se alcanzó una ejecución del 46% de la reserva presupuestal definitiva de \$31.814 millones, con entregas por más de \$14.785 millones. Se suscribieron 52 contratos de prestación de servicios esenciales para la operación del proyecto, y se celebraron contratos estratégicos por más de \$26.368 millones, junto con 18 adiciones contractuales que respondieron a nuevas necesidades priorizadas. Además, se ejecutaron procesos clave por \$4.255 millones y se encuentran en curso otros por más de \$3.043 millones, mientras se estructuran seis nuevos procesos orientados al fortalecimiento tecnológico y logístico. En materia de aseguramiento, se garantizó la protección de los bienes patrimoniales mediante la contratación de una póliza Todo Riesgo Daño Material por \$1.449 millones.

Si bien la ejecución enfrentó desafíos derivados de condiciones climáticas adversas que afectaron la logística y el desarrollo de obras, se activaron planes de contingencia y se realizaron ajustes contractuales para mitigar su impacto.


El proyecto ha mantenido un ritmo de ejecución sólido, con resultados tangibles en infraestructura, dotación y gestión operativa, contribuyendo de manera efectiva al mejoramiento de las condiciones educativas en Bogotá D.C., a pesar de los retos enfrentados.



ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO

Director

Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos



ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO

Director (E.)

Dirección de Dotaciones Escolares

Elaborado por:

Luis Alberto Cantor – Contratista DDE 
María Ayde Jiménez Porras – Contratista DCCEE 
Miller Antonio Cifuentes Largo – Contratista CCEE 
