

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 Enero a 31 Marzo de 2022

PROYECTO 7638 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES
DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Elaborado por:
LUIS ALBERTO CANTOR
MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS
MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
SANDRA PATRICIA GALEANO MENDIVELLO

Marzo 2022

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.1. <i>Objetivo General.....</i>	4
1.2. <i>Objetivos Específicos</i>	4
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	4
3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	5
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)	5
5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5
5.1. <i>Ejecución Presupuestal Acumulada.....</i>	7
5.2. <i>Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto.....</i>	7
5.3. <i>Ejecución Reservas Presupuestales</i>	9
6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	9
6.1. <i>Objetivo Específico 1.</i>	9
6.1.1. <i>Producto 1</i>	9
6.1.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	10
6.2. <i>Objetivo Específico 2.</i>	16
6.2.1. <i>Producto 2.</i>	16
6.2.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	17
6.3. <i>Objetivo Específico 3</i>	22
6.3.1 <i>Producto 3.</i>	22
6.3.2 <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	23
6.4. <i>Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto</i>	27
7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.....	29
7.1. <i>Meta Plan 91.</i>	29
7.2. <i>Meta Plan 90:</i>	31
7. CONCLUSIONES	33

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2022	5
Tabla 2. Modificaciones presupuestales primer trimestre	6
Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales.....	9
Tabla 4. Producto Objetivo 1	10
Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación	11
Tabla 6 Estado obras complementarias FFIE	12
Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED	12
Tabla 8. Proyectos cofinanciados.....	13
Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas	14
Tabla 10 Proyectos en proceso de contratación y trámite de licencia	14
Tabla 11. Productos 2	16
Tabla 12. Intervenciones Consolidadas 2022.....	17
Tabla 13.Discriminación de mejoramientos y emergencias recibidos 2022	18
Tabla 14. Colegios en señalización y señalética 2021	20
Tabla 15. Productos	23
Tabla 16. Plan de Adquisiciones Primer Trimestre 2022.....	28
Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2022	7
Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente	8



1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.

1.2. Objetivos Específicos

- Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.
- Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.
- Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Con este proyecto se fortalecerá y dotará la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general, cuenten con espacios educativos dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y el acceso a la educación. El proyecto de desarrolla a través de tres (3) objetivos específicos asociados a:

1. **Construcción y terminación:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de construcción, restitución, y ampliación, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje.
2. **Mejoramiento (conservación):** mediante las acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura se priorizará y desarrollaran intervenciones de mejoramiento de acuerdo a la necesidad, riesgo y población beneficiada, así como el mejoramiento de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se puedan presentar. Todo esto bajo el principio de optimización de los recursos destinados para estas actividades. Así mismo, se

garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar los bienes inmuebles de la SED.

3. **Dotación:** desde este componente se atenderán las necesidades de colegios y áreas administrativas, de igual forma, se adelantarán acciones orientadas a garantizar las dotación y renovación de los elementos requeridos y necesarios para atender el aumento de cobertura en los distintos niveles de educación, así como la compra y entrega de dispositivos tecnológicos y de conectividad, de los cuales se beneficiarán los estudiantes más vulnerables de la ciudad, aportando así a la disminución de la brecha digital de la comunidad educativa de la ciudad. De otra parte, se garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar las dotaciones adquiridas por la SED.

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Adjuntar la información enviada en el correo de seguimiento.

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

Adjuntar la información enviada en el correo de seguimiento.

5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

El Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá, inició su ejecución presupuestal el 1 de enero de 2022 con una asignación de \$ 549.624.219.000, distribuidos de la siguiente manera: 01 CONSTRUCCION Y TERMINACIÓN \$ 311.397.787.000, 02 MEJORAMIENTOS \$176.937.552.000 y para el componente de 03 DOTACIONES \$61.288.880.000, como se observa a continuación:

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2022

Componente	Presupuesto Inicial 2022	Presupuesto * Traslados/Reducciones	Total Presupuesto Vigente a Marzo de 2022
01 Construcción	\$ 311.397.787.000	\$ 0	\$ 311.397.787.000
02 Mejoramiento	\$176.937.552.000	\$ 0	\$176.937.552.000
03 Dotación	\$61.288.880.000	\$ 0	\$61.288.880.000
Total	\$ 549.624.219.000	\$ 0	\$ 549.624.219.000

Frente a modificaciones presupuestales, el componente de 03 Dotaciones, en el mes marzo realizó un traslado interno entre objetos de gasto de este componente, creando el objeto de gasto 03003 “Dotar de dispositivos de acceso para la conectividad de los estudiantes de los colegios del distrito, y así contribuir al cierre de brechas digitales.”, al cual se le asignaron recursos por valor de \$ 21,100,224,000 para iniciar el proceso de contratación de los nuevos dispositivos de acceso con

destino a los estudiantes vulnerables de los colegios oficiales de Bogotá y de esta manera poder contribuir al cierre de brechas digitales.

Tabla 2. Modificaciones presupuestales primer trimestre

Componente	Presupuesto a 31/03/2022	Modificaciones Crédito	Modificaciones Contra crédito	Presupuesto a 31/03/2022
01 construcción	\$ 311.397.787.000	-	-	\$ 311.397.787.000
02 Mejoramiento	\$176.937.552.000	-	-	\$176.937.552.000
03 Dotación	\$61.288.880.000	\$21.100.224.000	\$21.100.224.000	\$61.288.880.000
Total	\$ 549.624.219.000	\$21.100.224.000	\$21.100.224.000	\$ 549.624.219.000

En cuanto al comportamiento de la ejecución presupuestal del proyecto 7638, a corte de marzo 31, se comprometió el 3,3% del presupuesto vigente, desagregado por componente así:

01 construcción y terminación: el componente de construcciones comprometió \$ 10.434.494.185 pesos m/cte., correspondientes al 3,4% de la asignación, direccionados la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión y adiciones a contratos de interventoría y diferentes trámites de curaduría

02 Mejoramientos: para este componente se comprometieron recursos por \$ 9.216.9331 pesos m/cte., correspondientes al 0.01% de la asignación, los cuales se direccionaron al pago de sanciones a la Secretaria de Salud.

03 Dotación: de los \$61.288.880.000 asignados a este componente, es preciso indicar que la ejecución presupuestal a 31 de marzo alcanzo el 12.2%, comprometiendo recursos por valor de \$7.504.494.744.

Durante el primer trimestre se realizó la contratación de 30 prestaciones de servicios profesionales y 23 prestaciones de servicios de apoyo a la gestión por un valor de \$3.070 millones, lo que, le permite a la Dirección de Dotaciones avanzar con las actividades principalmente en la estructuración, coordinación y seguimiento de procesos contractuales de compra y entrega de dotación con destino a colegios de la SED y áreas administrativas del nivel central y local, además de las actividades inherentes, necesarias para la ejecución de los recursos asignados.

Al finalizar el trimestre se suscribieron 8 compromisos por \$4.435 millones, y se adelantan 8 procesos precontractuales adicionales, para la adquisición de las dotaciones prioritarias de implementos deportivos, material bibliográfico, instrumentos musicales, dispositivos tecnológicos, materiales didácticos entre otros, los cuales de estima sean adjudicados durante segundo trimestre de la presente vigencia, con el fin de cumplir lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones, a fin de dar respuesta oportuna a lo plasmado en el proyecto de inversión.

5.1. Ejecución Presupuestal Acumulada

Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2022




5.2. Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto

Frente a la ejecución presupuestal del proyecto, este se desarrolla a través de 3 componentes: 01 Construcción y terminación, 02 Mejoramientos y 03 Dotaciones. En la actual vigencia, los componentes 01 Construcción y terminación y 03 Dotaciones, presentan una ejecución al 31 de marzo de 2022 del 3,4%, 0,01% y 12,20%, respectivamente.

Así mismo, se realizaron giros del 0,2%, correspondiente a \$ 1.215.316.744, de los recursos comprometidos, direccionados al pago de prestaciones de servicio, sentencias de la Secretaria de Salud y tramites de curaduría como se muestra a continuación:

Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente

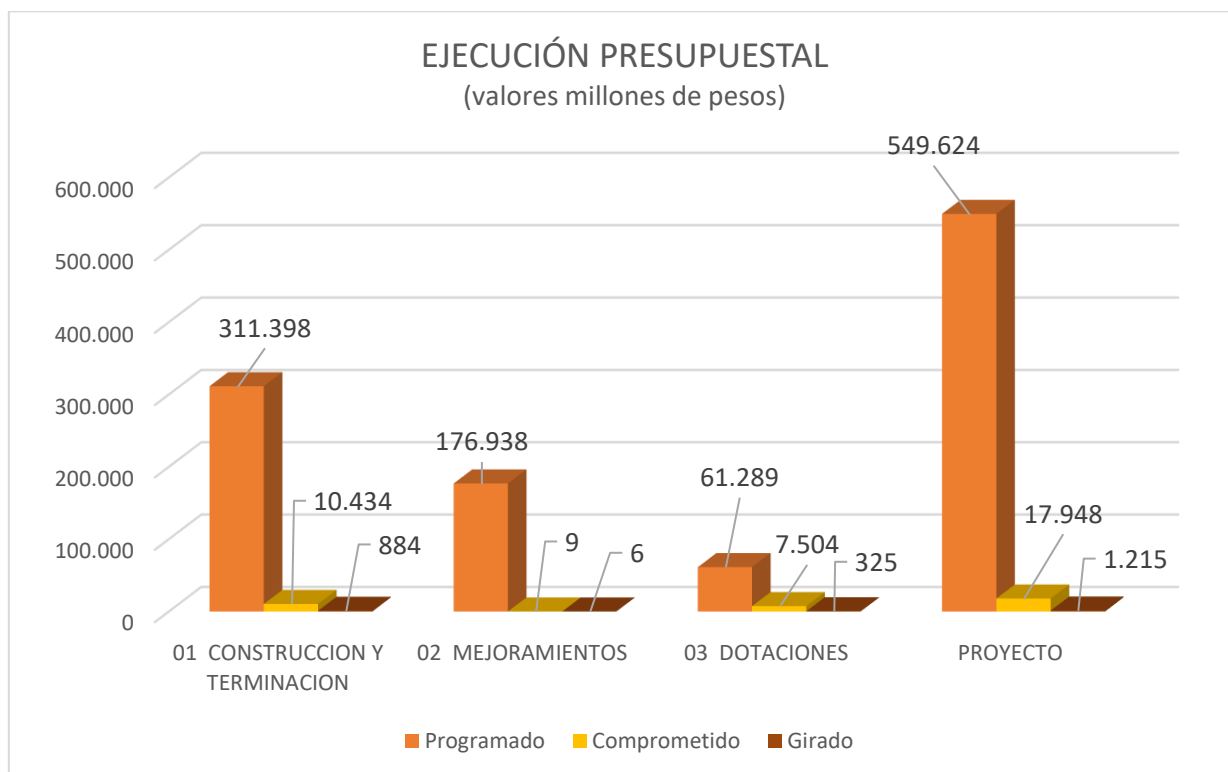

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por componente:

01 construcción y terminación: el componente de construcciones comprometió \$ 10.434.494.185 pesos m/cte., correspondientes al 3,4% de la asignación, orientados a la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión por \$ 9.681.702.500, adiciones a contratos de interventoría de los proyectos de obra Niño Jesús, Santa Teresita y plan de regularización del colegio INEM de Kennedy por \$ 417.369.295, \$ 3.017.393, y para, pago de diferentes trámites de curaduría y pasivo exigible por \$332.404.997.

02 Mejoramientos: para este componente se ejecutaron recursos por \$ 9.216.931 pesos m/cte., correspondientes al 0.01% de la asignación, los cuales se direccionaron al pago de sanciones impuestas por la Secretaria de Salud.

03 Dotación: de los \$61.288.880.000 asignados a este componente, es preciso indicar que la ejecución presupuestal a 31 de marzo alcanzo el 12.2%, comprometiendo recursos por valor de \$7.504.494.744. Durante el primer trimestre se realizó la contratación de 30 prestaciones de servicios profesionales y 23 prestaciones de servicios de apoyo a la gestión por un valor de \$3.070 millones, lo que, le permite a la Dirección de Dotaciones avanzar con las actividades principalmente en la estructuración, coordinación y seguimiento de procesos contractuales de compra y entrega de

dotación con destino a colegios de la SED y áreas administrativas del nivel central y local, además de las actividades inherentes, necesarias para la ejecución de los recursos asignados. De otra parte, al finalizar el trimestre se suscribieron 8 compromisos por \$4.435 millones para la adquisición de computadores, elementos de bioseguridad y una impresora industrial.

En síntesis, el proyecto, al corte del primer trimestre presenta una ejecución consolidada del 3,3 % correspondiente a \$17.948.205.860 millones de pesos m/cte.

5.3. Ejecución Reservas Presupuestales

El proyecto constituyó reservas para la vigencia 2022 por \$347.884.786.643 pesos m/cte., de las cuales en el primer trimestre del año se gestionó el 10,2% de la reserva constituida, incluidos los saldos liberados, como se muestra a continuación:

Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales

Componente	Reservas Constituidas a 01/01/2022	Giros	Anulación Definitiva	% Reservas Gestionadas	Saldo por Gestionar 31/03/2022
			(Saldos Liberados)		
01 Construcción	135.893.825.162	17.847.854.059	129.732.950	13,2%	117.916.238.153
02 Mejoramiento	105.872.850.442	14.985.582.017	0	14,2%	90.887.268.425
03 Dotaciones	106.118.111.039	2.471.499.939	9.685.655	2,3%	103.636.925.445
Total	347.884.786.643	35.304.936.015	139.418.605	10,2%	312.440.432.023

6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

6.1. Objetivo Específico 1.

Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.

6.1.1. Producto 1

Infraestructura educativa construida: Para la vigencia 2022, se programó la construcción de siete (7) instituciones educativas, y la entrega de cuatro (4) colegios más que correspondían a la proyección

de la meta 2021. Estos colegios se encuentran ubicados en las localidades de Antonio Nariño, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal y Engativá.

Tabla 4. Producto Objetivo 1

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa construida	7	0	Para la vigencia 2022, se planeó la construcción de 7 colegios. Adicionalmente se deben entregar 4 colegios, que hacían parte de la meta 2021 y que fueron reprogramada su entrega para esta vigencia. A corte de marzo 31, se han inaugurado nueve (9) colegios, dos (2) colegios se encuentran terminados en proceso de inauguración, la entidad se encuentra ejecutando dieciséis (16) proyectos de obra, de los cuales en tres (3) se adelantan obras complementarias y conexiones de servicios públicos, dos (2) proyectos se encuentran próximos a iniciar obra, cinco (5) proyectos cuyas licencias de construcción se obtuvieron en la presente vigencia se encuentran en proceso de contratación, y un (1) proyecto en trámite de licencia.

6.1.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.1.2.1. **Meta 1:** Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, en lotes nuevos, intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

A 31 de marzo de 2022, se avanza con la ejecución del 45,71 % (16) de los proyectos, el 5,71 % (2) proyectos están por iniciar obra, el 14,28 % (5) de los proyectos se encuentran en estructuración del proceso contractual, y (1) proyecto que corresponde al 2,85% se encuentra en trámite de licencia. Finalmente, a la fecha se han terminado el 31,42% (11) de los 35 colegios proyectados en la meta.

Es así que, la Secretaría venía ejecutando 19 proyectos de obra, de los cuales 15 de ellos se encontraban en ejecución desde la administración anterior y se prevé terminarlos en la presente administración; los cuales se relacionan a continuación y corresponden a intervenciones en modalidad de obra nueva, restitución y/o ampliación:

Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance Enero 2020	% Avance Marzo de 2022	Recursos restantes para finalizar su construcción	Fecha estimada de entrega de la obra
1	Kennedy	Carlos Arango Vélez	Restitución	89,00%	100%	N / A	sep-20
2	Bosa	Colegio de la Bici	Colegio Nuevo	61,00%	100%	N / A	oct-20
3	Engativá	Tabora	Restitución	84,00%	100%	N / A	oct-20
4	La Candelaria	La Candelaria (sede La Concordia)	Terminación	40,00%	100%	N / A	dic-20
5	Bosa	Campo Verde I – Laurel de Cera	Colegio Nuevo	60,00%	100%	N / A	ene-21
6	Bosa	Campo Verde II – Parques de Bogotá	Colegio Nuevo	61,00%	100%	N / A	ene-21
7	Ciudad Bolívar	Sierra Morena - Parque	Colegio Nuevo	63,66%	100%	N / A	abr-21
8	Kennedy	Ciudad de Techo I	Colegio Nuevo	29,00%	100%	N / A	may-21
9	Fontibón	Integrado de Fontibón (Sede Emma Villegas de Gaitán)	Ampliación	0,60%	100%	N / A	dic-21
10	Tunjuelito	Rafael Uribe Uribe	Restitución	25,00%	100%	N / A	dic-21
11	San Cristóbal	República Del Ecuador	Restitución	28,00%	100% ***	N / A	dic-21
12	Engativá	Laureano Gómez	Restitución	48,00%	100%	N / A	dic-21
13	Ciudad Bolívar	Sierra Morena - La Curva	Colegio Nuevo	15,50%	100%	N / A	may-22
14	Antonio Nariño	Guillermo León Valencia	Ampliación	63,00%	89.82%**	N / A	oct-22
15	Usme	Cuidad Chengdú – predio Bolonia	Colegio Nuevo	75%	79.77%	N/A	Mayo 2021- Fase I Proceso sancionatorio Fase II – Proceso adjudicado en Diciembre de 2021 – próximo a iniciar obra

** El día 18 de febrero de 2022 se realizó la audiencia de fallo del proceso sancionatorio, sin embargo, con el avance del proyecto se realizó desde el mes de diciembre 2021, entrega de los espacios de aulas a la comunidad educativa, en espera de cierre del proceso sancionatorio.

*** Para el colegio de República del Ecuador la SED realizará una intervención correspondiente a obras exteriores y de urbanismo con fecha estimada de entrega tercer trimestre de 2022

En la vigencia de 2020, se logró la terminación de la construcción de cuatro (4) proyectos: 1. "La Bici" ubicado en la localidad de Bosa, 2. "Carlos Arango Vélez", ubicado en la localidad de Kennedy, 3. Tabora ubicado en la localidad de Engativá y 4. el Colegio denominado la Candelaria ubicado en la localidad Candelaria. Los proyectos se encuentran en trámite de conexiones definitivas de servicios públicos, una vez se culmine esta actividad será suscrita el Acta de entrega a cada rector.

Durante el año 2021, la Dirección de construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, terminó la construcción de siete (7) proyectos denominados: 1. "Parques de Bogotá – Campo Verde II" y 2. "Laurel de Cera – Campo Verde I" ubicados en la localidad de Bosa, 3. "Laureano Gómez", ubicado en la localidad de Engativá, el 4. Colegio denominado "El Nogal – Predio Sierra Morena Parque" ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, 5. el colegio "Ciudad de Techo I" ubicado en la localidad de Kennedy, 6. Integrado de Fontibón - Emma Villegas De Gaitán ubicado en la localidad de Fontibón, 7. Rafael Uribe Uribe en la localidad de Tunjuelito; no obstante, algunos de estos proyectos se encuentran en trámite de conexiones definitivas de servicios públicos y con terminación de obras complementarias como se muestra a continuación:

Tabla 6 Estado obras complementarias FFIE

Colegio	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Plazo	% avance	Valor
				Diciembre	
1. "Parques de Bogotá – Campo Verde II"	20-sep	6-dic	2,5 meses	100%	\$ 434.669.205,51
2. "Laurel de Cera – Campo Verde I" ubicados en la localidad de Bosa,	20-sep	6-dic	2,5 meses	100%	\$ 404.389.190,19
3. Rafael Uribe Uribe	16-sep	31-dic	3 meses y 15 días	100%	\$876.367.778
4. República del Ecuador	16-sep	8- enero 2022	3 meses y 15 días	94,94%	\$490.423.513
5. "Laureano Gómez", ubicado en la localidad de Engativá - Obras Civiles y eléctricas	20-sep	4- dic	2 meses y 13 días	100%	\$ 745.626.856
	19-oct	31-dic	2 meses	100%	

La actual administración se encuentra ejecutando ocho (8) proyectos de obra y adicionalmente se está próximo a iniciar la obra de construcción y terminación del Proyecto Ciudad Chengdu (Predio Bolonia). A continuación, se relacionan los proyectos citados:

Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance Enero 2020	% Avance Marzo 2022	Recursos restantes para finalizar su construcción	Fecha estimada de entrega de la obra
(16) 1	Bosa	Encenillos (Predio Niño Jesús)	Colegio Nuevo	0,00%	80.54%	N / A	Agosto 2022
(17) 2	San Cristóbal	Santa Teresita	Colegio Nuevo	0,00%	97.07%	N / A	Julio 2022
(18) 3	Bosa	La Palestina	Colegio Nuevo	0,00%	91.37%	N / A	Septiembre 2022
(19) 4	Suba	Lombardía **	Colegio Nuevo	0,00%	43.57%	N / A	Marzo 2022 Fase Inicial

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance Enero 2020	% Avance Marzo 2022	Recursos restantes para finalizar su construcción	Fecha estimada de entrega de la obra
(20) 5	Ciudad Bolívar	Arborizadora Alta	Restitución	0,00%	5.83%	N / A	Diciembre 2022
(21) 6	Fontibón	Villemar El Carmen	Restitución	0,00%	33.87%	N / A	Diciembre 2022
(22) 7	Kennedy	Hipotecho	Colegio Nuevo	N/A	0.06%	N / A	Tercer trimestre 2023
(23) 8	Ciudad Bolívar	San Francisco Sede B	Restitución	N/A	0.00%	N / A	Tercer trimestre 2023
N/A	Usme	Ciudad Chengdu (Predio Bolonia) *	Colegio Nuevo	N/A	0.00%	N / A	Primer trimestre 2023 Fase terminación

*El Proyecto Ciudad Chengdu (Predio Bolonia) iniciará su ejecución en el mes de abril 2022 y corresponde a la fase de terminación.

** Se adelanta proceso sancionatorio de aplicación de clausula penal pecuniario al contrato de obra del proyecto Lombardía el cual contractualmente terminó el 5 de febrero de 2022 con un avance físico del 43.57%.

Las fechas estimadas de entrega de los proyectos que se encuentran en etapa de obra han tenido variaciones, producto de imprevistos técnicos y oportuno acceso a materiales, lo cual ha obligado a modificar el cronograma de ejecución de algunos proyectos de obra.

Adicionalmente, a través del convenio interadministrativo con el FFIE se construyen cuatro (4) nuevos colegios con cofinanciación de la nación por la suma de \$53.912.000.000, para los cuales la SED apropió recursos por valor de \$72.863.405.263,18, para un valor total ejecutado mediante dicho convenio de \$ 126.775.405.264. Ahora bien, de los proyectos enmarcados en este convenio, tres (3) están en ejecución y uno (1) más inicio obra el 25 de marzo de 2022. Como se muestra seguidamente:

Tabla 8. Proyectos cofinanciados

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance Enero 2020	% Avance Marzo 2022	Fecha estimada de entrega de la obra
(24) 1	Bosa	Plaza Logística	Colegio Nuevo	0,00%	87.72%	cuarto trimestre 2022
(25) 2	Ciudad Bolívar	Bonavista	Colegio Nuevo	0,00%	0,00%*	Tercer trimestre 2023
(26) 3	Engativá	Los Cerezos	Colegio Nuevo	0,00%	81.35%	cuarto trimestre 2022
(27) 4	Engativá	Porvenir	Colegio Nuevo	0,00%	42.43%	cuarto trimestre 2022

*El proyecto Bonavista Inicio obra Marzo 25 de 2022

De otra parte, en la vigencia 2021, se suscribieron dos (2) contratos interadministrativos con la ERU y ENTERRITORIO los cuales tienen por objeto "REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO", para la ejecución de los proyectos Hacienda Casablanca y Boíta por parte de ENTerritorio y San Francisco de Asís y La Magdalena, que serán desarrollados por la ERU.

Los proyectos que gerencia la entidad ENTerritorio, iniciaron su ejecución en el mes de marzo así: Hacienda Casablanca - 17 de marzo de 2022 y Boíta - 25 de marzo de 2022. En cuanto a los proyectos gerenciados por la ERU, el proyecto la Magdalena fue adjudicado el día 30 de marzo de 2022 y se estima que la obra inicie su ejecución en la segunda quincena del mes de abril, frente al proyecto San

Francisco de Asís, se adelanta el proceso de contratación que se proyecta ser adjudicado el 26 de abril de 2022

Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Gerencia	Fecha de Adjudicación	Fecha de inicio	% Avance Enero 2020	% Avance Marzo 2022	Fecha estimada de entrega de la obra
(28) 1	Ciudad Bolívar	Hacienda Casablanca	Colegio Nuevo	ENTerritorio	22/02/2022	17/03/2022	0,00%	0,00%	cuarto trimestre 2023
(29) 2	Kennedy	Boíta	Colegio Nuevo	ENTerritorio	22/02/2022	25/03/2022	0,00%	0,00%	cuarto trimestre 2023
(30) 3	Mártires	San Francisco de Asís	Colegio Nuevo	ERU	30/03/2022	Pendiente	0,00%	0,00%	cuarto trimestre 2023
(31) 4	Kennedy	La Magdalena	Colegio Nuevo	ERU	26/04/2022	Pendiente	0,00%	0,00%	cuarto trimestre 2023

De otra parte, de los 4 colegios restantes (32 al 35) de los 35 dispuestos en el proyecto de inversión, la SED adelanta el proceso de contratación de tres (3) proyectos de obra y el restante, que corresponde al Colegio Policarpa Salavarrieta – San Diego, este se encuentra en trámite de licencia de construcción.

Tabla 10 Proyectos en proceso de contratación y trámite de licencia

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Estado
(32) 1	Kennedy	El Ferrol - La Paz	Colegio Nuevo	En contratación
(33) 2	Bosa	Indusel	Colegio Nuevo	En contratación
(34) 3	Fontibón	Procables	Colegio Nuevo	En contratación
(35) 4	Santafé	Policarpa Salavarrieta	Restitución	En trámite de licencia

Así mismo, se encuentra en estructuración contractual, la terminación del proyecto Lombardía de la localidad de Suba, el cual, como se mencionó anteriormente se encuentra en proceso sancionatorio, y cuya terminación contractual inicial se dio el 5 de febrero de 2022, con un porcentaje de avance del 43.57%

Adicionalmente, como logros de gestión se reporta:

- La entrega del Jardín Infantil Gabriel Betancourt Mejía Sede C. Esta obra civil fue recibida por la entidad a finales de la vigencia 2020, y fue entregada para funcionamiento en el mes de febrero de la presente vigencia. Es de destacar que el jardín infantil cuenta con 9 aulas con capacidad para 225 niños y niñas, en los niveles de prejardín, jardín, y transición. El inmueble se localiza en la Calle 11 A # 88ª – 27, UPZ 78 – EL Tintal, de la localidad de Kennedy, en un predio de cesión pública gratuita.

- Actualmente está por iniciar las obras para la terminación de los jardines infantiles Fontana grande (Juan Lozano y Lozano) y Toscana Lisboa (Sabana de Tibabuyes); así mismo la celebración de los contratos para adelantar las obras complementarias del Colegio la Candelaria, Sede de la Concordia, La Merced, Porvenir y los diseños del centro Pedagógico la Candelaria.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

El proyecto de obra denominado Lombardía, terminó su ejecución contractual el 5 de febrero de 2022, sin cumplimiento de su objeto contractual, por lo cual se dio inicio a proceso de aplicación de cláusula penal pecuniario por incumplimiento, por lo cual se adelanta la estructuración del proceso de contratación para su terminación en la presente vigencia.


c. Registro Fotográfico

1. SED – Colegio Integrado de Fontibón (Sede Emma Villegas de Gaitán) – Fontibón



- Estudiantes beneficiados: 620
- Área Construida: 4.527,86 M2

2. SED – Rafael Uribe Uribe - Tunjuelito

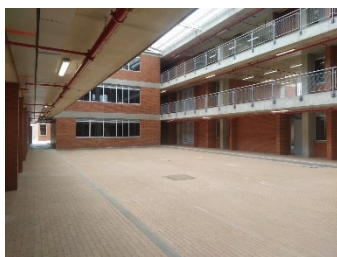

- Estudiantes beneficiados: 1480
- Área Construida: 10.962 M2



6.2. Objetivo Específico 2.

Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.

6.2.1. Producto 2.

Al corte de marzo 31 de 2022, se ha alcanzado una meta acumulada de 297 sedes educativas con 419 intervenciones en lo corrido de las vigencias.

Con el proceso de licitación SED-LP-DCCEE-006-2021, adjudicado el 05 de julio de 2021, se busca hacer 200 intervenciones en 193 sedes educativas, 13 sedes administrativas y la atención a emergencias, en materia de adecuación y mejoramiento de su infraestructura, por una cuantía de \$101.552.580.967 pesos m/cte., para obra e interventoría con recursos de fuente cupo de endeudamiento, distribuidos en 8 contratos de obra y 4 de interventoría para las diferentes localidades de Bogotá.

Adicionalmente, en el mes de diciembre de 2021, se adelantó una adición a los contratos de obra con recursos FOME por valor de \$ 4.459.570.527 para la atención de 26 sedes educativas en temas de mejoramiento de baterías sanitarias y ventilación, de la misma forma se adicionaron recursos de cupo de endeudamiento por valor de \$ 7.250.124.357 para la atención de 8 sedes educativas y 2 sedes administrativas.

En los meses de enero y febrero 2022 se terminaron 18 intervenciones de mejoramiento en diferentes sedes educativas en las localidades de Usaquén, Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Puente Aranda, paralelamente se adelantan obras en 77 sedes más con un promedio de ejecución del 48% y un avance técnico promedio de total contratado en los 8 grupos de obra del 27.42%.

Para el mes de marzo de 2022, se entregaron 11 intervenciones de mejoramiento en 10 sedes educativas y 1 sede administrativa (Dirección Local de Usaquén), de igual forma se realizó la atención de emergencias a 11 sedes educativas, para un total de 22 intervenciones reportadas en este mes, distribuidas en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Usaquén, Tunjuelito y Puente Aranda. De igual manera se continua con la ejecución 73 frentes de obra de mejoramiento con un promedio de ejecución del 43% y un avance técnico total contratado en los 8 grupos de obra de 37,4 %.

Tabla 11. Productos 2

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa mejorada	251	0	Para la vigencia 2022, se programó la intervención de 251 sedes educativas, adicionalmente se realizarán obras de mejoramiento en 121 sedes educativas, las

			cuales hacían parte de la meta programada para la vigencia 2021. A corte de 31 de marzo, se ha ejecutado el 33,06% de la meta rezago, beneficiando a las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Usaquén, Tunjuelito y Puente Aranda.
--	--	--	--

6.2.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.2.2.1. *Meta 2:* Intervenir 730 sedes educativas existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

A 31 de marzo se logró intervenir 40 Sedes Educativas existentes con obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias equivalentes a 33,06% de cumplimiento de la meta rezago, con el fin de robustecer las condiciones de las plantas físicas educativas, en cuanto a baterías sanitarias, cubiertas, áreas libres y recreativas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, cerramientos y mejoramiento de ventilación y carpintería metálica.

De otra parte, se avanzó con la ejecución de 73 frentes de obra priorizadas, con porcentajes de avance 73 frentes de obra de mejoramiento con un promedio de ejecución del 43% y un avance técnico total contratado en los 8 grupos de obra de 37,4 %.

Tabla 12. Intervenciones Consolidadas 2022

COMPONENTES	MEJORAMIENTOS	EMERGENCIAS	TOTAL
ENERO	8	0	8
FEBRERO	10	0	10
MARZO	11	11	22
INTERVENCIONES			40

A continuación, se relacionan cada una de las instituciones educativas que fueron intervenidas en lo corrido del primer trimestre del 2022:

Tabla 13. Discriminación de mejoramientos y emergencias recibidos 2022

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE
TERMINADOS EN ENERO 2022			
1	USAQUEN	Colegio Cristóbal Colon (IED)	Sede B Santa Cecilia Baja
2	ENGATIVA	Colegio Villa Amalia (IED)	Sede A Villa Amalia
3	TUNJUELITO	Colegio Ciudad de Bogotá (IED)	Sede A Ciudad de Bogotá
4	CIUDAD BOLIVAR	Colegio Rafael Uribe Uribe (IED)	Sede A Rafael Uribe Uribe
5	CIUDAD BOLIVAR	Colegio Ciudad Bolívar - argentina (IED)	Sede A Ciudad Bolívar
6	KENNEDY	Colegio Class (IED)	Sede A Class
7	KENNEDY	Colegio Eduardo Umaña Luna (IED)	Sede A Eduardo Umaña luna
8	KENNEDY	Colegio Darío Echandía (IED)	Sede A Darío Echandía
TERMINADOS EN FEBRERO 2022			
9	USAQUEN	Colegio Nuevo Horizonte (IED)	Nuevo Horizonte
10	SUBA	Colegio Gustavo Morales (IED)	Ciudad Jardín Norte
11	CIUDAD BOLIVAR	Colegio San Francisco (IED)	San Francisco
12	KENNEDY	Colegio Marsella (IED)	Marsella
13	KENNEDY	Colegio Fernando Soto Aparicio (IED)	Alfonso López Pumarejo
14	BOSA	Colegio Fernando Mazuera Villegas (IED)	Humberto Valencia
15	BOSA	Colegio Villas del Progreso (IED)	Villas Del Progreso
16	BOSA	Colegio Brasilia - Bosa (IED)	Luis Hernando Perea
17	BOSA	Colegio Alfonso López Michelsen (IED)	Alfonso López Michelsen
18	PUENTE ARANDA	Colegio Técnico Benjamín Herrera (IED)	Benjamín Herrera
TERMINADOS EN MARZO 2022			
19	CIUDAD BOLIVAR	Colegio Cundinamarca (IED)	Cundinamarca
20	USME	Colegio Los Tejares (IED)	Los Tejares
21	USME	Colegio Eduardo Umaña Mendoza (IED)	Eduardo Umaña Mendoza
22	USME	Colegio El Cortijo - Vianey (IED)	El Cortijo

23	SAN CRISTOBAL	Colegio San Vicente (IED)	Colegio San Vicente (IED)
24	BOSA	Colegio Motorista (CED)	Motorista
25	BOSA	Colegio Orlando Higueta Rojas (IED)	Orlando Higueta Rojas
26	USME	Colegio Fernando González Ochoa (IED)	Fernando González Ochoa
27	CIUDAD BOLIVAR	Colegio Antonio Garcia (IED)	Antonio Garcia
28	CIUDAD BOLIVAR	Colegio Gimnasio Sabio Caldas (IED)	Colegio Gimnasio Sabio Caldas
29	USAQUEN	Dirección Local de Usaquén	Dirección Local de Usaquén
30	KENNEDY	Colegio Hernando Duran Dussan (IED)	Hernando Duran Dussan
31	KENNEDY	Colegio La Amistad (IED)	La Amistad
32	KENNEDY	Colegio Carlos Arango Vélez (IED)	Carlos Arango Vélez
33	KENNEDY	Colegio Las Américas (IED)	Las Américas
34	KENNEDY	Colegio Los Periodistas (IED)	Los Periodistas
35	KENNEDY	Colegio Kennedy (IED)	Kennedy
36	USAQUEN	Colegio Usaquén (IED)	Usaquén
37	TUNJUELITO	Colegio INEM Santiago Pérez (IED)	INEM Santiago Pérez
38	PUENTE ARANDA	Colegio La Merced (IED)	La Merced
39	PUENTE ARANDA	Colegio Técnico Benjamín Herrera (IED)	Republica De Francia
40	PUENTE ARANDA	Colegio Julio Garavito Armero (IED)	Muzu II

Fuente: Reporte seguimiento equipo de mejoramientos

Los mejoramientos relacionados integran actividades propias de reparaciones locativas dentro de las instituciones educativas, intervenciones en los colegios en atención a requerimientos de servicios públicos y atención de emergencias.

De igual manera se desarrollaron actividades de Señalización y Señalética mediante la ejecución de pintura sobre pisos que enmarcan, la circulación segura, a las áreas académicas, como el suministro e instalación de las señales informativas que generan la recordación en términos de prevención en 713 sedes del distrito, cumpliendo así la meta del 100% de las instituciones educativas atendidas a julio 31 de 2021. Se ha logrado la demarcación de 382 de los 387, es decir el 98% de sedes educativas proyectadas en la estrategia de demarcación. Con las actividades citadas se viene aportando a

garantizar que los ambientes de aprendizaje cumplan con la normatividad para garantizar el retorno a la presencialidad de los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad educativa.

Tabla 14. Colegios en señalización y señalética 2021

ESTADO SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA					
ID	LOCALIDADES	SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	TERMINADOS	TOTAL
1	Antonio Nariño	0	0	5	5
2	Barrios Unidos	0	0	9	9
3	Bosa	0	0	39	39
4	Chapinero	0	0	3	3
5	Ciudad Bolívar	1	1	44	46
6	Engativá	0	0	35	35
7	Fontibón	1	0	10	11
8	Kennedy	1	0	45	46
9	La Candelaria	0	0	2	2
10	Los Mártires	0	0	8	8
11	Puente Aranda	0	0	15	15
12	Rafael Uribe Uribe	0	0	28	28
13	San Cristóbal	1	0	34	35
14	Santafé	0	0	9	9
15	Suba	0	2	28	30
16	Sumapaz	0	0	2	2
17	Teusaquillo	0	0	2	2
18	Tunjuelito	0	0	12	12
19	Usaquén	0	0	12	12
20	Usme	1	1	49	51
Total		5	4	391	400
01.06.2021					

En el mes de diciembre de 2021, se adelantó una adición a los contratos de obra con recursos FOME por valor de \$ 4.459.570.527 para la atención de 26 sedes educativas en temas de mejoramiento de baterías sanitarias y ventilación, de la misma forma se adicionaron recursos de cupo de endeudamiento por valor de \$ 7.250.124.357 para la atención de 8 sedes educativas y 2 sedes administrativas.


b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

Se ajustó y acordó en conjunto con los directivos de las instituciones educativas los planes de contingencia de los frentes de obra que se encuentran en ejecución con el fin de afectar lo menos posible el regreso a la presencialidad en los colegios. Sin embargo, en aquellos planes de contingencia donde se realizan paralelamente actividades de obra y actividades propias de los establecimientos educativos se ha tenido que coordinar horarios de trabajo e ingreso y salida de materiales con el fin de no afectar la presencialidad, lo que ha ocasionado que las actividades demoren más de lo previsto, adicionalmente el anticipo de la temporada de lluvias ha dificultado las labores en aquellos frentes donde se está interviniendo cubierta y/o áreas exteriores.


Se han presentado situaciones de escasez y demoras en los suministros de materiales como; pisos, enchapes, acero inoxidable y acero ocasionado demoras en los procesos constructivos, lo que ha generado el incremento en los horarios de trabajo.

c. Registro Fotográfico

1. Colegio San José – Sede C Casa Blanca – Localidad de Kennedy

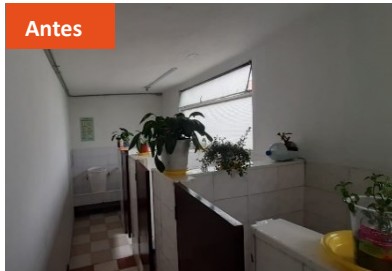

2. Colegio Técnico Rodrigo de Triana IED – Sede B Las Palmeras – Localidad de Kennedy

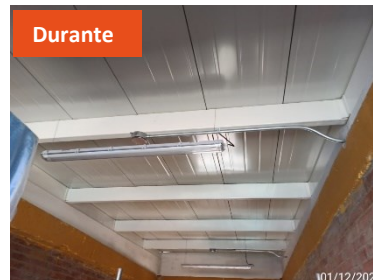

3. Colegio Antonio Van Uden - Sede B La Estación -Localidad Fontibón



4. Colegio Costa Rica IED - Sede A Republica de Costa Rica -Localidad Fontibón



5. Demarcación, señalización y señalética



6.3. Objetivo Específico 3

Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

6.3.1 Producto 3.

Infraestructura educativa dotada

Tabla 15. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa dotada	295	0	Los 8 compromisos suscritos en el primer trimestre por valor de \$4.435 millones, corresponden a elementos de bioseguridad que están en proceso de entrega y adquisición de computadores que se encuentran en proceso de fabricación y ensamble, no obstante, dadas las condiciones actuales en materia de escasez en el suministro de insumos de hardware, las entregas —pueden demorar unos meses. La ejecución de los recursos restantes de la Vigencia 2022, actualmente se encuentra en proceso precontractual, de acuerdo con lo planeado en el PAA en respuesta al proyecto de inversión.

6.3.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.3.2.1 Meta 3: Dotar las 770 sedes educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial

a. Avances y/o Logros:

En la meta 3. Al finalizar el 2021 se tiene un logro 294 sedes en lo corrido del cuatrienio, es decir se avanzó con el cumplimiento de la meta en un 38,18%, precisando que durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se continúa entregando dotación complementaria en estas, en ejecución de los recursos de las reservas presupuestales.

Atendiendo la programación del Plan Anual de Adquisiciones, durante el mes de enero 2022 se logró cumplir con la contratación del grupo de profesionales y técnicos de apoyo requerido para realizar las gestiones de las diferentes labores que implican la ejecución de los recursos asignados al proyecto para adquisición de dotaciones.

Al iniciar el mes de marzo 2022 y teniendo en cuenta que, en las condiciones actuales del mercado comunicadas por algunos fabricantes de tecnología, se debe prever aproximadamente 180 días, como tiempo mínimo para la comercialización, fabricación y ensamble de equipos de cómputo, generado por el desabastecimiento de algunos componentes esenciales para su fabricación, se optó por adicionar los contratos vigentes No 3007839 con CORREAGRO S. A. y No. 300783901 con SUMIMAS S.A.S. por valor de \$4.200 millones, para contratar la adquisición de equipos de cómputo programados para la vigencia 2022; a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Mercantil de Colombia. Lo que nos permitirá responder con mayor celeridad y oportunidad en la entrega de esos equipos durante la actual vigencia.

Con el fin de atender oportunamente las necesidades de las Instituciones Educativas en materia de bioseguridad, simultáneamente se suscribieron cuatro (4) órdenes de compra, por un valor total de \$ 150.860.549, para la adquisición de los elementos de bioseguridad faltantes, como apoyo a las

estrategias de manejo y control del Covid-19, frente a un retorno seguro a clases, de los niños, niñas y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital. Igualmente se adquirió una impresora industrial de etiquetas para apoyar el proceso identificación de los bienes muebles que ingresan a los inventarios a cargo de la SED, lo cual permite llevar el consecutivo del registro de los bienes en los inventarios y el control de la vida útil de los mismos.

Así mismo, se continuó con los procesos de recepción y entrega de las dotaciones en las diferentes sedes, para dar cumplimiento a los cronogramas de la ejecución de la reserva presupuestal previstos, realizando giros por valor de \$ 2.471.499.939 que se sumaran al valor de las entregas de la actual vigencia para el reporte de las metas en cada una de las sedes educativas.

Es preciso indicar que las sedes reportadas son aquellas que reciben dotaciones en lo relacionado con mobiliario escolar y administrativo, material bibliográfico, equipos audiovisuales, cocinas móviles, elementos y equipos de cocina, elementos de bioseguridad, implementos deportivos y paquetes con útiles escolares; así mismo, es importante resaltar que se entregaron dotaciones de elementos de protección personal como tapabocas y de bioseguridad.

Luego de superar los retrasos generados por las medidas de mitigación ante el COVID 19 y la migración a BogData realizada por la Secretaría de Hacienda Distrital, que afectaron los cronogramas previstos asociados a la gestión de recursos ante las entidades de Administración Distrital y por ende la adquisición de los dispositivos tecnológicos, se logró al finalizar la vigencia 2020, la suscripción de las órdenes de compra No.57938 para tabletas y la orden de compra No. 57939 para portátiles, adquiriendo un total de 98.816 dispositivos (93.250 Tabletetas y 5.566 computadores) de acceso para la conectividad.

En la vigencia 2021, cumpliendo el compromiso de priorizar la adquisición de dispositivos de acceso, se optó por adicionar recursos por valor de \$1.720.286.654, a la orden de compra No.57938 suscrita con SISTETRONICS LTDA, para la adquisición de 2.933 tabletas adicionales, en el marco del proceso de adquisición de dispositivos de acceso a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Finalizando el mes de enero se contó con un total de 101.749 dispositivos adquiridos, los cuales fueron entregados por el proveedor a lo largo de la vigencia, conforme los cronogramas establecidos.

Con corte a 31 de diciembre de 2021 se reporta un avance en la meta de entrega de los dispositivos tecnológicos de 101.749 dispositivos (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) a Instituciones Educativas Distritales quienes realizaron las entregas a estudiantes vulnerables focalizados de los grados de sexto a undécimo con recursos propios. Además, realizó gestiones para recolectar el mayor número de dispositivos tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. Por lo tanto, hasta la actualidad, se ha realizado la recolección y entrega de 3.706 dispositivos adicionales (Donaton:1057 dispositivos, Grupo de Energía de Bogotá: 2.509 dispositivos y Organización Internacional para las Migraciones: 140 dispositivos) logrando así un total de 105.455 equipos entregados.

Conforme a lo anterior, se evidencia el cumplimiento anticipado la meta del cuatrienio y se constituye en un hito en la ciudad y en el país, puesto que en los últimos 30 años la Secretaría de Educación había entregado sólo 89 mil dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales.

Por otra parte, durante la vigencia 2021, se continuó con los procesos de recepción y entrega de las dotaciones en las diferentes sedes. Para dar cumplimiento a los cronogramas de ejecución de la reserva presupuestal previstos, se ejecutaron reservas por valor de \$ \$74.843 millones, de los cuales \$ 61.958 millones corresponden a la entrega de dispositivos de acceso y actividades conexas con la entrega; igualmente se entregaron elementos de bioseguridad, elementos, materiales y equipos de tecnología, paquetes con útiles escolares, dotaciones de cocina y material bibliográfico, entre otros, que suman \$12.823 millones, los restantes \$61.5 millones corresponden a prestaciones de servicios profesionales y técnicos correspondiente al mes de enero.

Por otra parte, luego de la incorporación presupuestal de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia – FOME, notificados al finalizar la vigencia 2020 de conformidad con la Resolución No. 022751 de 09 diciembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, durante la vigencia 2021 se optó por adicionar once (11) órdenes de compra vigentes, por un valor total de \$ 2.144.464.230, y la suscripción de ocho (8) órdenes de compra por valor de \$ 655.535.770, a través de Adhesión a Instrumento de Agregación de Demanda por la emergencia del COVID-19, para la adquisición de los elementos de bioseguridad necesarios como apoyo a las estrategias de manejo y control de la pandemia del Covid-19, frente al retorno seguro a clases, de los niños, niñas y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital, logrando así celeridad en la adquisición y entrega de estas dotaciones, conforme fueron surgiendo las necesidades, y logrando así, la ejecución de los \$2.800.000.000 recibidos del Fondo de Mitigación de Emergencia – FOME.

Igualmente, para la adquisición de mobiliario escolar y administrativo, a través del acuerdo marco de precios, con destino a las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local de la SED, se suscribió la orden de compra No. 73919 con INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA, a la cual se le realizó una pequeña adición para un valor total de \$ 17.872 millones; para este mismo fin se suscribió el contrato No. 3071958 con ADC DECORACIONES LIMITADA por valor de \$660 millones, así mismo se asumieron pasivos exigibles por este mismo concepto, correspondientes a la ejecución de los contratos No. 621418 con la UNION TEMPORAL LUCENA LEGUIZAMON ESCOLAR 2018 y contrato No. 1195348 con CONSORCIO DOTACION SED BOGOTA 01 2019 por un valor total de por valor de \$867 millones.

En el último bimestre se adquirieron compromisos por valor de \$ 51.266 correspondientes a los contratos No. 3007839 con CORREAGRO S. A. y No. 300783901 con SUMIMAS S.A.S. realizados a través de los sistemas de negociación administrados por la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA con el objeto de contratar la adquisición de equipos de cómputo.

Paralelamente, se suscribieron los siguientes contratos: No 3131154 con la UNION TEMPORAL EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 096 UT para la adquisición de los laboratorios de física, química, ciencias naturales y ambientes de formación especializados de las instituciones educativas por valor de \$ 10.959 millones, contrato No 3121921 con la UNION TEMPORAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS 073 UT para la adquisición de maquinaria y equipos especializados para el

fortalecimiento de los ambientes de formación de las instituciones educativas por valor de \$ 9.860 millones, contrato No 3089201 con AV DESING COLOMBIA SAS para la adquisición de equipos de tecnología con destino a las instituciones educativas distritales, nivel central y local, por valor de \$ 4.557 millones, contrato No 3113751 con INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS para adquirir equipos de cocina y equipos especializados para el fortalecimiento de los ambientes de formación de las instituciones educativas, por valor de \$6.187 millones, contrato No. 3094692 con COMERCIALIZADORA COMSILA SAS para la adquisición de paquetes con útiles escolares para entrega en las instituciones educativas oficiales, por valor de \$ 2.909 millones.

No menos importante fueron otros ocho (8) contratos suscritos al cierre de la vigencia por valor de \$1.526 millones que se describen a continuación:

No. Contrato	Nombre proveedor	Concepto de dotación adquirida	Total
3089255	INVERSIONES GUERFOR S.A.	Parques infantiles	\$ 477.875.832
3113834	ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA SAS	Estantería tipo pesada	\$ 376.476.800
3098544	GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS LTDA	Equipos de practica en redes de conectividad	\$ 337.479.744
3104074	ACTIVA T SAS	Repuestos para mantenimiento de bicicletas	\$ 163.618.024
3119794	TDEPE SAS	Equipos y herramientas agropecuarias	\$ 155.204.380
81843	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS LTDA	Kit de canecas grandes y kit de canecas medianas (PIGA)	\$ 13.533.075
81844	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	Canecas de pedal 12 litros (PIGA)	\$ 1.454.585
82629	SUMIMAS S.A.S.	Balanza electrónica	\$ 681.242
		TOTAL	\$ 1.526.323.682

En el mes de julio también se invirtieron \$689.222.952, para coadyuvar en el financiamiento de la adquisición de la póliza Todo Riesgo daño Material, con el fin de salvaguardar las dotaciones, que permitan atender de manera oportuna la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación y sus sedes administrativas.

Es necesario precisar que durante la vigencia fue necesario asumir otros compromisos por concepto de reconocimiento de pasivos exigibles, por valor de \$ 2.213 millones, que a continuación se describen:

No. Contrato	Nombre proveedor	CONCEPTO	Total
1024516	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS	EQUIPOS DE COCINA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$ 39.522.498
1031347	UNION TEMPORAL UT GROUP	COCINAS MOVILES	\$ 1.264.000.000
1038911	TEAM CORP S A S	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 809.187.103
103531419	NEX COMPUTER SAS	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	\$ 100.818.350
		TOTAL	\$ 2.213.527.951


Con los compromisos descritos se logró que todos los recursos apropiados en la vigencia 2021 quedaran comprometidos al 31 de diciembre. Con la gestión y actividades realizadas, para la adquisición de las dotaciones programadas, se benefician los estudiantes, maestros y personal administrativo, con la atención oportuna de las necesidades más apremiantes de dotación, en los

ambientes de aprendizaje, que les faciliten el desarrollo que requiere la práctica pedagógica, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y la promoción del bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos. Igualmente, se continua con la actualización de las dotaciones obsoletas, en materia tecnológica, lo cual contribuye al cierre de brechas digitales, manifiestas especialmente entre poblaciones vulnerables y los demás grupos poblacionales; todas las dotaciones han sido planeadas para garantizar ambientes de disfrute, recreación, esparcimiento y la socialización para los niños y niñas, potenciando su desarrollo cognitivo y psicomotriz, estimulando su desarrollo integral.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

Durante los meses de enero a marzo de 2022, no se presentaron retrasos, solo los imprevistos propios del inicio de cada vigencia que se solucionan con oportunas gestiones administrativas por parte de las diferentes áreas responsables en la SED.

b. Registro Fotográfico



6.4. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto

El plan de adquisiciones del proyecto 7638 programó 186 ítems para el primer trimestre de la vigencia, de los cuales fueron ejecutados en su totalidad. La ejecución del PAA por componente se dio de la siguiente manera:

01 Construcción: en el PAA se había programado 128 ítems que corresponden a procesos de obra e interventorías, modificaciones contractuales a contratos en ejecución y prestaciones de servicio. los cuales fueron ejecutados en su totalidad.

02 Mejoramientos: Para el componente de mejoramientos para el primer trimestre no se programaron ítems en el PAA.

03 Dotaciones: En el primer trimestre de la vigencia 2022, fueron programados 57 ítems en el PAA los cuales se ejecutaron todos, así: 53 ítems asociados a contratos prestación de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión, 4 ítems para la adquisición de elementos bioseguridad incluidos tapabocas, compra computadores y adquisición de una impresora industrial. Adicionalmente se ejecutó 1 ítem para la adquisición de equipo y herramienta agropecuarias para las instituciones educativas, el cual estaba programado para el mes de abril.

Tabla 16. Plan de Adquisiciones Primer Trimestre 2022

COMPONENTE DE GASTO	OBJETO DE GASTO	No DE CONTRATOS PROGRAMADOS	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO
7638-01 CONSTRUCCION Y TERMINACION	7638 - Compra de lotes, diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa nuevas y existentes en modalidades de: colegio nuevo, restitución, terminación o ampliación y/o adicionales	16	16	62.648.420.969*
	7638 - Suministrar el personal de apoyo profesional y técnico para garantizar la adecuada ejecución del proyecto	112	112	9.800.871.500
7638-02 MEJORAMIENTOS	763802008 - Adquirir el plan de seguros para salvaguardar los inmuebles de propiedad de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, bajo su responsabilidad, tenencia, control y/o custodia.	0	0	0
	7638 - Adelantar diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento menor complementarias a la infraestructura de los colegios distritales y/o adicionales	0	0	0
7638-03 DOTACIONES	763803001 - Dotar mobiliario, equipos, maquinaria, herramientas e implementos de cómputo, tecnología, comunicaciones, audiovisuales, laboratorio, taller, recreación, deporte, cocina y comedor, recursos bibliotecas, arte, cultura, instrumentos y su mantenimiento.	5	5	4.434.851.744

COMPONENTE DE GASTO	OBJETO DE GASTO	No DE CONTRATOS PROGRAMADOS	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO
	763803002 Garantizar el personal de apoyo profesional y técnico en la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; así como el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución del componente.	53	53	3.069.643.000
	763803003 Dotar de dispositivos de acceso para la conectividad de los estudiantes de los colegios del distrito, y así contribuir al cierre de brechas digitales	0	0	0
	763803006 Adquirir el plan de seguros para salvaguardar las dotaciones para atender la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación, y sus sedes administrativas.	0	0	0
	7638-007 Garantizar el equipo profesional, técnico y de apoyo, idóneo para realizar el acompañamiento a la supervisión, en la ejecución de los contratos de adquisición de los dispositivos de acceso para la conectividad de los estudiantes de los colegios del distrito, y así contribuir al cierre de brechas digitales; al igual que realizar el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución.	0	0	0
TOTAL		186	186	\$ 79.953.787.213**

(*) El valor registrado como ejecutado corresponde a lo programado en el anteproyecto de presupuesto 2022, el cual este sujeto a cambios de acuerdo al resultado de los procesos de estructuración contractual que se encuentran en revisión.

(**) El seguimiento corresponde a los procesos programados para radicación en el primer trimestre de 2022, por lo tanto, el valor ejecutado final se tendrá una vez sean registrados los procesos contractuales.

7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

7.1. Meta Plan 91.

Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, En lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten

con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

7.1.1. Avances, logros y compromisos

En el marco de la ejecución de la meta (91) Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, a 31 de marzo, la entidad ha inaugurado nueve (9) colegios, dos (2) colegios se encuentran terminados en proceso de inauguración, la entidad se encuentra ejecutando dieciséis (16) proyectos de obra, de los cuales en tres se adelanta obras complementarias y conexiones de servicios públicos, dos (2) proyectos se encuentran próximos a iniciar obra, cinco (5) proyectos cuyas licencias de construcción se obtuvieron en la presente vigencia se encuentran en proceso de contratación, y un (1) proyecto en trámite de licencia.

En cuanto a los procesos contractuales que habían sido adjudicados en el 2021, los proyectos Hacienda Casablanca y Boíta, iniciaron su ejecución el 17 de marzo de 2022 y 25 de marzo de 2022, respectivamente. El proyecto la Magdalena fue adjudicado el día 30 de marzo de 2022 y se estima que la obra inicie su ejecución en la segunda quincena del mes de abril, frente al proyecto San Francisco de Asís, se adelanta el proceso de contratación que se proyecta ser adjudicado el 26 de abril de 2022. De otra parte, el proyecto de Hipotecho y Bonavista iniciaron su ejecución en el mes de febrero y marzo del 2022 y el Colegio Bolonia se estima inicie en el mes de abril.

Es así como, en el marco de la ejecución de la meta 91., en la vigencia 2022 se proyectó como meta la terminación de 11 proyectos de sedes educativas, de las cuales 7 hacen parte de la meta 2022 y 4 que hacen parte de la meta proyectada en el 2021. A corte de marzo de 2022, la meta PDD acumulada corresponde a once (11) colegios terminados, lo que corresponde al 31,42%.

7.1.2. Retrasos y soluciones

El proyecto de obra denominado Lombardía, terminó su ejecución contractual el 5 de febrero de 2022, sin cumplimiento de su objeto contractual, por lo cual se dio inicio a proceso de aplicación de cláusula penal pecuniario por incumplimiento, por lo cual se adelanta la estructuración del proceso de contratación para su terminación en la presente vigencia.

7.1.3. Beneficios

En el marco del cumplimiento de la meta plan de desarrollo, con los colegios terminados/entregados durante la vigencia 2020 y 2021 que corresponden a once (11), se ampliará la cobertura en 9.121 cupos nuevos los cuales garantizarán el acceso y la permanencia a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, La Calendaría, Kennedy, Fontibón y Engativá.

Se proyecta que las obras que se encuentran en ejecución beneficiaran a más de 22.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Antonio Nariño, Fontibón, San Cristóbal, Tunjuelito, y Engativá, aportando de esta manera al cierre de brechas de acceso y permanencia en la educación con equidad e igualdad en la ciudad.

7.2 Meta Plan 90:

100.000 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso

7.2.1 Avances, logros y compromisos

A 31 de diciembre de 2021 la SED realizó la entrega de 101.749 (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) dispositivos tecnológicos, logrando una ejecución de la meta del 101,75%. Estos dispositivos fueron entregados a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes, a su vez, las entregan a estudiantes vulnerables beneficiados en la focalización de colegios oficiales del Distrito de grados 6º a 11º. Es preciso indicar que la SED adicional a lo anterior, realizó gestiones para recolectar el mayor número de dispositivos tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. A la fecha se ha realizado la recolección y entrega de 3.706 dispositivos adicionales (Donaton:1057 dispositivos, Grupo de Energía de Bogotá: 2.509 dispositivos y Organización Internacional para las Migraciones: 140 dispositivos) logrando así un total de 105.455 equipos entregados.

Conforme a lo previsto en la planeación del proceso, a 31 de diciembre de 2021 se culminó la respectiva distribución y entrega de los 101.749 dispositivos adquiridos, en instituciones educativas distritales de las localidades, para estudiantes vulnerables focalizados de los grados de sexto a undécimo. Lo anterior implicó realizar las respectivas pruebas técnicas y alistamiento de los mismos, en razón al proceso de fabricación, transporte y alistamiento de nuevos dispositivos. Estos dispositivos están particularmente orientados a estudiantes de educación secundaria y media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad (según el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT), quienes se priorizan a partir de los criterios de pobreza, ruralidad y pertenencia a poblaciones de especial protección constitucional (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, entre otros).

Es necesario precisar que la razón del cumplimiento de la meta por encima del 100%, se originó desde la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2021 realizada en el mes de octubre de 2020 donde se solicitaron recursos por valor de \$15.000 millones de pesos para la adquisición de 15.000 dispositivos con el fin de cumplir al 100% la meta de “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”; sin embargo, el mes de diciembre de 2020 se recibieron recursos adicionales por valor de \$14.749 millones para lograr adquirir el mayor número de dispositivos durante el año 2020 y de esta manera adelantar en parte el cumplimiento de la meta prevista en el Plan de Desarrollo; lo que permitió la adquisición de 98.816 dispositivos, quedando pendientes para la vigencia 2021 solamente la adquisición de 1.184 dispositivos. Sin embargo, analizando las solicitudes pendientes de atención; a finales de enero de 2021 se realizó una segunda modificación a la orden de compra No. 57938 de 2020, por valor de \$1.720 millones, con las cuales se adquirieron 2.933 dispositivos electrónicos, que sumados a los 98.816 adquiridos durante la vigencia 2020, permitió registrar una compra acumulada de 101.749 dispositivos, con el fin de beneficiar a más estudiantes vulnerables y así contribuir al cierre de brechas digitales.

Es pertinente mencionar que el logro de la meta “100.000 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”, estaba previsto para ser alcanzado a lo largo del cuatrienio, conforme lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del SIGLO XXI”. Sin embargo, la SED adelantó todos los procesos jurídicos, administrativos y contractuales que permitieron cumplir anticipadamente la meta en el segundo semestre de 2021.

En la vigencia 2022, observando que al cierre de 2021 la meta ya se encontraba cumplida con la entrega de los 101.749 dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes a su vez los entregan a los estudiantes focalizados; y que para el 2022 se apropiaron recursos para este propósito; en febrero, se tramitó ante la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, un incremento de la magnitud del indicador de esta meta el cual fue aprobado, y que se fundamentó en la necesidad de igualar en la vigencia 2021 la meta programada, al logro obtenido de 101.749 , y para la vigencia 2022 incrementarla en 22.825 con el fin de cubrir el déficit de estudiantes de colegios públicos sin computador o tableta en sus hogares; conforme a los resultados de la encuesta de Calidad de vida DANE 2018, por lo que al cierre del trimestre la meta quedo reprogramada en **“124.574 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”**.

Al finalizar marzo, se culminó el trámite administrativo y presupuestal interno, para iniciar el proceso contractual para adquirir los 22.825 dispositivos adicionales, a través del acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE; actualmente se adelanta el evento llamado RFI (Solicitud de Información a Proveedores), el cual fue remitido a todos los proveedores que se encuentran participando en los lotes 7 y 8 del acuerdo marco de precios, con el fin de que estos proveedores conozcan las condiciones técnicas que requiere la SED; ya se han recibido algunas observaciones técnicas, las cuales se encuentran en verificación del área competente, para posteriormente proceder con el lanzamiento del evento de cotización y análisis de los precios, se tiene proyectado que las órdenes de compra se adjudiquen entre abril y los primeros días de mayo.

7.2.2 Retrasos y soluciones

En la vigencia 2021, Los dispositivos superaron su etapa de fabricación, con algunos retrasos generados por las dinámicas mundiales con relación a la pandemia del COVID 19, asociados al desabastecimiento de partes tecnológicas, sin embargo, ya superados estos imprevistos, y una vez nacionalizado el ultimo lote de dispositivos se dio celeridad al cumplimiento de la totalidad de las entregas, durante el segundo semestre de la vigencia.

Para la vigencia 2022 los retrasos corresponden al perfeccionamiento del nuevo del acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y a las gestiones interinstitucionales para el incremento en la meta plan, para posteriormente reflejar los logros por esta meta sectorial.

7.2.3 Beneficios

Las acciones que se han adelantado en el marco de la ejecución de los contratos para adquirir dispositivos de acceso y equipos portátiles, a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, permitirán avanzar de forma determinante en la contribución al cierre de brechas digitales en el Distrito Capital, aspecto asociado directamente a la meta del Plan de Desarrollo Distrital definida como *“Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables. Con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad para contribuir al cierre de brechas digitales”*, con la entrega de los 101.749 dispositivos de acceso en la vigencia 2021, más la compra proyectada de los 22.825 dispositivos en el 2022, se benefician igual número de estudiantes vulnerables matriculados en los establecimientos educativos oficiales.

7. CONCLUSIONES

La ciudad cuenta con once (11) colegios terminados: 1. "La Bici" ubicado en la localidad de Bosa, 2. "Carlos Arango Vélez", ubicado en la localidad de Kennedy, 3. Tabora ubicado en la localidad de Engativá y 4. el Colegio denominado la Candelaria ubicado en la localidad Candelaria, 5. "Parques de Bogotá – Campo Verde II" y 6. "Laurel de Cera – Campo Verde I" ubicados en la localidad de Bosa, 7. "Laureano Gómez", ubicado en la localidad de Engativá, el 8. Colegio denominado "El Nogal – Predio Sierra Morena Parque" ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, 9. el colegio "Ciudad de Techo I" ubicado en la localidad de Kennedy, 10. Integrado de Fontibón - Emma Villegas De Gaitán ubicado en la localidad de Fontibón, y 11. Rafael Uribe Uribe en la localidad de Tunjuelito.

Se han intervenido con mejoramientos y atención a emergencias la infraestructura de 297 sedes educativas con 419 intervenciones en lo corrido de las vigencias 2020 a 2022, beneficiando a más de 140.000 estudiantes de 15 localidades, garantizando así ambientes escolares en los que puedan desarrollar todo su potencial académico, deportivo, artístico y científico.

Adicionalmente en las vigencias 2020 y 2021, se desarrollaron actividades de demarcación y dotación con elementos de bioseguridad, a través de los cuales se garantizarán ambientes de aprendizaje que cumplan con la normatividad para un retorno progresivo gradual y seguro en modalidad de alternancia de los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad educativa.

Se realizó la entrega de los dispositivos tecnológicos de 101.749 dispositivos (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) a Instituciones Educativas Distritales quienes realizaron las entregas a estudiantes vulnerables focalizados de los grados de sexto a undécimo con recursos propios. Además, realizó gestiones para recolectar el mayor número de dispositivos tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. Por lo tanto, hasta la actualidad, se ha realizado la recolección y entrega de 3.706 dispositivos adicionales (Donaton: 1057 dispositivos, Grupo de Energía de Bogotá: 2.509 dispositivos y Organización Internacional para las Migraciones: 140 dispositivos) logrando así un total de 105.455 equipos entregados.

De otra parte, la fluctuación de precios en insumos para las obras de construcción, sigue generando afectación en los cronogramas de trabajo para la ejecución de las obras, sin embargo, la entidad ha adelantado las acciones técnicas necesarias, con el fin de minimizar el riesgo en el cumplimiento de las metas trazadas para la vigencia y la ejecución presupuestal.



LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Gerente de Proyecto

Preparó: Luis Alberto Cantor Bello – Profesional DDE
Sandra Galeano - Profesional DCCEE
María Aydee Jiménez Porras – Profesional DCCEE

Revisó: Liliana Díaz Poveda - Directora de Dotaciones
Andrea Lorena Beracasa Villarraga – Asesora SAP
William Octavio Zapata Carreño – Asesor SAP



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación
