

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 enero a 31 marzo de 2023

PROYECTO 7638 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES
DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Elaborado por:
LUIS ALBERTO CANTOR
MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS
MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
SANDRA PATRICIA GALEANO MENDIVELO

Marzo 2023

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.1. <i>Objetivo General.....</i>	4
1.2. <i>Objetivos Específicos</i>	4
2. ALCANCE DEL PROYECTO	4
3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	5
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)	5
5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5
5.1. <i>Ejecución Presupuestal Acumulada.....</i>	7
5.2. <i>Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto.....</i>	7
5.3. <i>Ejecución Reservas Presupuestales</i>	9
6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	9
6.1. <i>Objetivo Específico 1.....</i>	9
6.1.1. <i>Producto 1</i>	9
6.1.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	10
6.2. <i>Objetivo Específico 2.....</i>	18
6.2.1. <i>Producto 2</i>	18
6.2.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	18
6.3. <i>Objetivo Específico 3.....</i>	24
6.3.1 <i>Producto 3</i>	24
6.4. <i>Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto</i>	28
7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.....	30
7.1. <i>Meta Plan 91</i>	30
7.2. <i>Meta Plan 90</i>	31
7. CONCLUSIONES	34

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2023	5
Tabla 2. Modificaciones presupuestales primer trimestre.....	6
Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales	9
Tabla 4. Producto Objetivo 1	9
Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación.....	11
Tabla 6 Proyectos de primera infancia.....	12
Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED	13
Tabla 8. Proyectos cofinanciados.....	14
Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas	15
Tabla 10. Productos 2	18
Tabla 11. Intervenciones Consolidadas 2023.....	20
Tabla 12.Discriminación de mejoramientos y emergencias recibidos 2023	20
Tabla 14. Productos	24
Tabla 15. Plan de Adquisiciones primer trimestre 2023	29
Tabla 16 Proyectos terminados y/o entregados Meta 91.....	34
Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2023.....	7
Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente	8

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.

1.2. Objetivos Específicos

- Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.
- Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.
- Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Con este proyecto se fortalecerá y dotará la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general, cuenten con espacios educativos dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y el acceso a la educación. El proyecto de desarrolla a través de tres (3) objetivos específicos asociados a:

1. Construcción y terminación: en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de construcción, restitución, y ampliación, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje.
2. Mejoramiento (conservación): mediante las acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura se priorizará y desarrollaran intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la necesidad, riesgo y población beneficiada, así como el mejoramiento de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se puedan presentar. Todo esto bajo el principio de optimización de los recursos destinados para estas actividades. Así mismo, se

garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar los bienes inmuebles de la SED.

3. Dotación: desde este componente se atenderán las necesidades de colegios y áreas administrativas, de igual forma, se adelantarán acciones orientadas a garantizar la dotación y renovación de los elementos requeridos y necesarios para atender el aumento de cobertura en los distintos niveles de educación, así como la compra y entrega de dispositivos tecnológicos y de conectividad, de los cuales se beneficiarán los estudiantes más vulnerables de la ciudad, aportando así a la disminución de la brecha digital de la comunidad educativa de la ciudad. De otra parte, se garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar las dotaciones adquiridas por la SED.

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Adjuntar la información enviada en el correo de seguimiento.

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

Adjuntar la información enviada en el correo de seguimiento.

5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

El Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá, inició su ejecución presupuestal el 1 de enero de 2023 con una asignación de \$ 994.900.992.000, distribuidos de la siguiente manera: 01 CONSTRUCCION Y TERMINACIÓN \$ 814.450.683.000, 02 MEJORAMIENTOS \$103.250.564.000 y para el componente de 03 DOTACIONES \$77.199.145.000, como se observa a continuación:

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2023

Componente	Presupuesto Inicial 2023	Traslados entre objetos de gasto	Total, Presupuesto Vigente a marzo de 2023
CONSTRUCCION Y TERMINACION	\$ 814.450.683.000,00	-\$ 10.059.506.000,00	\$ 804.391.177.000,00
MEJORAMIENTOS	\$ 103.250.564.000,00	\$ 2.059.506.000,00	\$ 105.310.070.000,00
DOTACIONES	\$ 77.199.745.000,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 85.199.745.000,00
TOTAL	\$ 994.900.992.000,00	\$ -	\$ 994.900.992.000,00

Frente a modificaciones presupuestales, entre los meses de enero a marzo, el proyecto presento diferentes traslados entre componentes así:

En el componente de construcciones se realizó contra créditos por \$ 10.059.506.000 con destino al componente de dotaciones por \$8.000.000.000 y al componente de mejoramientos por valor de \$2.059.506. 000.Es importante señalar que el traslado realizado al componente de dotaciones se dio en razón a que los recursos inicialmente solicitados no fueron distribuidos al objeto de gasto pasivos exigibles.

Es de precisar que se presentaron traslados entre objetos de gasto del componente de construcciones que no modifican el presupuesto.

Tabla 2. Modificaciones presupuestales primer trimestre

Componente	Presupuesto a 01/01/2023	Modificaciones Crédito	Modificaciones Contra crédito	Presupuesto a 31/03/2023
CONSTRUCCION Y TERMINACION	\$ 814.450.683.000,00	-\$ 10.059.506.000,00		\$ 804.391.177.000,00
MEJORAMIENTOS	\$ 103.250.564.000,00		\$ 2.059.506.000,00	\$ 105.310.070.000,00
DOTACIONES	\$ 77.199.745.000,00		\$ 8.000.000.000,00	\$ 85.199.745.000,00
TOTAL	\$ 994.900.992.000,00	-\$ 10.059.506.000,00	\$ 10.059.506.000,00	\$ 994.900.992.000,00

En cuanto al comportamiento de la ejecución presupuestal del proyecto 7638, a corte de marzo 31, se comprometió el 19,5 % del presupuesto vigente, desagregado por componente así:


01 construcción y terminación: el componente de construcciones presenta compromisos por valor de \$175.481.789.236, correspondientes al 21,8 % de la asignación, direccionados a ejecución de obras, adiciones contractuales, contratación de personal de apoyo a la gestión y pago de trámites.

02 mejoramientos: este componente presenta compromisos por valor de \$ 6.241.304.204, correspondientes al 5.9 % de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra e interventoría y al pago de fallos y sentencias.

03 Dotación: Es preciso indicar que la ejecución presupuestal a 31 de marzo alcanzó el 14.37 %, comprometiendo recursos por valor de \$12.241.032.508, correspondiente a la contratación de prestación de servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión y adquisición de dotaciones.

5.1. Ejecución Presupuestal Acumulada


Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2023

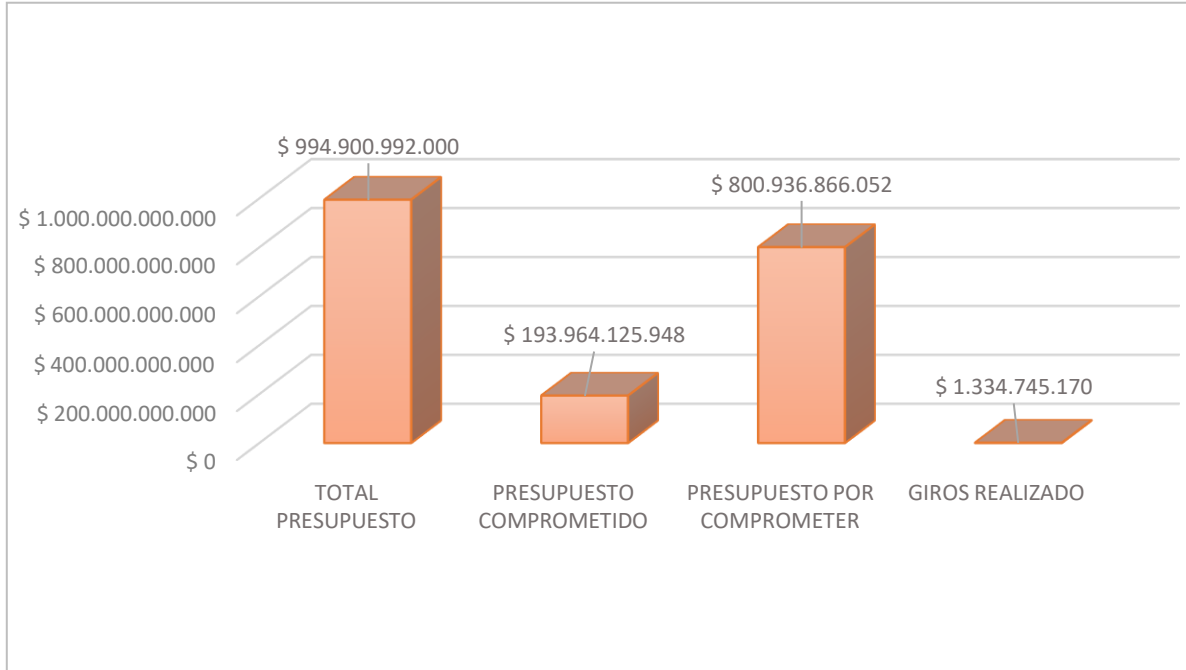

5.2. Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto

Frente a la ejecución presupuestal del proyecto, este se realiza a través de 3 componentes: 01 Construcción y terminación, 02 Mejoramientos y 03 Dotaciones. Los cuales presentan una ejecución al 31 de marzo de 2023 del 21,8 %, 5,9 % y 14.4%, respectivamente. Así mismo, se realizaron giros por valor de \$ 1.334.745.170, como se muestra a continuación:

Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente

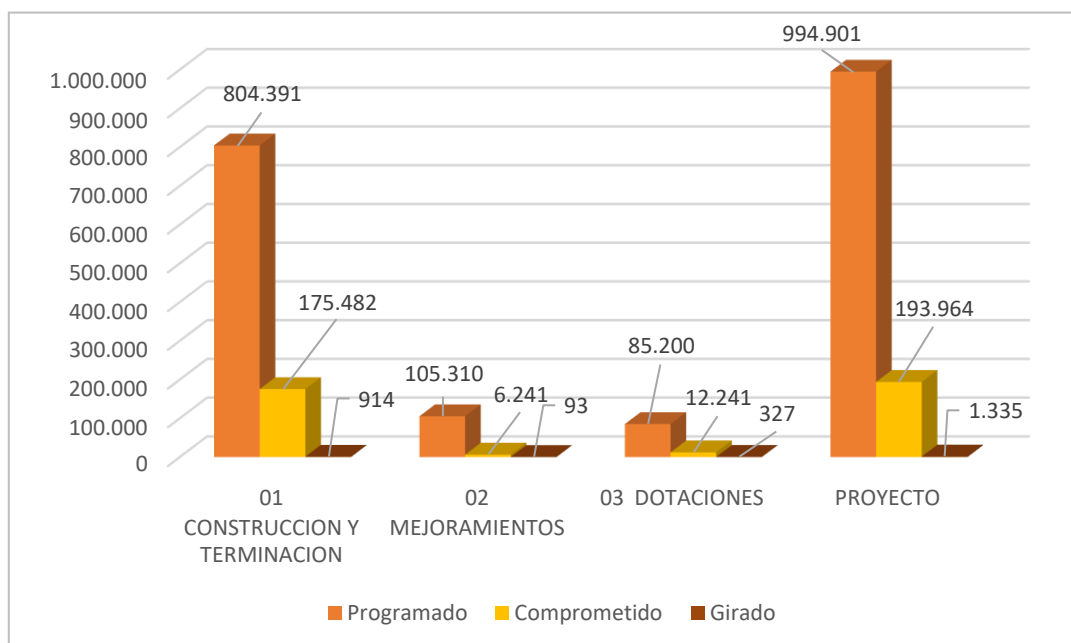

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por componente:

01 construcción y terminación: el componente de construcciones presenta compromisos por valor de \$ 175.481.789.236, correspondientes al 21,8 % de la asignación, direccionados a la ejecución de los proyectos Indusel, La Paz y Procables por valor de \$162.243.237.530, los cuales se comprometieron con recursos de vigencias futuras 2023 aprobados y contratados en la vigencia 2022. De otra parte, se comprometieron recursos para realizar la adición del contrato de suministros e instalación de avisos, para sedes educativas por \$1.000.000.000, adición del contrato de interventoría del proyecto San Francisco sede B por \$246.396.640. Así mismo, se comprometieron recursos para el pago de trámites ante Curadurías por valor de \$156.519.066 y contratación personal de apoyo a la gestión el valor de \$11.835.636.000.

02 mejoramientos: para este componente se comprometieron recursos por valor de \$6.241.304.204, correspondientes al 5.9 % de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra de mejoramientos e interventorías por valor de \$6.240.335.110 y al pago de fallos y sentencias de Secretaría de Salud por \$969.094.

03 Dotación: Es preciso indicar que la ejecución presupuestal a 31 de marzo alcanzó el 14.37 %, comprometiendo recursos por valor de \$12.241.032.508, entre prestación de servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión por \$ 3.257.640.000, procesos de adquisición de dotaciones de mobiliario, instrumentos musicales y balanzas por \$ 8.983.392.508, con el fin de cumplir lo

programado en el Plan Anual de Adquisiciones, a fin de dar respuesta oportuna a lo plasmado en el proyecto de inversión.

5.3. Ejecución Reservas Presupuestales

El proyecto constituyó reservas para la vigencia 2023 por valor de \$370.420.748.020, de las cuales al finalizar el primer trimestre del año se gestionó el 13.6 % de la reserva constituida, incluidos los saldos liberados, como se muestra a continuación:

Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales

Componente	Reservas Constituidas a 01/01/2023	Giros	Anulación Definitiva (Saldos Liberados)	% Reservas Gestionadas	Saldo por Gestionar 31/03/2023
01 CONSTRUCCION Y TERMINACION	\$ 127.070.030.469,00	\$ 11.248.832.548,00	\$ -	8,85%	\$ 115.821.197.921,00
02 MEJORAMIENTOS	\$ 169.571.426.200,00	\$ 16.514.526.014,00	\$ -	9,74%	\$ 153.056.900.186,00
03 DOTACIONES	\$ 73.779.291.351,00	\$ 22.559.149.127,00	\$ -	30,58%	\$ 51.220.142.224,00
TOTAL	\$ 370.420.748.020,00	\$ 50.322.507.689,00	\$ -	13,59%	\$ 320.098.240.331,00

6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

6.1. Objetivo Específico 1.

Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.

6.1.1. Producto 1

Infraestructura educativa construida: Para la vigencia 2023, se programó la construcción de seis (6) instituciones educativas. Estos colegios se encuentran ubicados en las localidades Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa y Fontibón.

Tabla 4. Producto Objetivo 1

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa construida	6	1	A 31 de marzo, se ha logrado la terminación de 1 sede de primera infancia, se avanza con la ejecución 18 colegios y 1 más próximos a iniciar obra colegios. Es así como en el marco de la ejecución de la meta PDD, Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, se ha avanzado con la terminación de veintitrés (23)

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
			colegios. A la fecha el porcentaje acumulado de ejecución de la meta es del 65,71%.

6.1.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.1.2.1. *Meta 1:* Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, en lotes nuevos, intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

La Administración Distrital estableció una meta de entrega de 35 colegios nuevos y restituidos como parte del Plan Distrital de Desarrollo, sin embargo, y atendiendo las necesidades de la ciudad en cuanto a infraestructura educativa y sus apuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial, el avance logrado en gestión predial y contratación y elaboración de diseños, y en consonancia con lo aprobado por el Concejo Distrital, por medio del nuevo cupo de endeudamiento y demás recursos, la Secretaría de Educación Distrital contempla dejar adicionalmente al cumplimiento de la meta, en etapa de diseños con licencia de construcción, contratados o en ejecución de obra, por lo menos otras 35 sedes educativas en las diferentes localidades de la ciudad.

Los colegios que se reportan como terminados, en ejecución o próximos a iniciar corresponden a los proyectos con mayor avance en la planeación y ejecución de obra. En ese sentido, el cumplimiento de la meta de los 35, corresponderá a las 35 sedes educativas que presenten mayor avance al finalizar la respectiva administración y el actual Plan de Desarrollo.

En torno a lo anterior a corte de 31 de marzo, la entidad ha terminado o entregado 23 colegios, con un porcentaje acumulado de ejecución de la meta PDD es del 65,71 %.

Es así como la Secretaría viene ejecutando 15 proyectos que se encontraban contratados desde la administración anterior, de los cuales a corte de 31 de marzo se han terminado 14 colegios y 1 está en ejecución la fase de terminación; dichos colegios se relacionan a continuación y corresponden a intervenciones en modalidad de obra nueva, restitución y/o ampliación:

Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	Estado de Avance % Marzo 2023	Estado de la Obra	Fecha estimada de entrega de la obra
1	Kennedy	Carlos Arango Vélez	Restitución	89,00%	100%	Entregada	sep-20
2	Bosa	Colegio de la Bici	Colegio Nuevo	61,00%	100%	Entregada	oct-20
3	Engativá	Tabora	Restitución	84,00%	100%	Entregada	oct-20
4	La Candelaria	La Candelaria (sede La Concordia)	Terminación	40,00%	100%	Entregada	dic-20
5	Bosa	Campo Verde I – Laurel de Cera	Colegio Nuevo	60,00%	100%	Entregada	ene-21
6	Bosa	Campo Verde II – Parques de Bogotá	Colegio Nuevo	61,00%	100%	Entregada	ene-21
7	Ciudad Bolívar	Sierra Morena – Parque	Colegio Nuevo	63,66%	100%	Entregada	abr-21
8	Kennedy	Ciudad de Techo I	Colegio Nuevo	29,00%	100%	Entregada	may-21
9	Fontibón	Integrado de Fontibón (Sede Emma Villegas de Gaitán)	Ampliación	0,60%	100%	Entregada	dic-21
10	Tunjuelito	Rafael Uribe Uribe	Restitución	25,00%	100%	Entregada	dic-21
11	San Cristóbal	República Del Ecuador	Restitución	28,00%	100%	Entregada	dic-21
12	Engativá	Laureano Gómez	Restitución	48,00%	100%	Entregada	dic-21
13	Ciudad Bolívar	Sierra Morena - La Curva	Colegio Nuevo	15,50%	100%	Entregada	jun-22
14	Antonio Nariño	Guillermo León Valencia	Ampliación	63,00%	100%	Entregada	oct-22
15	Usme	Ciudad *Chengdú – predio Bolonia	Colegio Nuevo	75%	81.60%	En ejecución	Mayo 2021 - Fase I

*En proceso sancionatorio

Así mismo, la entidad adelanta la terminación de cinco (5) sedes de primera infancia, de estas (3) han sido entregadas, (1) está terminada y la 5ªta se encuentran en ejecución así:

Tabla 6 Proyectos de primera infancia

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Estado de Avance % Marzo 2023	Estado de la Obra	Fecha estimada de entrega de la obra
1 (16)	Bosa	Villas del Progreso Porvenir VII	Colegio Nuevo	100 %	Entregada	Junio 2020
2 (17)	Kennedy	Gabriel Betancourt Mejía	Colegio Nuevo	100 %	Entregada	Enero 2022
3 (18)	Bosa	Bosa Brasilia Porvenir IV	Colegio Nuevo	97%*	Entregada	Febrero 2021
4 (19)	Suba	Toscana Lisboa - Sabana de Tibabuyes Fase II	Colegio Nuevo	100%**	Terminada	Mayo 2023
5 (20)	Suba	Juan Lozano y Lozano – Fontana grande Fase II	Colegio Nuevo	97,9 %	En ejecución	Mayo 2023

*Se adelanta proceso administrativo por presunto incumplimiento, sin embargo, la sede educativa se encuentra en funcionamiento

** En legalización de servicios públicos

En la vigencia de 2020, se logró la terminación de la construcción de cuatro (4) proyectos: 1. "La Bici" ubicado en la localidad de Bosa, 2. "Carlos Arango Vélez", ubicado en la localidad de Kennedy, 3. Tabora ubicado en la localidad de Engativá y 4. el Colegio denominado La Candelaria ubicado en la localidad Candelaria. Los proyectos se encuentran en trámite de conexiones definitivas de servicios públicos, una vez se culmine esta actividad será suscrita el Acta de entrega a cada rector.

Durante la vigencia 2021, la Dirección de construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, terminó la construcción de siete (7) proyectos denominados: 1. "Parques de Bogotá – Campo Verde II" y 2. "Laurel de Cera – Campo Verde I" ubicados en la localidad de Bosa, 3. "Laureano Gómez", ubicado en la localidad de Engativá, el 4. Colegio denominado "El Nogal – Predio Sierra Morena Parque" ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, 5. el colegio "Ciudad de Techo I" ubicado en la localidad de Kennedy, 6. Integrado de Fontibón - Emma Villegas De Gaitán ubicado en la localidad de Fontibón, 7. Rafael Uribe Uribe en la localidad de Tunjuelito; no obstante, algunos de estos proyectos se encuentran en trámite de conexiones definitivas de servicios públicos y con terminación de obras complementarias como se muestra a continuación:

Para la vigencia 2022, a corte de 31 de diciembre han sido terminados (8) colegios y (3) sedes de primera infancia: 1. Esmeralda Arboleda Cadavid - La Palestina, 2. Laura Herrera de Varela - Encenillos Niños Jesús, 3. Ciudadela El Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo - Plaza Logística de la localidad de Bosa, 4. Abel Rodríguez Céspedes - Los Cerezos de la Localidad de Engativá con capacidad para 8300 estudiantes, 5, Guillermo León Valencia Localidad Antonio Nariño, con capacidad 720 estudiantes, 6. Angela Restrepo Moreno- Sierra Morena Curva, en la localidad de Ciudad Bolívar que atenderá 1040 estudiantes y 7. Gloria Valencia de Cataño - Santa Teresita con una capacidad de 1.040 cupos en la localidad de San Cristóbal, 8. Villas del Progreso Porvenir VII y 9. Bosa Brasilia Porvenir IV - de la localidad de Bosa, 10. Gabriel Betancourt Mejía – de la localidad de Kennedy, y 11. República del Ecuador – Localidad de San Cristóbal. Es de precisar que los colegios se encuentran en legalización de servicios públicos.

Durante la vigencia 2023, se reportó la entrega de la sede de primera infancia María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiara a 180 niños de la localidad de suba.

De otra parte, la administración avanza con el desarrollo de (23) colegios, de los cuales (14) están siendo ejecutados directamente por la SED, (5) mediante convenio interadministrativo SED-MEN y (4) más se desarrollan a través de contratos interadministrativos con la ERU y ENTERRITORIOS. Los proyectos citados se relacionan a continuación:

Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	Estado de Avance % Marzo 2023	Estado de la Obra	Fecha estimada de entrega de la obra
(21) 1	Bosa	Laura Herrera de Varela Encenillos (Predio Niño Jesús)	Colegio Nuevo	0,00%	100%	Entregada	Oct-22
(22) 2	Bosa	Esmeralda Arboleda Cadavid - La Palestina	Colegio Nuevo	0,00%	100%	Entregada	Nov-22
(23) 3	San Cristóbal	Gloria Valencia de Cataño- Santa Teresita	Colegio Nuevo	0,00%	100%	Entregada	Oct-22
(24) 4	Fontibón	Villemar El Carmen Sede C*	Restitución	0,00%	93,39%	En ejecución	Jul-23
N/A 5	Usme	Ciudad Chengdu (Predio Bolonia) Fase II	Colegio Nuevo	N/A	81,60%	En ejecución	Jul-23
(25) 6	Ciudad Bolívar	Arborizadora Alta	Restitución	0,00%	63,54%	En ejecución	Dic-23
(26) 7	Ciudad Bolívar	San Francisco Sede B	Restitución	N/A	40,53%	En ejecución	Ago-23
(27) 8	Kennedy	Fátima - Hipotecho	Colegio Nuevo	N/A	48,33%	En ejecución	Feb-24
(28) 9	Fontibón	Procables	Colegio Nuevo	N/A	8,37%	En ejecución	May-24
(29) 10	Suba	Jaime Niño 10- Lombardía Fase II	Colegio Nuevo	N/A	1,13%	En ejecución	Sep-23
(30) 11	Bosa	Indusel	Colegio Nuevo	N/A	3,76%	En ejecución	Ago-24
(31) 12	Kennedy	El Ferrol - La Paz	Colegio Nuevo	N/A	4,75%	En ejecución	Ago-24
(32) 13	Santafé	Los Pinos	restitución	N/A	16,33%	En ejecución	Sep-23
(33) 14	Puente Aranda	La Merced	Restitución	N/A	3,40%	En ejecución	Ago-23

* El contrato se encuentra suspendido

Las fechas estimadas de entrega de los proyectos que se encuentran en etapa de obra han tenido variaciones, producto de imprevistos técnicos y oportuno acceso a materiales, lo cual ha obligado a modificar el cronograma de ejecución de algunos proyectos de obra.

Adicionalmente, a través del convenio interadministrativo con el FFIE se han venido desarrollando cinco (5) nuevos colegios con cofinanciación de la nación por la suma de \$53.912.000.000, para los

cuales la SED apropió recursos por valor de \$72.863.405.263,18, para un valor total ejecutado mediante dicho convenio de \$ 126.775.405.264. Ahora bien, de los proyectos enmarcados en este convenio, dos (2) colegios se encuentran terminados en legalización de servicios públicos, dos (2) se encuentran en ejecución y uno (1) está próximo a iniciar obra. Como se muestra a: continuación:

Tabla 8. Proyectos cofinanciados

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	Estado Avance %	Estado de la	Fecha estimada de entrega de la obra
					Marzo/2023	Obra	
(34) 1	Bosa	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint Malo - Plaza Logística	Colegio Nuevo	0,00%	100 %	Entregada	Nov 2022
(35) 2	Engativá	Abel Rodríguez Céspedes - Los Cerezos	Colegio Nuevo	0,00%	100 %	Entregada	Nov 2022
(36) 3	Engativá	Lucila Rubio de Laverde – Porvenir	Colegio Nuevo	0,00%	98.13 %	En ejecución	mar-23
(37) 4	Ciudad Bolívar	Bonavista	Colegio Nuevo	0,00%	26.95 %	En ejecución	ene-24
(38) 5	Santafé	Policarpa Salavarrieta	Restitución	Próximo a iniciar			

De otra parte, en la vigencia 2021, se suscribieron dos (2) contratos interadministrativos con la ERU y ENTERRITORIO los cuales tienen por objeto “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para la ejecución de los proyectos Hacienda Casablanca y Boíta por parte de EN Territorio y San Francisco de Asís y La Magdalena, que serán desarrollados por la ERU.

Los proyectos que gerencia la entidad EN Territorio iniciaron su ejecución en el mes de marzo así: Hacienda Casablanca - 17 de marzo de 2022 y Boíta - 25 de marzo de 2022. En cuanto a los proyectos gerenciados por la ERU, el proyecto La Magdalena inició su ejecución el 23 de mayo de 2022, y frente al proyecto San Francisco de Asís, inició el 8 de junio de 2022.

Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Gerencia	% Avance Marzo/ 2023	Estado de la Obra	Fecha estimada de entrega de la obra
(39) 1	Ciudad Bolívar	María Currea Manrique -Hacienda Casablanca	Colegio Nuevo	EN Territorio	44.77%	En ejecución	May-2024
(40) 2	Kennedy	María Betsabé Espinal – Boíta	Colegio Nuevo	EN Territorio	19.51%	En ejecución	Jun-2024
(41) 3	Mártires	San Francisco de Asís	Colegio Nuevo	ERU	49.03%	En ejecución	Dic-2023
(42) 4	Kennedy	Teresa La Magdalena	Colegio Nuevo	ERU	33.96%	En ejecución	Abr-2024

Es así como, que la entidad ha terminado veintitrés (23) colegios y diez y ocho (18) proyectos se encuentran en ejecución, (1) próximo a iniciar.

Adicionalmente, mediante Acuerdo 840 de junio 13 de 2022, se aprobaron recursos de cupo de endeudamiento para la construcción de 26 nuevas obras adicionales para la ciudad con 19 colegios nuevos/restituidos, 6 colegios para la primera infancia y 1 centro pedagógico, las cuales se encuentran en proceso de estudios y diseños y obtención de licencias.

Así mismo, se adelanta la ejecución de 1 consultoría de estudios y diseños, que no hace parte de los 26 proyectos aprobados en el Acuerdo y 1 más se encuentra en proceso de estructuración de contratación. A continuación, se relacionan los 28 proyectos:

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Estado	% Avance Marzo 2023
(43) 1	Suba	Alfonso Jaramillo	Colegio Nuevo	En ejecución	63,00%
(44) 2	Engativá	Cardenal Luque	Restitución	En ejecución	81%
(45) 3	Rafael Uribe Uribe	Alexander Fleming	Restitución	En ejecución	90%
(46) 4	Engativá	La Palestina	Restitución	En ejecución	64%
(47) 5	Usaquén	General Santander	Restitución	En ejecución	96%
(48) 6	Santafé	Altos de Egipto	Colegio Nuevo	En ejecución	67%
(49) 7	La Candelaria	Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez	Restitución	En ejecución	64%
(50) 8	San Cristóbal	Las Brisas	Nuevo - PI	En ejecución	21%
(51) 9	Usme	La Parroquia	Restitución - PI	En ejecución	10%

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Estado	% Avance Marzo 2023
(52) 10	Ciudad Bolívar	Madelena	Nuevo - PI	En ejecución	9,87%
(53) 11	Suba	Fontanar del Rio	Nuevo - PI	En ejecución	15%
(54) 12	San Cristóbal	Plazuela Álamos	Nuevo-PI	En ejecución	15%
(55) 13	Suba	Theilard de Chardan	Nuevo - PI	En ejecución	11%
(56) 14	Engativá	Antonio Villavicencio	Restitución	En ejecución	20%
(57) 15	Engativá	Antonio Villavicencio (Cesión)	Colegio Nuevo	En ejecución	20%
(58) 16	Bosa	Villas del Progreso (compra)	Colegio Nuevo	En ejecución	0.5%
(59) 17	Suba	Ciudadela Cafam II	Colegio Nuevo	En ejecución	0.5%
(60) 18	Bosa	Villas del Progreso (Cesión)	Colegio Nuevo	En ejecución	0.5%
(61) 19	Bosa	Porvenir II	Colegio Nuevo	En ejecución	0.5%
(62) 20	Engativá	Miguel Antonio Caro	Restitución	En ejecución	0.5%
(63) 21	Ciudad Bolívar	Villas del Diamante	Restitución	En ejecución	0.5%
(64) 22	Engativá	Ciudadela el Cortijo	Colegio Nuevo	En legalización acta de inicio	
(65) 23	Fontibón	Integrado de Fontibón	Restitución	En legalización acta de inicio	
(66) 24	Santafé	El Verjon	Restitución	En legalización acta de inicio	
(67) 25	Rafael Uribe Uribe	Liceo Femenino Mercedes Nariño (patrimonial)	Restitución	Contratado mediante contrato interadministrativo SED-ERU	
(68) 26	Bosa	Francisco de Paula Santander (patrimonial)	Restitución	Contratado mediante contrato interadministrativo SED-ERU	
(69) 27	Los Mártires	Agustín Nieto Caballero (patrimonial)	Restitución	Contratado mediante contrato interadministrativo SED-ERU	
(70) 28	Tunjuelito	San Benito Abad	Restitución	En estructuración de la contratación de la Consultoría - SED	

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

Para el caso del proyecto denominado La Paz, ubicado en la localidad de Kennedy, se presentaron problemas para el inicio de las actividades de la obra ya que la comunidad se opone a la construcción del colegio, sin embargo, como se ha informado anteriormente, el acta de inicio fue legalizada el 5 de diciembre de 2022, y a la fecha presenta un avance del 4,75%, se espera continuar con la ejecución normal del proyecto.


c. Registro Fotográfico

1. Colegio Abel Rodríguez Céspedes (Los Cerezos) – Engativá



- Estudiantes beneficiados: 1.040
- Área Construida: 9.013 M2

2. Colegio María Cristina Salazar - (Sabana Tibabuyes) - Suba

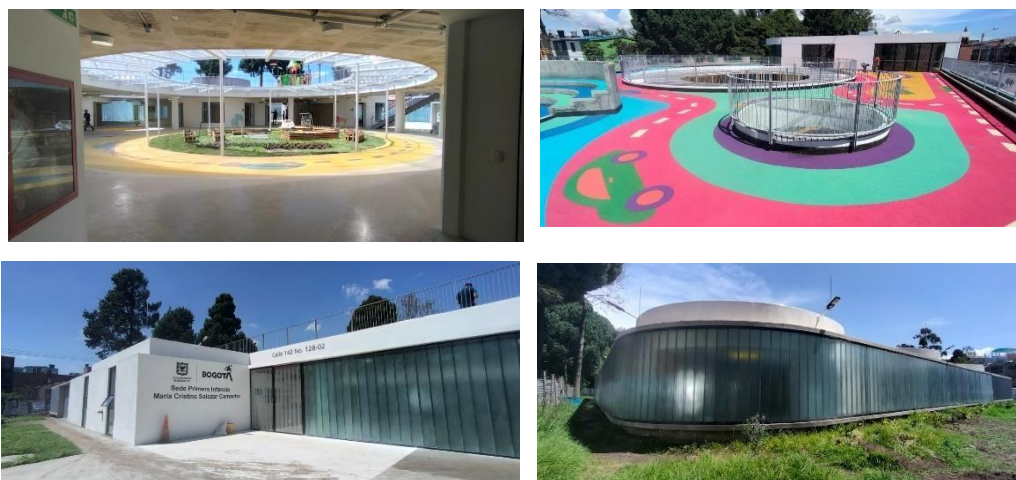

- Estudiantes beneficiados: 180
- Área Construida: 1.497 M2

6.2. Objetivo Específico 2.

Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.

6.2.1. Producto 2.

Para la vigencia 2023 se proyectó la intervención de 282 sedes educativas, de las cuales 173 corresponde a meta rezago de la vigencia 2022 y 109 a la meta establecida para la presente vigencia.

Tabla 10. Productos 2

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa mejorada	282	32	A 31 de marzo, se logró la intervención de 32 IED, equivalentes al 18,50 % de la meta rezago proyectada para la vigencia 2022. Estas intervenciones beneficiarán la comunidad educativa de las localidades de Suba, Engativá, Usme, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Los Mártires, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Puente Aranda y Fontibón Es de precisar que en este periodo el mes de marzo de 2023 se terminaron en total 23 intervenciones de mejoramiento; 2 en sedes administrativas y 21 en sedes educativas, de las cuales aportan a la meta 10 sedes intervenidas, de igual forma se continua con la ejecución de obras en 124 frentes de mejoramientos entre 2021 y 2022. A la fecha se terminó en 100% de los contratos del 2021 del grupo 3, 7 y 8 correspondiente a las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 8 grupos de mejoramiento 2021 del 93,53% y de mejoramientos 2022 del 7,56%, encontrándose en ejecución 11 contratos de obra (pendiente grupo 6 – Sumapaz) y 12 de interventoría. Se ha alcanzado una meta acumulada de 480 sedes educativas con 780 intervenciones desde la vigencia 2020 hasta el 31 de marzo de 2023.

6.2.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.2.2.1. *Meta 2:* Intervenir 730 sedes educativas existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con

análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

Desde la vigencia 2020 hasta el 31 de marzo de 2023, la entidad ha logrado intervenir 480 sedes educativas, en las cuales se ha ejecutado 780 intervenciones con mejoramientos, con el fin de robustecer las condiciones de las plantas físicas educativas, en cuanto a baterías sanitarias, cubiertas, áreas libres y recreativas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, cerramientos y mejoramiento de ventilación y carpintería metálica.

Ahora bien, en el periodo de enero a marzo de 2023, se ha adelantado la siguiente gestión:

En el mes de enero de 2023 se terminaron 10 intervenciones de mejoramiento en sedes educativas distribuidas en las localidades de Usaquén, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba, Santafé y Usme de las cuales aportan a la meta 5 intervenciones de mejoramiento, de igual forma se continua con la ejecución de obras en 82 frentes de mejoramientos 2021. A la fecha se terminó en 100% el contrato del grupo 3 correspondiente a las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 8 grupos del 86%.

En cuanto a los contratos de mejoramiento 2022, resultado de los procesos de licitación SED-LP-DCCEE-039-2022 (obra) y el SED-CM-A-DCCEE-050-2022 (Interventoría), se han iniciado 11 contratos de obra y 11 de interventoría, adelantando intervenciones en 50 frentes priorizados de los 223 previstos en los 12 grupos entre sedes educativas y administrativas, con un plazo máximo de 12 meses.

Para el mes de febrero de 2023 se terminaron en total 36 intervenciones de mejoramiento; 3 en sedes administrativas y 33 en sedes educativas distribuidas en las localidades de Engativá, Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Los Mártires, Kennedy, Bosa y Fontibón, de las cuales aportan a la meta 17 intervenciones de mejoramiento, de igual forma se continua con la ejecución de obras en 131 frentes de mejoramientos entre 2021 y 2022. A la fecha se terminó en 100% el contrato del grupo 3 correspondiente a las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 8 grupos de mejoramiento 2021 del 90,6% y de mejoramientos 2022 del 3.7%, encontrándose en ejecución 11 contratos de obra y 12 de interventoría.

Adicionalmente, se suscribieron las modificaciones de los siguientes contratos de obra:

- * Contrato No. 2645864 de 2021, el cual se prorrogó hasta el 18 de junio de 2023 y se adicionaron recursos por valor de \$ 2.845.385. 735.00
- * Contrato No. 2646231 del 2021, se prorrogó hasta el 18 de junio de 2023 y se adicionaron recursos por valor de \$ 2.592.328. 419.00
- * Contrato No. 2646248 del 2021, se prorrogó hasta el 24 de mayo de 2023.

Se avanza con las modificaciones de las Interventorías de los contratos de obras anteriormente mencionados.

Para el mes de marzo de 2023, se terminaron en total 23 intervenciones de mejoramiento; 2 en sedes administrativas y 21 en sedes educativas distribuidas en las localidades de Suba, Engativá, Usme, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Los Mártires, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Puente Aranda y Fontibón, de las cuales aportan a la meta 10 intervenciones de mejoramiento, de igual forma se continua con la ejecución de obras en 124 frentes de mejoramientos entre 2021 (43 frentes) y 2022 (81 frentes). A la fecha se terminó en 100% los contratos del 2021 del grupo 3, 7 y 8 correspondiente a las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 8 grupos de mejoramiento 2021 del 93,53% y de mejoramientos 2022 del 7,56%, encontrándose en ejecución 11 contratos de obra (pendiente grupo 6 – Sumapaz) y 12 de interventoría.

Adicionalmente, se adelanta el trámite las modificaciones de los contratos de obra e interventoría de los mejoramientos suscritos en el año 2022.

Tabla 11. Intervenciones Consolidadas 2023

COMPONENTES	MEJORAMIENTOS	EMERGENCIAS	TOTAL
ENERO	5	0	5
FEBRERO	17	0	17
MARZO	10	0	10
INTERVENCIONES			32

A continuación, se relacionan las sedes educativas que han sido intervenidas en el primer trimestre el 2023:

Tabla 12. Discriminación de mejoramientos y emergencias recibidos 2023

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE
TERMINADOS EN ENERO 2023			
1	SAN CRISTOBAL	Colegio técnico Tomas Rueda Vargas	Republica Del Canadá I
2	USAQUEN	Colegio Toberín	Toberín
3	SUBA	Colegio Tibabuyes Universal	Sede B
4	SUBA	Colegio El Salitre - Suba	El Salitre
5	USME	Colegio Rural Olarte	Olarte
TERMINADOS EN FEBRERO 2023			

INFORME DE GESTIÓN ENERO - MARZO 2023

Proyecto 7638

6	ENGATIVA	Colegio Torquigua	Torquigua
7	ENGATIVA	Colegio Jorge Gaitán Cortes	Andalucía
8	SUMAPAZ	Colegio Campestre Jaime Garzón	Adelina Gutiérrez Palacios
9	SUMAPAZ	Colegio Campestre Jaime Garzón	Los Ríos
10	USME	Colegio Fabio Lozano Simonelli	Danubio Azul
11	SUMAPAZ	Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela	Tunal Bajo
12	SUMAPAZ	Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela	Santo Domingo
13	SANTAFE	Colegio Los Pinos	El Parejo
14	SAN CRISTOBAL	Colegio Aguas Claras	Aguas Claras
15	ANTONIO NARIÑO	Colegio Atanasio Girardot	República Oriental Del Uruguay
16	RAFAEL URIBE URIBE	Colegio José Martí	La Resurrección
17	KENNEDY	Colegio Isabel II	Pio XII
18	KENNEDY	Colegio Jaime Hernando Garzón Forero	Jaime Hernando Garzón Forero
19	BOSA	Colegio Argelia	Argelia
20	ANTONIO NARIÑO	Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori	Anexa A La Normal Superior Distrital María Montessori
21	KENNEDY	Colegio Jairo Aníbal Niño	Jairo Aníbal Niño
22	ENGATIVA	Colegio Garces Navas	Garces Navas III
TERMINADOS EN MARZO 2023			
23	SUBA	Colegio José María Velaz	Colegio José María Velaz
24	ANTONIO NARIÑO	Colegio Francisco De Paula Santander	Republica De México
25	RAFAEL URIBE URIBE	Colegio Palermo Sur	Palermo Sur
26	BOSA	Colegio San Ignacio	Colegio San Ignacio
27	BOSA	Colegio Santiago De Las Atalayas	Colegio Santiago De Las Atalayas
28	RAFAEL URIBE URIBE	Colegio Colombia Viva	Néstor Forero Alcalá
29	PUENTE ARANDA	Colegio Andrés Bello	José Joaquín Castro Martínez

30	BOSA	Colegio Kimi Pernía Domico	Kimi Pernía Domico
31	BOSA	Colegio Grancolombiano	Los Naranjos
32	SAN CRISTOBAL	Colegio San Cristóbal Sur	Jardín Infantil Nacional Popular No. 2

Fuente: Reporte seguimiento equipo de mejoramientos

Los mejoramientos relacionados integran actividades propias de reparaciones locativas dentro de las instituciones educativas, intervenciones en los colegios en atención a requerimientos de servicios públicos y atención de emergencias.



b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

Frente al predio Fe y Alegría Vitelma, entregado por la Empresa de Acueducto de Bogotá, se han presentado situaciones externas que han generado interrupción de las obras complementarias que se adelantan, sin embargo, la entidad ha tomado medidas con el fin de minimizar el riesgo de retrasos en el cronograma de ejecución de la intervención.

Se acordó en conjunto con los directivos de las instituciones educativas los planes de contingencia de los frentes de obra que se encuentran en ejecución con el fin de no afectar la operación en los colegios. No obstante, en aquellos planes de contingencia donde se realizan paralelamente actividades de obra y actividades propias de los establecimientos educativos se ha tenido que coordinar horarios de trabajo e ingreso y salida de materiales con el fin de no afectar la presencialidad, lo que ha ocasionado que las actividades demoren más de lo previsto, adicionalmente, se espera adelantar los trámites correspondientes de los arrendamientos que se requieren para algunas sedes que se van a intervenir integralmente.

Respecto al contrato de obra del grupo 6, destinado a la localidad de Sumapaz, se han presentado dificultades con el contratista respecto a la legalización de este, concretamente en la etapa de la expedición de las pólizas respectivas, lo cual generó la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2023.

c. Registro Fotográfico

1. Colegio Manuel Elkin Patarroyo Sede A	
Antes	Después
	
	
2. Colegio Restrepo Millán Sede A	
Antes	Después
	   

3. Colegio Isabel II Sede B	
Antes	Después
	

6.3. Objetivo Específico 3

Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

6.3.1 Producto 3. Infraestructura educativa dotada

Tabla 13. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa dotada	107	8	Para la vigencia 2023 se programaron (99) sedes educativas, más (8) que corresponden a la reserva presupuestal 2022. Los tres compromisos suscritos durante el primer trimestre por valor de \$8.983 millones, corresponden a la adquisición de mobiliario escolar y administrativo, instrumentos y accesorios musicales y a la compra de balanzas para el pesaje de los residuos generados en las sedes principales de las instituciones educativas distritales. La ejecución de los recursos restantes de la Vigencia 2023, actualmente se encuentra en proceso precontractual, de acuerdo con lo planeado en el PAA en respuesta al proyecto de inversión. Las (8) sedes educativas reportadas como avance de la meta, corresponde a las entregas de dotaciones acumuladas de varios contratos; en ejecución de los recursos de las reservas presupuestales; que corresponde al 74.7% de la meta programada

Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.3.2.1 Meta 3: Dotar las 770 sedes educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial

a. Avances y/o Logros:

En el cuatrienio, de las 770 sedes programadas, al finalizar el 2020 se obtuvo un logro de 57 sedes, al finalizar el 2021 se obtuvo un logro 237 sedes dotadas; al cierre de la vigencia 2022, el logro obtenido fue de 295 sedes dotadas; así mismo, durante el primer trimestre de 2023 se reportan 8 sedes, que corresponden a las programadas para el 2023 en ejecución de los recursos de las reserva presupuestal 2022, logrando así la dotación acumulada de 597 sedes, durante las tres vigencias anteriores y lo corrido de la vigencia 2023, lo cual representa un avance acumulado del 77.53% del total programado para el cuatrienio.

Es preciso indicar, que las sedes reportadas durante el primer trimestre 2023 son aquellas que recibieron dotaciones en lo relacionado con mobiliario escolar y administrativo, instrumentos musicales, material bibliográfico para las bibliotecas escolares, paquetes con útiles escolares, materiales e implementos deportivos, equipos e instrumentos necesarios para los laboratorios de física, química, ciencias naturales y ambientes de formación; al igual que maquinaria y equipos especializados necesarios para el fortalecimiento de los ambientes de formación en las instituciones educativas.

Para la adquisición de dotaciones de la vigencia 2023, en marzo se culminó la contratación del grupo de profesionales y técnicos de apoyo que se requieren para asistir las diferentes labores que implican la ejecución de los recursos asignados al proyecto, para lo cual a la fecha se comprometieron recursos por valor de \$3.257.640.000 que corresponden a 29 contratos de prestación de servicios profesionales y 24 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, sobre los cuales se registran giros acumulados por valor de \$327.263.774 al finalizar marzo.

A 31 de marzo de 2023, se realizaron entregas de dotaciones contratadas en la vigencia 2022, justificadas en la reserva presupuestal, alcanzando una ejecución de \$22.559.149.127 equivalente al 30.6% de la reserva constituida. Paralelamente, luego de haberse contratado los servicios profesionales y de apoyo a la gestión entre enero y marzo; se avanzó en las actividades precontractuales para la ejecución de los recursos asignados.

Al finalizar febrero se realizó la adición al CONTRATO DE COMPRAVENTA 101092 DE 2022 suscrito con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS mediante el acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP-2019, para la adquisición de mobiliario escolar y administrativo para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local por valor de \$7.717.504.704; igualmente se adquirieron instrumentos y accesorios musicales para las instituciones educativas distritales, de acuerdo con las necesidades identificadas por valor de \$1.149.705.234 mediante la adición al contrato DE COMPRAVENTA No. 3798306 de 2022 suscrito con CENTRO MUSICAL SAS.

Adicionalmente en marzo, mediante contrato No. 105959 suscrito con la COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, se adquirieron balanzas para el pesaje de los residuos generados en las sedes principales de las instituciones educativas distritales, por valor de \$116.182.570, como parte de la gestión y manejo integral de los desechos peligrosos a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito y se avanzó con las actividades precontractuales de otros 8 procesos por valor de \$58,504 millones, para la adquisición de las dotaciones prioritarias de implementos deportivos, material bibliográfico, equipos e instrumentos para laboratorios de física, química, ciencias naturales, equipos audiovisuales y de tecnología, equipos de cómputo, maquinaria y equipos especializados para el fortalecimiento de los ambientes de formación, contenedores para puntos ecológicos y canecas de vaivén, entre otros, con el fin de cumplir lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones, a fin de dar respuesta oportuna a lo plasmado en el proyecto de inversión.

Frente a la meta de *“Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”*, a 31 de diciembre de la vigencia 2021 se realizó la entrega de 101.749 dispositivos tecnológicos equivalente a una ejecución de la meta del 101.75%. Para la vigencia 2022 se programó la entrega de 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, para cumplir con la nueva meta del cuatrienio de 124.574 dispositivos tecnológicos, de conformidad con el incremento de meta aprobado por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018

Los avances y logros en referencia a esta meta corresponden a los siguientes antecedentes:

En el 2022, una vez perfeccionado el acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de la tienda virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente, se logró culminar el proceso de adquisición de los 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, mediante la adjudicación de los contratos No. 92352 por valor de \$10.847.269.834,00 con NUEVA ERA SOLUCIONES SAS para la compra de 21.738 tabletas digitales y contrato No. 92353 por valor de \$ 979.930.500,00 con SISTETRONICS SAS, para la compra de 1.087 computadores portátiles, los cuales fueron entregados a 31 de diciembre en la SED; el proveedor, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS argumentó retrasos en los procesos de importación de los otros 21.738 dispositivos derivado de factores de la logística global en puertos, por lo que fue necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023, y modificar el cronograma de entrega de los equipos a partir de febrero de 2023. Paralelamente en diciembre de 2022 se suscribió el CONVENIO DE ASOCIACION No. 4300430 con la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA, quien previo inicio de las actividades académicas 2023, realiza el apoyo profesional y técnico en el proceso de coordinación logística para las entregas a los estudiantes beneficiados.

En febrero de 2023, se reinició el contrato No. 92352 con NUEVA ERA SOLUCIONES, y se entregaron todas las 21.738 tabletas digitales en los sitios previamente acordados. En el mes de marzo luego del proceso de prelistamiento, bajo la coordinación y asesoría técnica y operativa de la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA, se inició la entrega de los dispositivos digitales a los estudiantes beneficiado, según cronograma aprobado, logrando la entrega de 5087 dispositivos al finalizar el mes de marzo.

Con estas acciones, se evidencia el cumplimiento anticipado de la meta del cuatrienio y se enfatiza en las gestiones realizadas para el incremento de esta meta con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018, lo que se constituye en un hito en la ciudad y en el país, puesto que en los últimos 30 años la Secretaría de Educación había entregado sólo 89 mil dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales.


b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

En el primer trimestre de 2023, no se presentaron retrasos considerables, solo los imprevistos propios que surgen en la estructuración de este tipo de contratos que se solucionan con oportunas gestiones administrativas por parte de las diferentes áreas responsables en la SED.

Es pertinente mencionar que la planificación y entrega de dotaciones a las instituciones educativas están supeditadas, en parte, a los avances e imprevistos propios de las obras de infraestructura, por lo cual se modifican los cronogramas de entregas en caso de que se requiera o se reciben las dotaciones en el término de ejecución de los contratos y se almacenan los bienes dotacionales. Así mismo, una sede educativa se va dotando en el transcurso de cada vigencia a través de diferentes contratos, estos aspectos inciden en la oportunidad del reporte de avance de la meta anual, el cual se realiza cuando las entregas de dotaciones concertadas se encuentren en un estado avanzado y se han dotado con más de una familia de elementos.

c. Registro Fotográfico



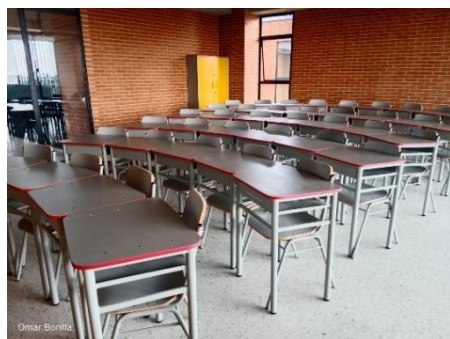

6.4. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto

El plan de adquisiciones del proyecto 7638 programó 223 ítems para el primer trimestre de la vigencia, y se ejecutaron 204 ítems. La ejecución del PAA por componente se dio de la siguiente manera:

01 Construcción: en el PAA se habían programado 141 ítems que corresponden a procesos de obra e interventorías, modificaciones contractuales y contratos de apoyo a la gestión, de los cuales fueron ejecutados 138.

02 Mejoramientos: Para el componente de mejoramientos en el primer trimestre del 2023 se programaron 23 ítems en el PAA, de los cuales se comprometieron 7 ítems. Los ítems pendientes por comprometer están asociados a la adición de contratos de obra e interventoría, los cuales se estima sean legalizados en el mes de abril de 2023

03 Dotaciones: En el primer trimestre de la vigencia 2023 fueron programados 59 ítems y en el PAA, los cuales fueron ejecutados. De los ítems ejecutados 3 corresponden a prórrogas a contratos en ejecución para adquisición de dotaciones, otros 3 ítems se ejecutaron para la adquisición de nuevas dotaciones y los otros 53 ítems, corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales y de servicios de apoyo a la gestión.

El ultimo ítem corresponde a garantizar el equipo profesional, técnico y de apoyo, idóneo para realizar el acompañamiento a la supervisión, en la ejecución de los contratos de adquisición de los dispositivos de acceso para la conectividad de los estudiantes de los colegios del distrito, y así contribuir al cierre de brechas digitales.

Los ítems contratados por adquisiciones corresponden a de mobiliario escolar y administrativo, material pedagógico impreso de lectura y escritura, paquetes con útiles escolares, equipos de tecnología con destino a las instituciones educativas distritales, bicicletas para las instituciones educativas oficiales focalizadas, repuestos necesarios para el mantenimiento adecuado de las

bicicletas e implementos de protección y prevención vial para los estudiantes como apoyo a la implementación de las estrategias para la movilidad alternativa y sostenible

Tabla 14. Plan de Adquisiciones primer trimestre 2023

COMPONENTE	OBJETO DE GASTO	N.º DE CONTRATOS PROGRAMADOS	N.º DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO
01 CONSTRUCCION Y TERMINACION	Compra de lotes, diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa nuevas y existentes en modalidades de: colegio nuevo, restitución, terminación o ampliación y/o adicionales	7	6*	\$1.246.396.640
	Suministrar el personal de apoyo profesional y técnico para garantizar la adecuada ejecución del proyecto	134	132**	\$11.835.636.000
02 MEJORAMIENTOS	Adelantar diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento menor complementarias a la infraestructura de los colegios distritales y/o adicionales	23	7***	\$6.240.335.110
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar los inmuebles de propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito, bajo su responsabilidad, tenencia, control y/o custodia.	0	0	\$0
03 DOTACIONES	Dotar mobiliario, equipos, maquinaria, herramientas e implementos de cómputo, tecnología, comunicaciones, audiovisuales, laboratorio, taller, recreación, deporte, cocina y comedor, recursos bibliotecas, arte, cultura, instrumentos y su mantenimiento.	6****	6	\$8.983.392.508
	Garantizar el personal de apoyo profesional y técnico en la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; así como el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución del componente.	53	53	\$3.257.640.000
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar las dotaciones para atender la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación, y sus sedes administrativas.	0	0	\$0
	Pagar Pasivos exigibles	0	0	\$0
Total		223	204	\$ 31.563.400.258

*En este objeto de gasto quedo pendiente por comprometer un ítem asociado a la adición del proyecto Arborizadora Alta, la cual fue radicada a la Oficina de Contratos el día 03 de abril de 2023

** Se encuentran dos ítems por comprometer los cuales están en proceso de estructuración

*** Los ítems pendientes por comprometer están asociados a la adición de contratos de obra e interventoría, los cuales se estima sean legalizados en el mes de abril de 2023

****Se programaron 6 ítems de los cuales 3 corresponden a prórrogas a contratos de ejecución

7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

7.1. Meta Plan 91.

Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, En lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

7.1.1. Avances, logros y compromisos

En el marco de la ejecución de la meta (91) Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, a la fecha se han terminado 23 colegios, para una ejecución de meta acumulada del 65,71%.

Es así como, en la vigencia 2023 se proyectó como meta la terminación de 6 proyectos de obra, de las cuales, a corte de 31 de marzo de 2023, se ha terminado 1 sede para la atención de la primera infancia, María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiará a 180 niños de la localidad de suba.

7.1.2. Retrasos y soluciones

Para el caso del proyecto denominado La Paz, ubicado en la localidad de Kennedy, se presentaron problemas para el inicio de las actividades de la obra ya que la comunidad se opone a la construcción del colegio, sin embargo, como se ha informado anteriormente, el acta de inicio fue legalizada el 5 de diciembre de 2022, y a la fecha presenta un avance del 4,75%, se espera continuar con la ejecución normal del proyecto.

7.1.3. Beneficios

En el marco del cumplimiento de la meta plan de desarrollo, Con los colegios terminados y/o entregados a corte 31 de marzo 2023, se amplió la cobertura en 22.225 cupos nuevos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Fontibón, Tunjuelito, Antonio Nariño, San Cristóbal y Suba

Se proyecta que las obras que se encuentran en ejecución beneficiarán a más de 22.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Antonio Nariño, Fontibón, San Cristóbal, Tunjuelito, y Engativá, aportando de esta manera al cierre de brechas de acceso y permanencia en la educación con equidad e igualdad en la ciudad.

7.2 Meta Plan 90:

100.000 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso

Es necesario precisar, que la nueva meta para el cuatrienio quedó establecida en 124.574 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso, de conformidad con el incremento de 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, aprobado por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018, lo anterior teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2021 la meta 90 inicial, ya se encontraba cumplida al 101.75%.

7.2.1 Avances, logros y compromisos

A 31 de diciembre de 2021 la SED realizó la entrega de 101.749 (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) dispositivos tecnológicos, logrando una ejecución de la meta del 101,75%. Estos dispositivos fueron entregados a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes, a su vez, las entregan a estudiantes vulnerables beneficiados en la focalización de colegios oficiales del Distrito de grados 6º a 11º. Es preciso indicar que la SED adicional a lo anterior, realizó gestiones para recolectar el mayor número de dispositivos tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. A la fecha se ha realizado la recolección y entrega de 3.706 dispositivos adicionales (Donaton:1057 dispositivos, Grupo de Energía de Bogotá: 2.509 dispositivos y Organización Internacional para las Migraciones: 140 dispositivos) logrando así un total de 105.455 equipos entregados.

Conforme a lo previsto en la planeación del proceso, a 31 de diciembre de 2021 se culminó la respectiva distribución y entrega de los 101.749 dispositivos adquiridos, en instituciones educativas distritales de las localidades, para estudiantes vulnerables focalizados de los grados de sexto a undécimo. Lo anterior implicó realizar las respectivas pruebas técnicas y alistamiento de los mismos, en razón al proceso de fabricación, transporte y alistamiento de nuevos dispositivos. Estos dispositivos están particularmente orientados a estudiantes de educación secundaria y media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad (según el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT), quienes se priorizan a partir de los criterios de pobreza, ruralidad y pertenencia a poblaciones de especial protección constitucional (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, entre otros).

Es pertinente mencionar que el logro de la meta “100.000 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”, estaba previsto para ser alcanzado a lo largo del cuatrienio, conforme lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del SIGLO XXI”. Sin embargo, la SED adelantó todos los procesos jurídicos, administrativos y contractuales que permitieron cumplir anticipadamente la meta en el segundo semestre de 2021.

En la vigencia 2022, observando que al cierre de 2021 la meta ya se encontraba cumplida con la entrega de los 101.749 dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes a su vez los entregan a los estudiantes focalizados; y que para el 2022 se apropiaron recursos para este propósito; en el primer trimestre, se tramitó ante la Dirección de Planes de Desarrollo y

Fortalecimiento Local, un incremento de la magnitud del indicador de esta meta el cual fue aprobado, y que se fundamentó en la necesidad de igualar en la vigencia 2021 la meta programada, al logro obtenido de 101.749 , y para la vigencia 2022 incrementarla en 22.825 con el fin de cubrir el déficit de estudiantes de colegios públicos sin computador o tableta en sus hogares; conforme a los resultados de la encuesta de Calidad de vida DANE 2018, por lo que al cierre del trimestre la meta quedo reprogramada en “124.574 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”.

Luego de culminar el trámite administrativo y presupuestal interno, con la modificación de la ficha de formulación del proyecto de inversión 7638 Versión 30, que nos permite reportar el cumplimiento como logros de la meta 90 para la actual vigencia; al finalizar el mes de junio, los estudios previos para la adquisición de los dispositivos obtuvieron su aprobación y se radicó el proceso de adquisición de los 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, mediante adhesión al acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, logrando la adjudicación de dos (2) contratos mediante los cuales se adquirieron los 22.825 dispositivos de acceso para la conectividad programados para el 2022; a través de los contratos de compraventa No. 92352 por valor de \$10.847.269.834,00 con NUEVA ERA SOLUCIONES SAS para la compra de 21.738 tabletas digitales y contrato No. 92353 por valor de \$ 979.930.500,00 con SISTETRONICS SAS, para la compra de 1.087 computadores portátiles.

En los primeros días del mes de julio 2022, una vez superada la etapa de constitución y aprobación de garantías, se firmaron las actas de inicio de los contratos de compraventa; a 31 de diciembre, todos los equipos ya habían culminado su etapa de fabricación; el proveedor SISTETRONICS SAS realizó la entrega de 1.087 computadores portátiles a la SED; el otro proveedor, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS argumentó retrasos en los procesos de importación de los otros 21.738 dispositivos derivado de factores de la logística global en puertos de China a Colombia, por lo que fue necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023, y modificar el cronograma de entrega de los equipos, previo inicio de las actividades académicas.

En febrero de 2023, se reinició el contrato No. 92352 con NUEVA ERA SOLUCIONES, y se entregaron todas las 21.738 tabletas digitales en los sitios previamente acordados. En el mes de marzo luego del proceso de prelistamiento, bajo la coordinación y asesoría técnica y operativa de la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA en ejecución del contrato No. 4300430, se inició la entrega de los dispositivos digitales a los estudiantes beneficiado, según cronograma aprobado, logrando la entrega de 5087 dispositivos al finalizar el mes de marzo.

Por otra parte es importante resaltar las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvieron 1.057 provenientes de la Campaña #DonatónPorLosNiños, 2.509 del Grupo de Energía de Bogotá y 140 de la Organización Internacional para las Migraciones, 1.067 dispositivos del Fondo de Desarrollo Local de suba, 5.212 tabletas por parte de PROBOGOTA y 16 de United Way, para un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero, teniendo en cuenta que estos dispositivos no se habían reportado como logros de esta meta; y que sumados con los 5087 dispositivos que se entregaron al finalizar el mes de marzo, nos permite un logro de 15.088 dispositivos entregados, que corresponde

al 69.4% de la meta programada para la vigencia 2023. y un logro total acumulado de 117.924 dispositivos entregados a 31 de marzo 2023, equivalente al 94.7% sobre el total de 124.574 dispositivos total programado para esta meta durante el cuatrienio.

7.2.2 Retrasos y soluciones

En la vigencia 2021, Los dispositivos superaron su etapa de fabricación, con algunos retrasos generados por las dinámicas mundiales con relación a la pandemia del COVID 19, asociados al desabastecimiento de partes tecnológicas, sin embargo, ya superados estos imprevistos, y una vez nacionalizado el ultimo lote de dispositivos se dio celeridad al cumplimiento de la totalidad de las entregas, durante el segundo semestre de la vigencia.

Para la vigencia 2022 uno de los retrasos correspondió al perfeccionamiento del nuevo del acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y a las gestiones interinstitucionales para el incremento en la meta plan, para posteriormente reflejar los logros por esta meta sectorial.

Igualmente a 31 de diciembre de 2022, el contratista NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, quien ejecuta el contrato No. 92352 de 2022, argumentó retrasos en los procesos de importación y llegada de 21.738 dispositivos a Colombia, derivado de factores de logística global de mercado y embarque en puertos que les impidió cumplir con el cronograma de entrega de los equipos a la SED, siendo necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023, y modificar el cronograma de entrega de los equipos a partir de febrero de 2023. En febrero de 2023, se reinició el contrato y se entregó la totalidad de los dispositivos digitales en los sitios previamente acordados, los cuales están siendo entregados a los estudiantes beneficiados, según cronograma aprobado.

7.2.3 Beneficios

Las acciones que se han adelantado en el marco de la ejecución de los contratos para adquirir dispositivos de acceso y equipos portátiles, a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, permitirán avanzar de forma determinante en la contribución al cierre de brechas digitales en el Distrito Capital, aspecto asociado directamente a la meta del Plan de Desarrollo Distrital definida como “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables. Con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad para contribuir al cierre de brechas digitales”, con la entrega de los 101.749 dispositivos de acceso en la vigencia 2021, más los 22.825 dispositivos adquiridos en la vigencia 2022 que actualmente se están entregando, se benefician igual número de estudiantes vulnerables matriculados en los establecimientos educativos oficiales.

7. CONCLUSIONES

La presente administración distrital tiene especial preocupación por cerrar las brechas de acceso, permanencia y calidad que actualmente tiene la ciudad entre poblaciones y territorios, con énfasis especial en la zona rural. Así, uno de los programas planteados está orientado a lograr una “Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. En consonancia con lo anterior, el Acuerdo 761 de 2020 pone como proyecto estratégico la construcción y dotación de infraestructura educativa para el desarrollo de la jornada única, la primera infancia y educación inclusiva, con mejores ambientes de aprendizaje para la educación del siglo XXI, ampliación de la cobertura con énfasis en las localidades más deficitarias, disminución de brecha digital, actualización de la dotación escolar, entre otros.

Conforme con lo anterior en materia de infraestructura, la ciudad cuenta con 23 colegios terminados y/o entregados, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 15 Proyectos terminados y/o entregados Meta 91

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
1	Bosa	Colegio Nuevo	Colegio de la Bici	1.120
2	Kennedy	Restitución	Carlos Arango Vélez	986
3	La Candelaria	Restitución	La Candelaria	440
4	Engativá	Restitución	Tabora	1.545
5	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Sierra Morena - Parque (El Nogal)	1.120
6	Kennedy	Colegio Nuevo	Ciudad Techo I	550
7	Fontibón	Ampliación	Integrado de Fontibón – Sede B	620
8	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde I (Laurel de Cera)	1.040
9	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde II (Parques de Bogotá)	1.040
10	Engativá	Restitución	Laureano Gómez	1.545
11	Tunjuelito	Restitución	Rafael Uribe Uribe	1.480
12	Antonio Nariño	Restitución	Guillermo León Valencia	720
13	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Ángela Restrepo Moreno	1.040
14	San Cristóbal	Colegio Nuevo	Gloria Valencia de Castaño	1.040
15	Bosa	Colegio Nuevo	Esmeralda Arboleda Cadavid	1.560
16	Bosa	Colegio Nuevo	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio	1.040
17	Bosa	Colegio Nuevo	Laura Herrera de Varela	1.040
18	Engativá	Colegio Nuevo	Abel Rodríguez Céspedes	1.040
19	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Villas del Progreso - Porvenir VII	225
20	Kennedy	Colegio Nuevo – primera infancia	Gabriel Betancourt Mejía / Villa Mejía Tagaste	225
21	San Cristóbal	Restitución	República del Ecuador	1.105

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
22	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Bosa Brasilia / Porvenir IV	225
23	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes	180


Así mismo se han intervenido con mejoramientos y atención a emergencias la infraestructura de 480 sedes educativas con 780 intervenciones desde la vigencia 2020 a 2023, beneficiando a más de 230.000 estudiantes de las 20 localidades, garantizando así ambientes escolares en los que puedan desarrollar todo su potencial académico, deportivo, artístico y científico.

Adicionalmente en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se desarrollaron actividades de demarcación, dotación con elementos de bioseguridad, y mantenimiento de estos; con estas acciones se garantizaron ambientes de aprendizaje adecuados y que cumplieran con la normatividad para un retorno progresivo gradual y seguro en modalidad de alternancia de los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad educativa.

Es preciso aclarar que, la fluctuación de precios en insumos para las obras de construcción sigue generando afectación en los cronogramas de trabajo para la ejecución de las obras, sin embargo, la entidad ha adelantado las acciones técnicas y jurídicas necesarias, con el fin de minimizar el riesgo en el cumplimiento de las metas trazadas para la vigencia y la ejecución presupuestal.

En relación con los dispositivos tecnológicos, las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvo un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero, teniendo en cuenta que estos dispositivos no se habían reportado como logros de esta meta; y que sumados con los 5087 dispositivos que se entregaron al finalizar el mes de marzo de 2023, nos permite un logro de 15.088 dispositivos entregados, que corresponde al 69.4% de la meta programada para la vigencia 2023. y un logro total acumulado de 117.924 dispositivos entregados a 31 de marzo 2023, equivalente al 94.7% sobre el total de 124.574 dispositivos total programado para esta meta durante el cuatrienio.

Por otra parte, durante el primer trimestre 2023, se avanzó con la entrega de las dotaciones contratadas durante la vigencia 2022 registrando entregas por valor de \$22,559 millones, lo cual nos permite reportar las 8 sedes educativas programadas y justificadas en la reserva presupuestal. Paralelamente se realizó la contratación de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión necesarias para la ejecución de los recursos asignados al proyecto. Al finalizar marzo se suscribieron tres (3) compromisos por \$8,983 millones y se avanzó con las actividades precontractuales de otros 8 procesos por valor de \$58,504 millones, con el fin de cumplir lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones 2023 acorde con los objetivos del proyecto de inversión. Estas acciones permiten reportar un logro acumulado de 597 sedes, durante las tres vigencias anteriores y lo corrido de la vigencia 2023, lo cual representa un avance acumulado del 77.53% del total programado para el cuatrienio.



LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Gerente de Proyecto

Preparó: Luis Alberto Cantor Bello – Profesional DDE
Sandra Galeano - Profesional DCCEE
María Aydee Jiménez Porras – Profesional DCCEE

Revisó: Liliana Díaz Poveda - Directora de Dotaciones
Andrea Lorena Beracasa Villarraga – Asesora SAP
William Octavio Zapata Carreño – Asesor SAP

