

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 enero a 31 marzo de 2024

PROYECTO 7638 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES
DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Elaborado por:
LUIS ALBERTO CANTOR
MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS
SANDRA PATRICIA GALEANO MENDIVELO

Marzo 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.1. <i>Objetivo General</i>	4
1.2. <i>Objetivos Específicos</i>	4
2. ALCANCE DEL PROYECTO	4
3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	5
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)	5
5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5
5.1. <i>Ejecución Presupuestal Acumulada</i>	7
5.2. <i>Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto</i>	7
5.3. <i>Ejecución Reservas Presupuestales</i>	9
6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	9
6.1. <i>Objetivo Específico 1.</i>	9
6.1.1. <i>Producto 1</i>	9
6.1.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	10
6.2. <i>Objetivo Específico 2.</i>	19
6.2.1. <i>Producto 2.</i>	19
6.2.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	19
6.3. <i>Objetivo Específico 3.</i>	23
6.3.1 <i>Producto 3. Infraestructura educativa dotada</i>	24
6.4. <i>Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto</i>	27
7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	29
7.1. <i>Meta Plan 91</i>	29
7.2 <i>Meta Plan 90:</i>	30
7. CONCLUSIONES	33

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2024	5
Tabla 2. Modificaciones presupuestales primer trimestre	6
Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales	9
Tabla 4. Producto Objetivo 1	9
Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación	11
Tabla 6 Proyectos de primera infancia	12
Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED	13
Tabla 8. Proyectos cofinanciados.....	14
Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas	15
Tabla 10 Proyectos adicionales Acuerdo 840	16
Tabla 11. Productos Objetivo 2.....	19
Tabla 12 Discriminación de mejoramientos recibidos 2024	20
Tabla 13. Productos Objetivo 3.....	24
Tabla 14. Plan de Adquisiciones primer trimestre 2024	28
Tabla 15 Proyectos terminados y/o entregados Meta 91.....	33
Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2024	7
Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente	8

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.

1.2. Objetivos Específicos

- Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.
- Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.
- Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Con este proyecto se fortalecerá y dotará la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general, cuenten con espacios educativos dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y el acceso a la educación. El proyecto desarrolla a través de tres (3) objetivos específicos asociados a:

1. **Construcción y terminación:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de construcción, restitución, y ampliación, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje.
2. **Mejoramiento (conservación):** mediante las acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura se priorizará y desarrollaran intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la necesidad, riesgo y población beneficiada, así como el mejoramiento de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se puedan presentar, garantizando la continuidad del servicio, y en los casos requeridos, la reubicación de la población escolar, en sedes alternas alquiladas, durante la ejecución de las obras, en atención al principio de

programación integral de la inversión, así como el aseguramiento de los bienes inmuebles de la SED. Todo esto bajo el principio de optimización de los recursos destinados para estas actividades.

3. **Dotación:** desde este componente se atenderán las necesidades de colegios y áreas administrativas, de igual forma, se adelantarán acciones orientadas a garantizar las dotación y renovación de los elementos requeridos y necesarios para atender el aumento de cobertura en los distintos niveles de educación, así como la compra y entrega de dispositivos tecnológicos y de conectividad, de los cuales se beneficiarán los estudiantes más vulnerables de la ciudad, aportando así a la disminución de la brecha digital de la comunidad educativa de la ciudad. De otra parte, se garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar las dotaciones adquiridas por la SED.

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

N/A.

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

N/A.

5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

El Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá, inició su ejecución presupuestal el 1 de enero de 2024 con una asignación de \$ 437.400.567.000, distribuidos de la siguiente manera: 01 CONSTRUCCION Y TERMINACIÓN \$ 306.781.964.000, 02 MEJORAMIENTOS \$60.618.603.000 y para el componente de 03 DOTACIONES \$70.000.000.000, como se observa a continuación:

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2024

Componente	Presupuesto a enero 2024	Traslados entre objetos de gasto	Total, Presupuesto Vigente a marzo de 2024
CONSTRUCCION Y TERMINACION	306,781,964,000	-720,065,690	306,061,898,310
MEJORAMIENTOS	60,618,603,000	720,065,690	61,338,668,690
DOTACIONES	70,000,000,000	0	70,000,000,000
TOTAL	437,400,567,000	0	437,400,567,000

Frente a modificaciones presupuestales, entre los meses de enero a marzo, el proyecto presento diferentes traslados entre componentes así:

En el componente de construcciones se realizó contra créditos por \$ -720,065,690, del componente Construcción y terminación objeto 01001 Compra de lotes, diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa nuevas y existentes en modalidades de: colegio nuevo, restitución, terminación o ampliación y/o adicionales fuente de financiación 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO al componente 02 mejoramientos objeto de gasto 02004 Pagar los fallos de sentencias, reclamaciones u otras que se generen producto de los contratos relacionados con el proyecto o derivados de sanciones impuestas a la entidad.

Tabla 2. Modificaciones presupuestales primer trimestre

Componente	Presupuesto inicial	Modificaciones Contra crédito	Modificaciones Crédito	Presupuesto a 30/03/2024
CONSTRUCCION Y TERMINACION	306,781,964,000	-720,065,690	0	306,061,898,310
MEJORAMIENTOS	60,618,603,000	0	720,065,690	61,338,668,690
DOTACIONES	70,000,000,000	0	0	70,000,000,000
TOTAL	437,400,567,000	-720,065,690	720,065,690	437,400,567,000

En cuanto al comportamiento de la ejecución presupuestal del proyecto 7638, a corte de 31 de marzo, se comprometió el 46,2 % del presupuesto vigente, desagregado por componente así:


01 construcción y terminación: el componente de construcciones presenta compromisos por valor de \$ 190.305.743.796, correspondientes al 62 % de la asignación, direccionados a la suscripción de contratos de obra e interventoría, adiciones contractuales, contratación de personal de apoyo a la gestión y pago de trámites ante curadurías.

02 mejoramientos: este componente presenta compromisos por valor de \$ 4.906.233.387 correspondientes al 8 % de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra e interventoría, pago de fallos y sentencias y la adjudicación para la adquisición de la póliza todo riesgo y daños materiales con el fin de salvaguardar los bienes inmuebles.

03 Dotación: La ejecución presupuestal a 31 de marzo alcanzó el 10 %, comprometiendo recursos por valor de \$6.996.006.892, correspondiente a la contratación de prestación de servicios profesionales, servicios de apoyo a la gestión, adquisición de dotaciones, y adquisición de la póliza todo riesgo y daños materiales con el fin de salvaguardar los bienes muebles.

5.1. Ejecución Presupuestal Acumulada

Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2024

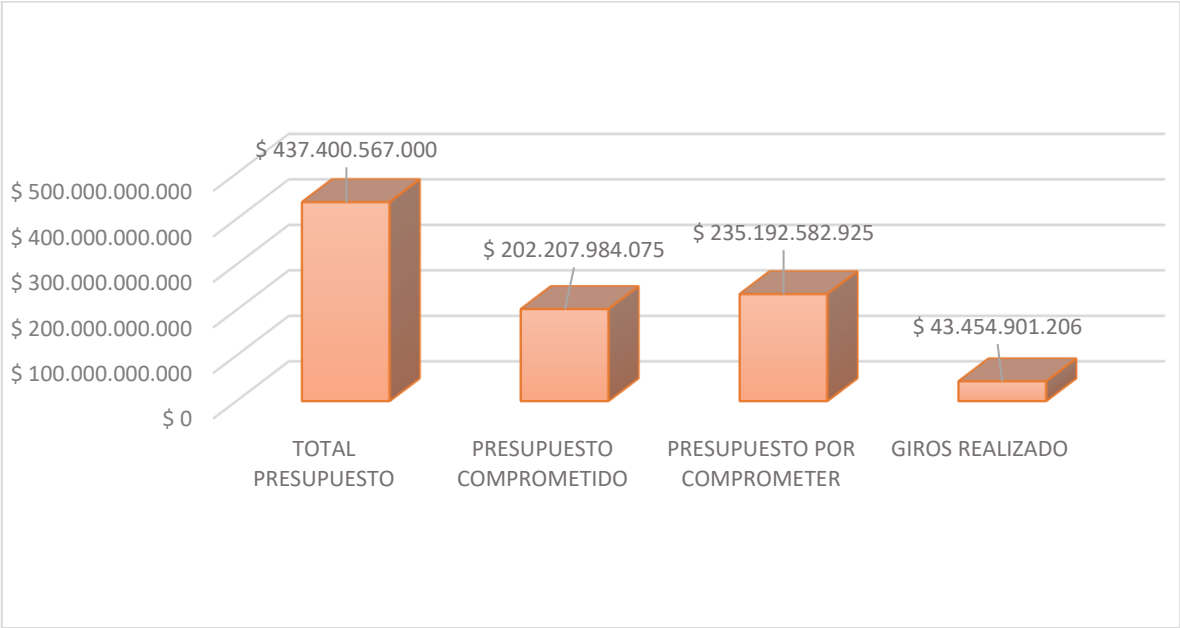

5.2. Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto

Frente a la ejecución presupuestal del proyecto, este se realiza a través de 3 componentes: 01 Construcción y terminación, 02 Mejoramientos y 03 Dotaciones. Los cuales presentan una ejecución a 31 de marzo de 2024 del 62%, 8% y 10%, respectivamente. Así mismo, se realizaron giros por valor de \$43.454.901.206, como se muestra a continuación:

Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente



A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por componente:

01 construcción y terminación: el componente de construcciones presenta compromisos por valor de \$190.305.743.796, correspondientes al 62% de la asignación; de los cuales se comprometieron recursos por \$188.096.842.309 orientados a la ejecución de los proyectos Cardenal Luque, General Santander y Alexander Fleming, el contrato interadministrativo para la construcción de los colegios patrimoniales (RENOBO) y la suscripción del contrato interadministrativo con FINDETER para la construcción de 9 colegios. Así mismo, se comprometieron recursos para el pago de trámites ante Curadurías por valor de \$131.023.219 y contratación personal de apoyo a la gestión por valor de \$2.077.878.268.

02 mejoramientos: para este componente se comprometieron recursos por valor de \$ 4.906.233.387, correspondiente al 8 % de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de interventorías por valor de \$ 284.735.156 y pago de fallos y sentencias de salud por \$1.498.231 y la contratación de la póliza de seguros de bienes inmuebles por \$4.620.000.000.

03 Dotación: Es preciso indicar que la ejecución presupuestal a 31 de marzo alcanzó el 10%, comprometiendo recursos por valor de \$6.996.006.892, entre prestación de servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión por \$850.566.909; adición al contrato No 5274964 de 2023 por \$ 4.765.439.983 para la adquisición de equipos e instrumentos para laboratorios. Igualmente, se comprometieron \$1.380.000.000 para coadyuvar en el financiamiento de la adquisición de la póliza todo riesgo daño material, con el fin de salvaguardar las dotaciones.

5.3. Ejecución Reservas Presupuestales

El proyecto constituyó reservas para la vigencia 2024 por valor de \$452.955.783.725; al finalizar el primer trimestre del año se gestionaron recursos por valor de \$136.686.247.301, correspondiente al 30 % de la reserva constituida, como se muestra a continuación:

Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales

Componente	Reservas Constituidas a 01/01/2024	Giros al 30 de marzo 2024	Anulación Definitiva (Saldos Liberados)	% Reservas Gestionadas	Saldo por Gestionar 30/03/2024
CONSTRUCCION Y TERMINACION	292,361,947,270	86,301,214,224	6,759,500	30%	206,053,973,546
MEJORAMIENTOS	109,414,654,659	26,768,866,769	0	24%	82,645,787,890
DOTACIONES	51,179,181,796	23,616,166,308	0	46%	27,563,015,488
TOTAL	452,955,783,725	136,686,247,301	6,759,500	30%	316,262,776,924

6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

6.1. Objetivo Específico 1.

Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.

6.1.1. Producto 1

Infraestructura educativa construida: Para la vigencia 2023, se programó la construcción de seis (6) instituciones educativas. Estos colegios se encuentran ubicados en las localidades Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa y Fontibón.

Tabla 4. Producto Objetivo 1

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa construida	2	1	En el periodo se terminó y entregó 1 colegio nuevo (Colegio Agudelo Restrepo de la localidad de Ciudad Bolívar el cual beneficia a 1110 niños, niñas y jóvenes). A 31 de marzo 2024, la entidad ha terminado/entregado 34 colegios, es así, que el porcentaje acumulado de ejecución de la meta PDD es del 97,14 %. Adicionalmente, (1) se encuentra en

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
			alistamiento para entrega y puesta en marcha, (8) en ejecución, (1) próximo a iniciar y (2) en proceso de contratación.

6.1.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.1.2.1. *Meta 1:* Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, en lotes nuevos, intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

La Administración Distrital estableció una meta de entrega de 35 colegios nuevos y restituidos como parte del Plan Distrital de Desarrollo, sin embargo, y atendiendo las necesidades de la ciudad en cuanto a infraestructura educativa y sus apuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial, el avance logrado en gestión predial y contratación y elaboración de diseños, y en consonancia con lo aprobado por el Concejo Distrital, por medio del nuevo cupo de endeudamiento y demás recursos, la Secretaría de Educación Distrital contempla dejar adicionalmente al cumplimiento de la meta, en etapa de diseños con licencia de construcción, contratados o en ejecución de obra, por lo menos otras 35 sedes educativas en las diferentes localidades de la ciudad.

Los colegios que se reportan como terminados, en ejecución o próximos a iniciar corresponden a los proyectos con mayor avance en la planeación y ejecución de obra. En ese sentido, el cumplimiento de la meta de los 35, corresponderá a las 35 sedes educativas que presenten mayor avance al finalizar la respectiva administración y el actual Plan de Desarrollo.

En torno a lo anterior, a corte de 31 de marzo, la entidad ha terminado y entregado treinta y cuatro (34) colegios. Adicionalmente, (1) se encuentra en alistamiento para entrega y puesta en marcha, (8) en ejecución, (1) próximo a iniciar y (2) en proceso de contratación.

En torno a lo anterior, la Secretaría venía ejecutando 15 proyectos que se encontraban contratados desde la administración anterior, de los cuales a corte de 31 de diciembre se han terminado y entregado al 100%; dichos colegios se relacionan a continuación y corresponden a intervenciones en modalidad de obra nueva, restitución y/o ampliación:

Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	% Avance Diciembre	Estado de la obra
					2023	
1	Kennedy	Carlos Arango Vélez	Restitución	89,00%	100%	Terminado
2	Bosa	Colegio de la Bici	Colegio Nuevo	61,00%	100%	Terminado
3	Engativá	Tabora	Restitución	84,00%	100%	Terminado
4	La Candelaria	La Candelaria (sede La Concordia)	Terminación	40,00%	100%	Terminado
5	Bosa	Campo Verde I – Laurel de Cera	Colegio Nuevo	60,00%	100%	Terminado
6	Bosa	Campo Verde II – Parques de Bogotá	Colegio Nuevo	61,00%	100%	Terminado
7	Ciudad Bolívar	Sierra Morena – Parque	Colegio Nuevo	63,66%	100%	Terminado
8	Kennedy	Ciudad de Techo I	Colegio Nuevo	29,00%	100%	Terminado
9	Fontibón	Integrado de Fontibón (Sede Emma Villegas de Gaitán)	Ampliación	0,60%	100%	Terminado
10	Tunjuelito	Rafael Uribe Uribe	Restitución	25,00%	100%	Terminado
11	San Cristóbal	República Del Ecuador	Restitución	28,00%	100%	Terminado
12	Engativá	Laureano Gómez	Restitución	48,00%	100%	Terminado
13	Ciudad Bolívar	Sierra Morena - La Curva	Colegio Nuevo	15,50%	100%	Terminado
14	Antonio Nariño	Guillermo León Valencia	Ampliación	63,00%	100%	Terminado
15	Usme	Ciudad, Chengdú – predio Bolonia*	Colegio Nuevo	75%	100%	Terminado

*En proceso sancionatorio

Así mismo, la entidad ejecuto la terminación de cinco (5) sedes de primera infancia, las cuales, con corte a marzo 31 de 2024, han sido terminadas y entregadas:

Tabla 6 Proyectos de primera infancia

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance Diciembre 2023	Estado de la obra
1 (16)	Bosa	Villas del Progreso Porvenir VII	Colegio Nuevo	100 %	Terminado
2 (17)	Kennedy	Gabriel Betancourt Mejía	Colegio Nuevo	100 %	Terminado
3 (18)	Bosa	Bosa Brasilia Porvenir IV	Colegio Nuevo	100%	Terminado
4 (19)	Suba	María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes Sabana de Tibabuyes Fase II	Colegio Nuevo	100%	Terminado
5 (20)	Suba	Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande Fase II	Colegio Nuevo	100%	Terminado

En la **vigencia de 2020**, se logró la terminación de la construcción de cuatro (4) proyectos: 1. "La Bici" ubicado en la localidad de Bosa, 2. "Carlos Arango Vélez", ubicado en la localidad de Kennedy, 3. Tabora ubicado en la localidad de Engativá y 4. el Colegio denominado La Candelaria ubicado en la localidad Candelaria.

Durante la **vigencia 2021**, la Dirección de construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, terminó la construcción de siete (7) proyectos denominados: 1. "Parques de Bogotá – Campo Verde II" y 2. "Laurel de Cera – Campo Verde I" ubicados en la localidad de Bosa, 3. "Laureano Gómez", ubicado en la localidad de Engativá, el 4. Colegio denominado "El Nogal – Predio Sierra Morena Parque" ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, 5. el colegio "Ciudad de Techo I" ubicado en la localidad de Kennedy, 6. Integrado de Fontibón - Emma Villegas De Gaitán ubicado en la localidad de Fontibón, 7. Rafael Uribe Uribe en la localidad de Tunjuelito.

Para la **vigencia 2022**, a corte de 31 de diciembre fueron terminados (8) colegios y (3) sedes de primera infancia: 1. Esmeralda Arboleda Cadavid - La Palestina, 2. Laura Herrera de Varela - Encenillos Niños Jesús, 3. Ciudadela El Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo - Plaza Logística de la localidad de Bosa, 4. Abel Rodríguez Céspedes - Los Cerezos de la Localidad de Engativá con capacidad para 8300 estudiantes, 5, Guillermo León Valencia Localidad Antonio Nariño, con capacidad 720 estudiantes, 6. Angela Restrepo Moreno- Sierra Morena Curva, en la localidad de Ciudad Bolívar que atenderá 1040 estudiantes y 7. Gloria Valencia de Cataño - Santa Teresita con una capacidad de 1.040 cupos en la localidad de San Cristóbal, 8. Villas del Progreso Porvenir VII y 9. Bosa Brasilia Porvenir IV - de la localidad de Bosa, 10. Gabriel Betancourt Mejía – de la localidad de Kennedy, y 11. República del Ecuador – Localidad de San Cristóbal.

Durante la **vigencia 2023**, Se han terminado y/o entregado once (11) proyectos (9 colegios y 2 sedes de primera infancia) 1. María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiara a 180 niños, 2. Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande, ampliando la cobertura en 225 cupos, estos ubicados en la localidad de Suba, 3. El Colegio Lucía Rubio de Laverde - Porvenir de la localidad de Engativá que beneficiara a 1040 niños, niñas y jóvenes de la localidad, 4. El Colegio Ciudad de Chengdu (Bolonia) de la localidad de Usme, el cual beneficiara a 550 niños de la localidad, 5. Villemar el Carmen sede C, ubicado en la localidad de Fontibón, la cual beneficiará a 800 niños, 6. Arborizadora

Alta, la cual beneficiara a 2240 niños, en la localidad de Ciudad Bolívar, 7. El colegio San Francisco de Asís ubicado en Los Mártires, el cual beneficiará a 600 niños, 8. El colegio Jaime Niño Diez, de la localidad de Suba, el cual beneficiara 520 niños de la localidad de Suba, 9. el colegio La Merced – de la localidad de Puente Aranda, la cual beneficiará a 2440 niños, 10. El colegio los pinos – de la localidad de Santa Fe, la cual beneficiará a 1120 niños y 11. Primera etapa del Colegio Teresa Martínez de Varela – La Magdalena de la localidad de Kennedy, no obstante, algunos de estos proyectos se encuentran en trámite de conexiones definitivas de servicios públicos.

En lo corrido de la **Vigencia 2024**, Se han terminado y/o entregado un (1) Proyecto 1. Agudelo Restrepo de la localidad de Ciudad Bolívar el cual beneficia a 1110 niños, niñas y jóvenes de la localidad.

Ahora bien, la administración distrital, avanzó con el desarrollo de (26) colegios adicionales, de los cuales (17) están siendo ejecutados directamente por la SED, (5) mediante convenio interadministrativo SED-MEN, (2) se desarrollan a través de contratos interadministrativos con RENOBO (ERU) y (2) más se desarrollan a través de contratos interadministrativos con ENTERRITORIO.

Con corte a marzo 31 de 2024, de los (17) proyectos adelantados por la SED: (9) han sido terminados y entregados, (6) se encuentran en ejecución, (1) próximo a iniciar cuya contratación se legalizó en el mes de diciembre de 2023 y (1) en proceso sancionatorio y fase de terminación en contratación mediante gerencia externa.

Los proyectos citados se relacionan a continuación:

Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	% Avance Mar /2024	Recursos restantes para finalizar construcción	Fecha estimada de entrega de la obra
1 (21)	Bosa	Laura Herrera de Varela Encenillos (Predio Niño Jesús)	Colegio Nuevo	0,00%	100%	N / A	oct-22
2 (22)	Bosa	Esmeralda Arboleda Cadavid - La Palestina	Colegio Nuevo	0,00%	100%	N / A	nov-22
3 (23)	San Cristóbal	Gloria Valencia de Cataño- Santa Teresita	Colegio Nuevo	0,00%	100%	N / A	oct-22
N/A	Usme	Ciudad Chengdu (Predio Bolonia) Fase II	Colegio Nuevo	N/A	100%	N / A	dic-23
4 (24)	Santafé	Los Pinos	restitución	N/A	100%	N / A	dic-23
5 (25)	Puente Aranda	La Merced	Restitución	N/A	100%	N / A	dic-23
6 (26)	Fontibón	Villemar El Carmen Sede C	Restitución	0,00%	100%	N / A	dic-23
7 (27)	Ciudad Bolívar	Arborizadora Alta	Restitución	N/A	100%	N / A	dic-23
8 (28)	Suba	Jaime Niño 10- Lombardía	Colegio Nuevo	N/A	100%	N / A	dic-23

INFORME DE GESTIÓN ENERO–MARZO 2024

Proyecto 7638

9 (29)	Kennedy	Feliza Burstyn - Hipotecho	Colegio Nuevo	N/A	99.50%	N / A	abr-24
10 (30)	Kennedy	Luz Gabriela Arango El Ferrol - La Paz	Colegio Nuevo	N/A	63.11%	N / A	ago-24
11 (31)	Bosa	Hena Rodríguez Parra -Indusel	Colegio Nuevo	N/A	47.04%	N / A	oct-24
12 (32)	Fontibón	María Josefa Canelones - Procables	Colegio Nuevo	N/A	50.07%	N/A	nov-24
13 (33)	Rafael Uribe Uribe	Alexander Fleming	Restitución	N/A	0.10%	N/A	Jul-25
14 (34)	Engativá	Inés Ochoa Pérez (Cardenal Luque)	Restitución	N/A	0.33%	N/A	Ago-25
15 (35)	Usaquén	General Santander	Restitución	Próximo a iniciar			
16 (36)	Ciudad Bolívar	San Francisco Sede B Fase I*	Restitución	N/A	40,96%	N / A	Proceso Sancionatorio

*Para el caso de San Francisco sede B el contrato de obra terminó el 23 de octubre de 2023, sin el cumplimiento del objeto contractual por lo tanto se encuentra en proceso sancionatorio y paralelamente se adelanta el en proceso de contratación para su terminación

Adicionalmente, a través de convenios interadministrativos con el FFIE, se adelanta la construcción de cinco (5) nuevos colegios en cofinanciación con la nación por recursos de \$53.912.000.000, para los cuales la SED apropió recursos por valor de \$72.863.405.263,18, para un valor total ejecutado de \$ 126.775.405.264. De estos proyectos, (4) han sido terminados y entregados a la comunidad educativa y (1) está proceso de contratación por parte de la gerencia externa; tal y como se relaciona a continuación:

Tabla 8. Proyectos cofinanciados

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance	Fecha estimada de entrega de la obra
				Marzo / 23	
1 (37)	Bosa	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint Malo - Plaza Logística	Colegio Nuevo	100%	Terminado
2 (38)	Engativá	Abel Rodríguez Céspedes - Los Cerezos	Colegio Nuevo	100%	Terminado
3 (39)	Engativá	Lucila Rubio de Laverde -Porvenir	Colegio Nuevo	100%	Terminado
4 (40)	Ciudad Bolívar	Agudelo Restrepo – Bonavista*	Colegio Nuevo	100%	mar-24
5 (41)	Santafé	Policarpa Salavarrieta	Restitución	En contratación - Próximo a iniciar	

* Entrega parcial

De otra parte, en la vigencia 2021, se suscribieron dos (2) contratos interadministrativos con la ERU y ENTERRITORIO los cuales tienen por objeto “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para la ejecución de los proyectos Hacienda Casablanca y Boíta por parte de EN Territorio y San Francisco de Asís y La Magdalena, que serán desarrollados por la ERU.

Los proyectos que gerencia la entidad EN Territorio iniciaron su ejecución en el mes de marzo de 2022 así: Hacienda Casablanca - 17 de marzo de 2022 y Boíta - 25 de marzo de 2022. En cuanto a los

INFORME DE GESTIÓN ENERO–MARZO 2024

Proyecto 7638

proyectos gerenciados por la ERU, el proyecto La Magdalena inició su ejecución el 23 de mayo de 2022, y frente al proyecto San Francisco de Asís Fase II, inició el 8 de junio de 2022.

Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Gerencia	% Avance Marzo/ 2024	Estado de la Obra	Fecha estimada de entrega de la obra
1 (42)	Ciudad Bolívar	María Currea Manrique -Hacienda Casablanca	Colegio Nuevo	EN Territorio	83.50 %	En ejecución	May-2024
2 (43)	Kennedy	María Betsabé Espinal – Boíta	Colegio Nuevo	EN Territorio	56.52 %	En ejecución	Jul-2024
3 (44)	Mártires	San Francisco de Asís	Colegio Nuevo	ERU	100%	Terminado	Dic-2023
4 (45)	Kennedy	Teresa La Magdalena*	Colegio Nuevo	ERU	63.26%	En ejecución	Entrega Primera Etapa Dic-23
	Ciudad Bolívar	San Francisco Sede B Fase II	Restitución	ERU	En contratación - Próximo a iniciar		

*Entrega parcial

Así las cosas, con corte al 31 de marzo de 2024, la entidad terminó y entregó (34) colegios, (1) se encuentran en alistamiento para entrega y puesta en marcha, (7) en ejecución, (1) contratado próximo a iniciar, (2) en proceso de contratación por parte de las gerencias externas, (1) en ejecución segunda etapa.

Adicionalmente, mediante Acuerdo 840 de junio 13 de 2022, se aprobaron recursos de cupo de endeudamiento para la construcción de 26 nuevas obras adicionales para la ciudad con 19 colegios nuevos/restituídos, 6 colegios para la primera infancia y 1 centro pedagógico, las cuales se encuentran en proceso de estudios y diseños y obtención de licencias. Así mismo, se adelanta la ejecución de 3 consultoría de estudios y diseños adicionales, que no hacen parte de los 26 proyectos aprobados en el Acuerdo.

Conforme a lo citado anteriormente, de los 29 proyectos que venían en fase de consultoría, 3 se encuentran por iniciar obra contratada directamente por la SED (Alexander Fleming, Cardenal Luque y General Santander), 16 se encuentran en ejecución de consultoría y cuenta con financiamiento para la ejecución de las obras y 10 Proyectos más están en etapa de consultoría y requieren apropiación de recursos para la ejecución de las obras. A continuación, se relacionan el estado de 26 proyectos en fase de consultoría:

Tabla 10 Proyectos adicionales Acuerdo 840

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Estado	% Avance Consultoría Marzo 31/24
1 (46)	Santafé	Altos de Egipto	Colegio Nuevo	Con Licencia Ejecutoriada Obra contratada mediante gerencia externa	88,00%
2 (47)	La Candelaria	Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez	Restitución	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	90.19%
3 (48)	Suba	Fontanar del Rio	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	60.00%
4 (49)	Engativá	Antonio Villavicencio sede A	Restitución Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	64.32%
5 (50)	Engativá	Antonio Villavicencio (Cesión)	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	64.32%
6 (51)	San Cristóbal	Barbara Forero - Las Brisas	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	77.37%
7 (52)	Bosa	Porvenir II	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	75.25%
8 (53)	Ciudad Bolívar	Madelena	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	42.00%
9 (54)	Suba	María Ana tilde Bulla Nivia - Theilard de Chardan	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	35.00%
10 (55)	Bosa	Villas del Progreso (compra)	Colegio Nuevo	Elaboración Fase II IDIGER - Compilación documental para radicar en Curaduría Urbana Obra contratada mediante gerencia externa	40,00%
11 (56)	Suba	María Teresa Pulido - Ciudadela Cafam II	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	44.00%

INFORME DE GESTIÓN ENERO–MARZO 2024

Proyecto 7638

12 (57)	Bosa	Villas del Progreso (Cesión)	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	45.00%
13 (58)	Ciudad Bolívar	Brisas del Diamante	Restitución	En gestión para radicar en Curaduría Obra contratada mediante gerencia externa	66.87%
14 (59)	Rafael Uribe Uribe	Liceo Femenino Mercedes Nariño (patrimonial)	Restitución	En ejecución Obra contratada mediante gerencia externa	7,00%
15 (60)	Bosa	Francisco de Paula Santander (patrimonial)	Restitución	En ejecución Obra contratada mediante gerencia externa	9,00%
16 (61)	Los Mártires	Agustín Nieto Caballero (patrimonial)	Restitución	En ejecución Obra contratada mediante gerencia externa	9,01%
17 (62)	Engativá	Ana Galvis Hotz (Plazuela de Álamos - Concreto Premezclado)	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido	60,00%
18 (63)	Suba	Victoria Bossio Herrera (Alfonso Jaramillo)	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción	63,00%
19 (64)	Engativá	La Palestina	Restitución	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción	64,00%
20 (65)	Engativá	Miguel Antonio Caro	Restitución	En ejecución	20.97%
21 (66)	Engativá	Porvenir ERU	Colegio Nuevo	En ejecución	40.76%
22 (67)	Fontibón	Integrado de Fontibón	Restitución	En ejecución	19,75%
23 (68)	Tunjuelito	San Benito Abad	Restitución	En ejecución	33.60%
24 (69)	Santafé	El Verjon	Restitución	Suspendido	65.10%
25 (70)	Usme	La Parroquia	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por tramite IDPC	42.00%
26 (71)	Usme	Cortijo Vianey	Restitución	En ejecución	5%

* Las consultorías que se encuentran radicadas en debida forma ante las curadurías urbanas para los tramites de licencia de construcción y/o urbanismo, y expedición de las actas de observaciones y/o actos resolutorios, se encuentran en estado suspendido.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

A corte del reporte no se presentan retrasos o dificultades en los proyectos de obra que están en ejecución o próximos a iniciar.

c. Registro Fotográfico

1. Colegio Arborizadora Alta Sede Daniel Esteven Duque Buitrago – Ciudad Bolívar



- Estudiantes beneficiados: 2.240
- Área Construida: 13.877 M2

2. Colegio Agudelo Restrepo - (Bonavista) – Ciudad Bolívar



- Estudiantes beneficiados: 1110
- Área Construida: 10.562,15 M2

6.2. Objetivo Específico 2.

Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.

6.2.1. Producto 2.

Para la vigencia 2023 se proyectó la intervención de 282 sedes educativas, de las cuales 173 corresponde a meta rezago de la vigencia 2022 y 109 a la meta establecida para la presente vigencia.

Tabla 11. Productos Objetivo 2

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa mejorada	45	12	A 31 de marzo 2024, se logró la intervención de 12 IED. En el periodo se continuó con la ejecución de 82 frentes de mejoramiento y 80 por iniciar, con un avance técnico promedio para el 2022 del 75.86 % y para el 2023 del 40,29%. Entre las vigencias 2020 al mes de marzo del 2024, se ha logrado una meta acumulada de 704 sedes educativas y administrativas con 1155 intervenciones desde la vigencia 2020 hasta el 31 de marzo de 2024, para un cumplimiento de la meta del 97%.

6.2.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.2.2.1. Meta 2: Intervenir 730 sedes educativas existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

Desde la vigencia 2020 hasta el 31 de marzo de 2024, la entidad ha logrado intervenir 704 sedes educativas, en las cuales se ha ejecutado 1155 intervenciones con mejoramientos, con el fin de robustecer las condiciones de las plantas físicas educativas, en cuanto a baterías sanitarias, cubiertas, áreas libres y recreativas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, cerramientos y mejoramiento de ventilación y carpintería metálica.

Ahora bien, en el periodo de enero a marzo de 2024, se ha adelantado la siguiente gestión:

En el mes de enero de 2024, se terminaron 12 sedes educativas que ya han sido intervenidas previamente, las cuales están distribuidas en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 104 frentes de mejoramiento, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 66.81%, encontrándose en ejecución 11 contratos de obra y 11 de interventoría. El contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 23.52%, continuando pendiente por iniciar el contrato de obra del grupo 7 /2023.

En el mes de febrero de 2024, se terminaron 27 sedes educativas, de las cuales 17 fueron intervenidas previamente y 10 son nuevas sedes con obras de mejoramiento, las cuales están distribuidas en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme, Suba, San Cristóbal, Rafael Uribe, Fontibón, Barrios Unidos y Engativá; de igual forma se continua con la ejecución de 96 frentes de mejoramiento, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 71.29%, encontrándose en ejecución 11 contratos de obra y 11 de interventoría. El contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 32%, continuando pendiente por iniciar el contrato de obra del grupo 7 /2023.

Durante el mes de marzo de 2024, se terminaron 28 sedes educativas y administrativas, de las cuales 26 fueron intervenidas previamente y 2 son nuevas sedes con obras de mejoramiento, las cuales están distribuidas en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe, Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 82 frentes de mejoramiento y 80 frentes por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 75.86%, encontrándose en ejecución 9 contratos de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 9 y 11/2022 ya se encuentran terminados y el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 40.29%, continuando pendiente por iniciar el contrato de obra del Grupo 7 /2023.

A continuación, se relacionan los mejoramientos recibidos en el periodo que aporta a la meta:

COMPONENTES	MEJORAMIENTOS	EMERGENCIAS	TOTAL
ENERO	0	0	0
FEBRERO	9	1	10
MARZO	2	0	2
INTERVENCIONES			12

Tabla 12 Discriminación de mejoramientos recibidos 2024

INFORME DE GESTIÓN ENERO–MARZO 2024

Proyecto 7638

TERMINADOS EN FEBRERO 2024						
No.	LOCALIDAD	CPF	NOMBRE COLEGIO	NOMBRE SEDE	ORDEN SEDE	TIPO DE INTERVENCION
693	SAN CRISTOBAL	422	COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)	EL QUINDIO	B	MEJORAMIENTO
694	FONTIBON	917	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	ANTONIO NARIÑO	B	MEJORAMIENTO
695	BARRIOS UNIDOS	1225	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	JARDIN INFANTIL NACIONAL POPULAR No 1	C	MEJORAMIENTO
696	ENGATIVA	1062	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	LAUREANO GOMEZ	A	MEJORAMIENTO
697	SUBA	1164	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	MIRANDELA	B	MEJORAMIENTO
698	SUBA	1156	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	GONZALO ARANGO	A	MEJORAMIENTO
699	USME	524	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	FEDERICO GARCIA LORCA	A	MEJORAMIENTO
700	USME	535	COLEGIO USMINIA (IED)	LORENZO ALCANTUZ	B	MEJORAMIENTO
701	USME	580	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	SEDE B	B	MEJORAMIENTO
702	CIUDAD BOLIVAR		COLEGIO ROGELIO SALMONA	COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED) - SEDE PRINCIPAL	A	EMERGENCIA
TERMINADOS EN MARZO 2024						
703	USME	525	COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI	FISCALIA ALTA	C	MEJORAMIENTO
704	USME	512	COLEGIO CHUNIZA	CHUNIZA FAMACO	A	MEJORAMIENTO

Los mejoramientos relacionados integran actividades propias de reparaciones locativas dentro de las instituciones educativas, intervenciones en los colegios en atención a requerimientos de servicios públicos y atención de emergencias.

Finalmente, es de precisar que, las obras de mejoramientos pendientes por terminar están en desarrollo en el marco de los contratos que se encuentran en ejecución 2022 y 2023 y se prevé que su terminación y entrega se realice en el mes de mayo de 2024.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

"En las sedes educativas donde se realizan paralelamente actividades de obra y actividades pedagógicas, se ha coordinado horarios de trabajo con el fin de no afectar la prestación del servicio educativo, lo que ha ocasionado que las actividades demoren más de lo previsto.


El contrato de obra No. 4078105-22 grupo 6, el 19/02/2024, la oficina de contratos citó a audiencia para la presentación de los testimonios y entrega documental de pruebas, el 23/02/2024; El 13/03/2024, se realizó audiencia para la presentación de los testimonios, el 20/03/2024, se remitió respuesta a los testimonios y el 26/03/2024, se remitió a la oficina de contratos para dar respuesta al traslado presentado por el abogado del Contratista. La Oficina de Contratos se encuentra adelantando lo pertinente para el pronunciamiento final del proceso.

Frente al Contrato de obra CO1.PCCNTR. 4077646 de 2022 grupo 10, de las de las localidades de Kennedy y Fontibón, se han presentado dificultades en la ejecución de las obras, generando atrasos en el cronograma de trabajo, por lo cual se contempla adelantar un proceso administrativo por presunto incumplimiento.

El contrato de obra CO1.PCCNTR.5305650 de 2023 del grupo 7, de las localidades de Kennedy y Fontibón, no se ha logrado firmar el acta de inicio dado al incumplimiento del contratista en la presentación y entrega total de las actividades requeridas para tal fin (presupuestos, APUS, programaciones e informe preliminar). Debido a lo anterior la interventoría presentó a la Secretaria de Educación del Distrito, informe solicitando iniciar un proceso sancionatorio por posible incumplimiento. La SED programo audiencia para el 05 de abril 2024."

c. Registro Fotográfico

1. Colegio Manuel Elkin Patarroyo Sede A	
Antes	Después
	
	
2. Colegio Restrepo Millán Sede A	
Antes	Después

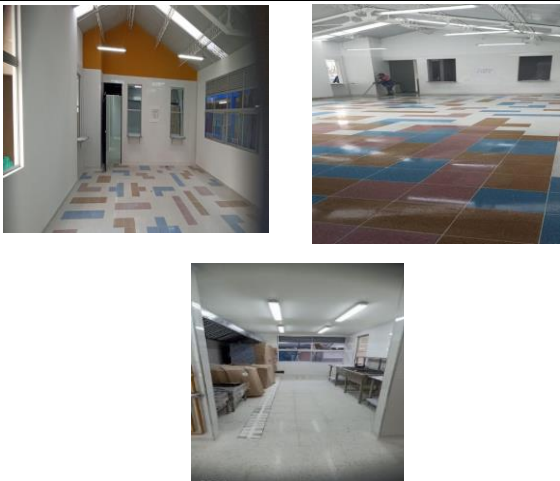	
3. Colegio Isabel II Sede B	
Antes	Después
 	

6.3. Objetivo Específico 3

Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

6.3.1 Producto 3. Infraestructura educativa dotada

Tabla 13. Productos Objetivo 3

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa dotada	74	30	Para la vigencia 2024 se programaron (74) sedes educativas. A 31 de marzo de 2024, se realizaron entregas de dotaciones contratadas en la vigencia 2023, justificadas en la reserva presupuestal 2024 por valor de \$23.398.980.996; igualmente se realizó una adición al contrato No. 5274964 suscrito con ICL DIDACTICA SAS para la adquisición de nuevos equipos e instrumentos necesarios para los laboratorios de física, química, ciencias naturales y ambientes de formación especializados de las instituciones educativas distritales. Es necesario precisar que el valor entregado en cada sede con recursos de la reserva 2024 se sumará a las entregas que se realicen con recursos de la vigencia 2024, de manera concordante, para reportar la meta asociadas a la dotación en cada una de las sedes educativas a 31 de marzo de 2024 se reporta un avance de 30 sedes.

Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.3.2.1 Meta 3: Dotar las 770 sedes educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial

a. Avances y/o Logros:

De las 770 sedes programadas para dotar en el cuatrienio, es preciso indicar que al finalizar la vigencia 2020 se obtuvo un logro de 57 sedes dotadas, al cierre de la vigencia 2021 el logro obtenido fue de 237 sedes adicionales dotadas, y al cierre de la vigencia 2022, el logro obtenido fue de 295 sedes dotadas; al finalizar la vigencia 2023 se reportan 107 sedes, de las cuales 8 que corresponden a las programadas para el 2023 en ejecución de los recursos de las reservas presupuestales 2022, logrando el cumplimiento del 100% de la meta programada para el 2023; y un logro acumulado de 696 sedes dotadas ; A 31 de marzo de 2024 se reporta un avance de 30 sedes de las programadas para el 2024, logrando así la dotación acumulada de 726 sedes, desde el inicio de ejecución del proyecto hasta la fecha, equivalente a un logro del 94.2% del total programado para el cuatrienio.

Es preciso indicar, que las sedes reportadas al primer trimestre de 2024, son aquellas que recibieron dotaciones en lo relacionado con mobiliario escolar y administrativo, material bibliográfico para las bibliotecas escolares, paquetes con útiles escolares, materiales e implementos deportivos, equipos e instrumentos necesarios para los laboratorios de física, química, ciencias naturales y ambientes de formación, equipos de tecnología; al igual que maquinaria y equipos especializados necesarios para el fortalecimiento de los ambientes de formación en las instituciones educativas, material pedagógico para las instituciones educativas distritales, parque infantiles, entre otras.

A 31 de marzo de 2024, se realizaron entregas de dotaciones contratadas en la vigencia 2023, justificadas en la reserva presupuestal 2024 por valor de \$23.398.980.996, que sumadas a los \$217.185.312.00 correspondientes a las prestaciones de servicio, alcanzaron una ejecución \$23.616.166.308 equivalente al 46.1% de la reserva definitiva constituida. Es necesario precisar que el valor entregado en cada una de las sedes con recursos de la reserva 2024 se sumará a las entregas que se realicen con recursos de la vigencia 2024, de manera concordante, para reportar las metas asociadas a la dotación en cada una de las sedes educativas.

Para la adquisición de dotaciones de la vigencia 2024, entre los meses de enero a marzo se ha adicionado 28 contratos de prestaciones de servicio, entre profesionales y técnicos de apoyo que se requieren para asistir las diferentes labores que implican la ejecución de los recursos asignados al proyecto, igualmente a la fecha se realizaron 13 nuevos contratos de prestación de servicios para apoyar la gestión en la realización de actividades inherentes a del análisis y desarrollo de los sistemas de información a cargo de la dirección de dotaciones escolares, para lo cual se han comprometido recursos por valor de \$850.566.909 y sobre los cuales se registran giros acumulados por valor de \$199.699.214.

En el mes de febrero de 2024, se realizó la adición No 1 al contrato No. 5274964 suscrito con ICL DIDACTICA SAS para la adquisición de nuevos equipos e instrumentos necesarios para los laboratorios de física, química, ciencias naturales y ambientes de formación especializados de las instituciones educativas distritales por valor de \$4.765.439.983.

Igualmente, a 29 de febrero, se invirtieron \$1.380.000.000, para coadyuvar en el financiamiento del contrato de seguros CO1.PCCNTR. No. 5929273 con la UNIÓN TEMPORAL UT MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA - LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS - AXA COLPATRIA SEGUROS SA, específicamente en la adquisición de la póliza Todo Riesgo daño Material, con el fin de salvaguardar las dotaciones, que permitan atender de manera oportuna la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación y sus sedes administrativas.

A 30 de marzo Paralelamente, se trabaja en tres (3) procesos precontractuales para la adquisición de mobiliario escolar y administrativo, equipos de tecnología, al igual que computadores portátiles y de escritorio para las instituciones educativas distritales, el nivel central y local de la secretaria de educación del distrito de conformidad con el avance de los cronogramas de obras proyectados y reportados por la gerencia del proyecto; además de la priorización de necesidades dotacionales de sedes de colegios pendientes de reposición de elementos, producto de los requerimientos presentados por las directivas de las IED y sedes administrativas, que previamente se han registrado en las fuentes de información de la Dirección de Dotaciones Escolares; conforme a los objetivos plasmados en el proyecto de inversión.

Frente a la meta de ***“Beneficiar a 124.579 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”***, a 31 de diciembre de la vigencia 2021 se realizó la entrega de 101.749 dispositivos tecnológicos equivalente a una ejecución de la meta del 101.75%. Para la vigencia 2022 se programó la entrega de 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, para cumplir con la nueva meta del cuatrienio de 124.574 dispositivos tecnológicos, de

conformidad con el incremento de meta aprobado por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018

Los avances y logros en referencia a esta meta corresponden a los siguientes antecedentes:

En la vigencia 2022, se adquirieron los nuevos dispositivos tecnológicos, mediante proceso contractual realizado, a través de adhesión al acuerdo marco No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de la tienda virtual del Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente, se suscribieron los contratos de compraventa: No. 92352 por valor de \$10.847.269.834 con NUEVA ERA SOLUCIONES SAS por la compra de 21.738 tabletas digitales y contrato No. 92353 por valor de \$979.930.500 con SISTETRONICS SAS, por la compra de 1.087 computadores portátiles, los contratos iniciaron su ejecución los primeros días de julio de 2022, al finalizar la vigencia 2022, todos los equipos ya habían culminado su etapa de fabricación; el proveedor SISTETRONICS SAS realizó la entrega de 1.087 computadores portátiles a la SED; el otro proveedor, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS argumentó retrasos en los procesos de importación de los otros 21.738 dispositivos derivado de factores de la logística global en puertos de China a Colombia, por lo que fue necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023; con los equipos entregados culminó la vigencia 2022 con un cumplimiento de 102.836 dispositivos tecnológicos entregados, que equivalente a una ejecución de la meta del 82.55%. sobre el nuevo total programado para esta meta de 124.574 dispositivos

Por otra parte es importante resaltar las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvieron 1.057 provenientes de la Campaña #DonatónPorLosNiños, 2.509 del Grupo de Energía de Bogotá y 140 de la Organización Internacional para las Migraciones, 1.067 dispositivos del Fondo de Desarrollo Local de suba, 5.212 tabletas por parte de PROBOGOTA y 16 de United Way, para un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero de 2023, teniendo en cuenta que estos dispositivos no se habían reportado como logros de esta meta. Igualmente, en febrero de 2023, en coordinación de la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA quien ejecutó el contrato No. 4300430, se reinició el contrato No. 92352-2022 por valor de \$10.847.269.834 con NUEVA ERA SOLUCIONES SAS para la entrega de los 21.738 dispositivos digitales restantes a los estudiantes beneficiados. Teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2023 se reportó el cumplimiento de la meta proyectada para el cuatrienio, con un logro total acumulado de 134.507 dispositivos entregados.



Para la vigencia 2024 no se apropiaron recursos para este propósito, teniendo en cuenta que con las Acciones realizadas, se evidencia el cumplimiento de la meta del cuatrienio y se enfatiza en las gestiones realizadas para el incremento de esta meta con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018, lo que se constituye en un hito en la ciudad y en el país, puesto que en los últimos 30 años la Secretaría de Educación había entregado sólo 89 mil dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

En el periodo no se presentaron retrasos considerables, solo los imprevistos propios que surgen en la estructuración de este tipo de contratos que se solucionan con oportunas gestiones administrativas por parte de las diferentes áreas responsables en la SED.

Es pertinente mencionar que la planificación y entrega de dotaciones a las instituciones educativas están supeditadas, en parte, a los avances e imprevistos propios de las obras de infraestructura, por lo cual se modifican los cronogramas de entregas en caso de que se requiera o se reciben las dotaciones en el término de ejecución de los contratos y se almacenan los bienes dotacionales. Así mismo, una sede educativa se va dotando en el transcurso de cada vigencia a través de diferentes contratos, estos aspectos inciden en la oportunidad del reporte de avance de la meta anual, el cual se realiza cuando las entregas de dotaciones concertadas se encuentren en un estado avanzado y se han dotado con más de una familia de elementos.

c. Registro Fotográfico

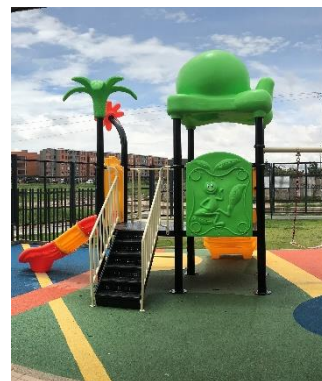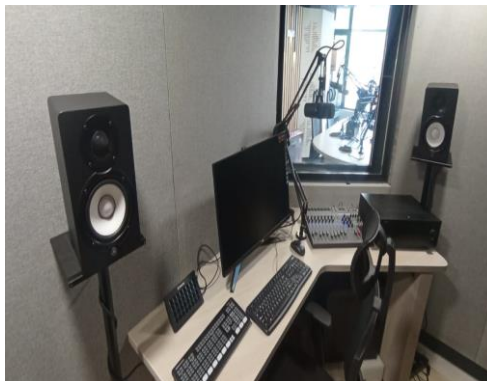

6.4. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto

El plan de adquisiciones del proyecto 7638 programó 232 ítems para el primer trimestre de la vigencia, y se ejecutaron 192 ítems. La ejecución del PAA por componente se dio de la siguiente manera:

01 Construcción: en el PAA se programaron 144 ítems, los cuales fueron ejecutados en su totalidad, los cuales corresponden a adiciones para contratos de obra, interventoría y contratos de prestación de servicio.

02 Mejoramientos: Para el componente de mejoramientos en el primer trimestre del 2024 se programaron 3 ítems en el PAA, los cuales fueron comprometidos en su totalidad, los cuales corresponden a modificaciones de los contratos de mejoramiento y financiamiento de la póliza de seguros todo riesgo daño materia.

03 Dotaciones: En el primer trimestre de la vigencia 2024 fueron programados 85 ítems en el PAA, y se ejecutaron 45 contratos. De los ítems ejecutados 1 corresponden a la adición al contrato para adquisición de equipos e instrumentos para laboratorios, se suscribieron 43 ítems asociados a la prestación de servicios y 1 para la adquisición de la póliza de seguros todo riesgo daño material.

Tabla 14. Plan de Adquisiciones primer trimestre 2024

COMPONENTE	OBJETO DE GASTO	N.º DE	N.º DE	VALOR EJECUTADO
		CONTRATOS PROGRAMADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	
01 CONSTRUCCION Y TERMINACION	Compra de lotes, diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa nuevas y existentes en modalidades de: colegio nuevo, restitución, terminación o ampliación y/o adicionales	2	2	0
	Suministrar el personal de apoyo profesional y técnico para garantizar la adecuada ejecución del proyecto	142	142	\$1,973,057,500
02 MEJORAMIENTOS	Adelantar diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento menor complementarias a la infraestructura de los colegios distritales y/o adicionales	2	2	\$284,735,156
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar los inmuebles de propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito, bajo su responsabilidad, tenencia, control y/o custodia.	1	1	\$4,620,000,000
03 DOTACIONES	Dotar mobiliario, equipos, maquinaria, herramientas e implementos de cómputo, tecnología, comunicaciones, audiovisuales, laboratorio, taller, recreación, deporte, cocina y	1	1	\$4,765,439,983

	comedor, recursos bibliotecas, arte, cultura, instrumentos y su mantenimiento.			
	Garantizar el personal de apoyo profesional y técnico en la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; así como el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución del componente.	83	43	\$850,566,909
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar las dotaciones para atender la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación, y sus sedes administrativas.	1	1	\$1,380,000,000
	Pagar Pasivos exigibles			
Total		232	192	\$13,873,799,548

7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

7.1. Meta Plan 91.

Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, En lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

7.1.1. Avances, logros y compromisos

En el marco de la ejecución de la meta (91) Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, a la fecha se han terminado y/o entregado 34 colegios, generando 34.560 cupos para la ciudad: (1) colegio fue terminado Enel primer trimestre del 2024, (11) colegios fueron terminados en el 2023, (11) colegios y sedes de primera infancia fueron terminados/entregados en el año 2022, (7) proyectos más fueron terminados /entregados en la vigencia 2021 y (4) proyectos más fueron terminado en la vigencia 2020.

Es así como, en la vigencia 2024 se proyectó como meta la terminación de 2 proyectos de obra, y se ha logrado la terminación de 1 colegio nuevo: 1. Agudelo Restrepo, el cual beneficia a 1110 niños, niñas y jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar.

Adicionalmente, (1) colegios se encuentran en alistamiento para entrega y puesta en marcha, (8) más están en ejecución, (1) proyectos próximos a iniciar, y (2) en proceso de contratación.

7.1.2. Retrasos y soluciones

A corte del reporte no se presentan retrasos o dificultades en los proyectos de obra que están en ejecución o próximos a iniciar.

7.1.3. Beneficios

En el marco del cumplimiento de la meta plan de desarrollo, Con los colegios terminados y/o entregados a corte 31 de diciembre 2023, se amplió la cobertura en 33.621 cupos nuevos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Fontibón, Tunjuelito, Antonio Nariño, San Cristóbal, Suba, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, y Usme.

Se proyecta que las obras que se encuentran en ejecución beneficiarán a más de 20.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Antonio Nariño, Fontibón, San Cristóbal, Tunjuelito, y Engativá, aportando de esta manera al cierre de brechas de acceso y permanencia en la educación con equidad e igualdad en la ciudad.

7.2 Meta Plan 90:

“Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”

Es necesario precisar, que la nueva meta para el cuatrienio quedó establecida en 124.574 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso, de conformidad con el incremento de 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, aprobado por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018, lo anterior teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2021 la meta 90 inicial, ya se encontraba cumplida al 101.75%.

7.2.1 Avances, logros y compromisos

A 31 de diciembre de 2021 la SED realizó la entrega de 101.749 (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) dispositivos tecnológicos, logrando una ejecución de la meta del 101,75%. Estos dispositivos fueron entregados a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes, a su vez, las entregan a estudiantes vulnerables beneficiados en la focalización de colegios oficiales del Distrito de grados 6º a 11º. Es preciso indicar que la SED adicional a lo anterior, realizó gestiones para recolectar el mayor número de dispositivos tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes más

vulnerables de colegios públicos de la capital. A la fecha se ha realizado la recolección y entrega de 3.706 dispositivos adicionales (Donaton:1057 dispositivos, Grupo de Energía de Bogotá: 2.509 dispositivos y Organización Internacional para las Migraciones: 140 dispositivos) logrando así un total de 105.455 equipos entregados.

Conforme a lo previsto en la planeación del proceso, a 31 de diciembre de 2021 se culminó la respectiva distribución y entrega de los 101.749 dispositivos adquiridos, en instituciones educativas distritales de las localidades, para estudiantes vulnerables focalizados de los grados de sexto a undécimo. Lo anterior implicó realizar las respectivas pruebas técnicas y alistamiento de estos, en razón al proceso de fabricación, transporte y alistamiento de nuevos dispositivos. Estos dispositivos están particularmente orientados a estudiantes de educación secundaria y media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad (según el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT), quienes se priorizan a partir de los criterios de pobreza, ruralidad y pertenencia a poblaciones de especial protección constitucional (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, entre otros).

Es pertinente mencionar que el logro de la meta “100.000 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”, estaba previsto para ser alcanzado a lo largo del cuatrienio, conforme lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del SIGLO XXI”. Sin embargo, la SED adelantó todos los procesos jurídicos, administrativos y contractuales que permitieron cumplir anticipadamente la meta.

En la vigencia 2022, observando que al cierre de 2021 la meta ya se encontraba cumplida con la entrega de los 101.749 dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes a su vez los entregan a los estudiantes focalizados; y que para el 2022 se apropiaron recursos para este propósito; en el primer trimestre, se tramitó ante la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, un incremento de la magnitud del indicador de esta meta el cual fue aprobado, y que se fundamentó en la necesidad de igualar en la vigencia 2021 la meta programada, al logro obtenido de 101.749 , y para la vigencia 2022 incrementarla en 22.825 con el fin de cubrir el déficit de estudiantes de colegios públicos sin computador o tableta en sus hogares; conforme a los resultados de la encuesta de Calidad de vida DANE 2018, por lo que al cierre del trimestre la meta quedo reprogramada en **“124.574 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”**.

Luego de culminar el trámite administrativo y presupuestal interno, con la modificación de la ficha de formulación del proyecto de inversión 7638 Versión 30, que nos permite reportar el cumplimiento como logros de la meta 90 para la actual vigencia; al finalizar el mes de junio, los estudios previos para la adquisición de los dispositivos obtuvieron su aprobación y se radicó el proceso de adquisición de los 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, mediante adhesión al acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, logrando la adjudicación de dos (2) contratos mediante los cuales se adquirieron los 22.825 dispositivos de acceso para la conectividad programados para el 2022; a través de los contratos de compraventa No. 92352 por valor de \$10.847.269.834,00 con NUEVA ERA SOLUCIONES SAS para la compra de 21.738 tabletas digitales y contrato No. 92353 por valor de \$ 979.930.500,00 con SISTETRONICS SAS, para la compra de 1.087 computadores portátiles.

En los primeros días del mes de julio 2022, una vez superada la etapa de constitución y aprobación de garantías, se firmaron las actas de inicio de los contratos de compraventa; a 31 de diciembre, todos los equipos ya habían culminado su etapa de fabricación; el proveedor SISTETRONICS SAS realizó la entrega de 1.087 computadores portátiles a la SED; el otro proveedor, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS argumentó retrasos en los procesos de importación de los otros 21.738 dispositivos derivado de factores de la logística global en puertos de China a Colombia, por lo que fue necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023, y modificar el cronograma de entrega de los equipos, previo inicio de las actividades académicas.

En febrero de 2023, se reinició el contrato No. 92352 con NUEVA ERA SOLUCIONES, y se entregaron todas las 21.738 tabletas digitales en los sitios previamente acordados. En el mes de marzo luego del proceso de pre-alistamiento, bajo la coordinación y asesoría técnica y operativa de la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA en ejecución del contrato No. 4300430, se inició la entrega de los dispositivos digitales a los estudiantes beneficiados.

Por otra parte es importante resaltar las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvieron 1.057 provenientes de la Campaña #DonatónPorLosNiños, 2.509 del Grupo de Energía de Bogotá y 140 de la Organización Internacional para las Migraciones, 1.067 dispositivos del Fondo de Desarrollo Local de suba, 5.212 tabletas por parte de PROBOGOTA y 16 de United Way, para un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero, teniendo en cuenta que estos dispositivos no se habían reportado como logros de esta meta.

A 31 de diciembre de 2023 se reportó un logro acumulado durante la vigencia 2023 de 31.671 dispositivos entregados, para un logro total acumulado de 134.507 dispositivos entregados; que evidencia el cumplimiento de la meta del cuatrienio; por tal razón, no se apropiaron recursos para este propósito en la vigencia 2024.

7.2.2 Beneficios

Las acciones adelantadas en el marco de la ejecución de los contratos para adquirir dispositivos de acceso y equipos portátiles, a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, permitieron de forma determinante contribuir al cierre de las brechas digitales en el Distrito Capital, aspecto asociado directamente a la meta del Plan de Desarrollo Distrital definida como “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables, con la entrega de los dispositivos de acceso y conectividad para contribuir al cierre de brechas digitales”; que, junto con las gestiones adicionales realizadas por la SED, nos permite reportar un logro a la fecha de 134.507 estudiantes vulnerables matriculados en los establecimientos educativos oficiales, beneficiados.

7. CONCLUSIONES

La administración distrital tiene especial preocupación por cerrar las brechas de acceso, permanencia y calidad que actualmente tiene la ciudad entre poblaciones y territorios, con énfasis especial en la zona rural. Así es que uno de los programas planteados por el plan de desarrollo 2020-2024, estuvo orientado a lograr una “Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”.

En consonancia con lo anterior, el Acuerdo 761 de 2020 y el Acuerdo 840 de 2022, estableció como proyecto estratégico la construcción y dotación de infraestructura educativa para el desarrollo de la jornada única, la primera infancia y educación inclusiva, con mejores ambientes de aprendizaje para la educación del siglo XXI, ampliación de la cobertura con énfasis en las localidades más deficitarias, disminución de brecha digital, actualización de la dotación escolar, entre otros.

Conforme a lo anterior, la administración distrital ha venido desarrollando 71 (31 restituciones y 40 colegios nuevos); de estos 34 han sido terminados y/o entregados, generando 33.621 cupos para la ciudad; 1 colegio se encuentra en alistamiento para entrega y puesta en marcha, 9 proyectos se encuentran en ejecución de obra o próximos a iniciar obra, 2 en proceso de contratación, 16 en consultoría con obra contratada (y en distinto avance de consultoría) y 10 en etapa de diseño.

A continuación, se relaciona los colegios terminados / entregados:

Tabla 15 Proyectos terminados y/o entregados Meta 91

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
1	Bosa	Colegio Nuevo	Colegio de la Bici	1.120
2	Kennedy	Restitución	Carlos Arango Vélez	986
3	La Candelaria	Restitución	La Candelaria	440
4	Engativá	Restitución	Tabora	1.545
5	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Sierra Morena - Parque (El Nogal)	1.120
6	Kennedy	Colegio Nuevo	Ciudad Techo I	550
7	Fontibón	Ampliación	Integrado de Fontibón – Sede B	620
8	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde I (Laurel de Cera)	1.040
9	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde II (Parques de Bogotá)	1.040
10	Engativá	Restitución	Laureano Gómez	1.545
11	Tunjuelito	Restitución	Rafael Uribe Uribe	1.480
12	Antonio Nariño	Restitución	Guillermo León Valencia	720
13	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Ángela Restrepo Moreno	1.040
14	San Cristóbal	Colegio Nuevo	Gloria Valencia de Castaño	1.040
15	Bosa	Colegio Nuevo	Esmeralda Arboleda Cadavid	1.560
16	Bosa	Colegio Nuevo	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio	1.040

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
17	Bosa	Colegio Nuevo	Laura Herrera de Varela	1.040
18	Engativá	Colegio Nuevo	Abel Rodríguez Céspedes	1.040
19	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Villas del Progreso - Porvenir VII	225
20	Kennedy	Colegio Nuevo – primera infancia	Gabriel Betancourt Mejía / Villa Mejía Tagaste	225
21	San Cristóbal	Restitución	República del Ecuador	1.105
22	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Bosa Brasilia / Porvenir IV	225
23	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes	180
24	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande	225
25	Engativá	Colegio Nuevo	Lucia Rubio de Laverde - Porvenir	1.040
26	Usme	Colegio Nuevo	Ciudad, Chengdú – predio Bolonia	550
27	Fontibón	Restitución	Villemar el Carmen	800
28	Ciudad Bolívar	Restitución	Arborizadora Alta	2.240
29	Los Mártires	Restitución	San Francisco de Asís	600
30	Suba	Colegio Nuevo	Jaime Niño Diez - Lombardía	520
31	Santa Fe	Restitución	Los Pinos	560
32	Puente Aranda	Restitución	La Merced	1.220
33	Kennedy	Restitución	Teresa Martínez de Varela- La Magdalena	1.680
34	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Agudelo Restrepo – Bonavista	1.110

Así mismo se han intervenido con mejoramientos y atención a emergencias la infraestructura de 704 sedes educativas con 1.155 intervenciones desde la vigencia 2020 a 2024, beneficiando a más de 900.000 estudiantes de las 20 localidades, garantizando así ambientes escolares en los que puedan desarrollar todo su potencial académico, deportivo, artístico y científico.

Adicionalmente en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se desarrollaron actividades de demarcación, dotación con elementos de bioseguridad, y mantenimiento de estos; con estas acciones se garantizaron ambientes de aprendizaje adecuados y que cumplieran con la normatividad para un retorno progresivo gradual y seguro en modalidad de alternancia de los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad educativa.

Es preciso aclarar que, la fluctuación de precios en insumos para las obras de construcción y disponibilidad de mano de obra local sigue generando afectación en los cronogramas de trabajo para la ejecución de las obras, sin embargo, la entidad ha adelantado las acciones técnicas y jurídicas necesarias, con el fin de minimizar el riesgo en el cumplimiento de las metas trazadas para la vigencia y la ejecución presupuestal.

En relación con los dispositivos tecnológicos, las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más

estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvo un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero, teniendo en cuenta que estos dispositivos no se habían reportado como logros de esta meta; y que sumados con los dispositivos que se entregaron hasta el 31 de diciembre de 2023, nos permite totalizar un logro acumulado de 134.507 dispositivos entregados a la fecha, equivalente al 108% sobre el total de 124.574 dispositivos total programado para esta meta durante el cuatrienio.

Por otra parte, durante el primer trimestre 2024, se avanzó con la entrega de las dotaciones contratadas durante la vigencia 2023 y justificadas en la reserva presupuestal, registrando entregas por valor de \$23.399 millones, lo cual nos permite reportar 30 sedes educativas. Paralelamente se realizó la adición y contratación de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión necesarias para la ejecución de los recursos asignados al proyecto. Al finalizar marzo se suscribió un (1) compromiso por \$4.765 millones y se avanzó con las actividades precontractuales de otros 3 procesos por valor de \$22,442 millones, con el fin de cumplir lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones 2024 acorde con los objetivos del proyecto de inversión. Estas acciones permiten reportar un logro acumulado de 726 sedes, durante las vigencias anteriores y lo corrido de la vigencia 2024, lo cual representa un avance acumulado del 94.2% del total programado para el cuatrienio.



LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Gerente de Proyecto

Preparó: Luis Alberto Cantor Bello – Profesional contratista DDE
Sandra Galeano – Profesional contratista DCCEE
María Aydee Jiménez Porras – Profesional contratista DCCEE

Revisó: Alejandro Cáceres Monroy – Director de Dotaciones Escolares
