

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 abril a 30 junio de 2023

PROYECTO 7638 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES
DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Elaborado por:
LUIS ALBERTO CANTOR
MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS
MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
SANDRA PATRICIA GALEANO MENDIVELO

Junio 2023

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.1. <i>Objetivo General.....</i>	4
1.2. <i>Objetivos Específicos</i>	4
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	4
3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO.....	5
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)	5
5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5
5.1. <i>Ejecución Presupuestal Acumulada.....</i>	7
5.2. <i>Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto.....</i>	7
5.3. <i>Ejecución Reservas Presupuestales</i>	9
6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	9
6.1. <i>Objetivo Específico 1.</i>	9
6.1.1. <i>Producto 1</i>	10
6.1.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	10
6.2. <i>Objetivo Específico 2.</i>	18
6.2.1. <i>Producto 2.</i>	18
6.2.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	18
6.3. <i>Objetivo Específico 3</i>	22
6.3.1 <i>Producto 3. Infraestructura educativa dotada</i>	22
6.4. <i>Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto</i>	26
7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.....	28
7.1. <i>Meta Plan 91.....</i>	28
7.2 <i>Meta Plan 90:</i>	30
7. CONCLUSIONES.....	33

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2023	5
Tabla 2. Modificaciones presupuestales primer trimestre	6
Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales	9
Tabla 4. Producto Objetivo 1	10
Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación	11
Tabla 6 Proyectos de primera infancia	12
Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED	13
Tabla 8. Proyectos cofinanciados.....	14
Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas	14
Tabla 10. Productos 2	18
Tabla 11. Intervenciones Consolidadas 2023.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 12.Discriminación de mejoramientos y emergencias recibidos 2023	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 14. Productos	22
Tabla 15. Plan de Adquisiciones segundo trimestre 2023	27
Tabla 16 Proyectos terminados y/o entregados Meta 91.....	33
Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2023	7
Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente	8

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.

1.2. Objetivos Específicos

- Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.
- Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.
- Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Con este proyecto se fortalecerá y dotará la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general, cuenten con espacios educativos dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y el acceso a la educación. El proyecto de desarrolla a través de tres (3) objetivos específicos asociados a:

1. **Construcción y terminación:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de construcción, restitución, y ampliación, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje.
2. **Mejoramiento (conservación):** mediante las acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura se priorizará y desarrollaran intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la necesidad, riesgo y población beneficiada, así como el mejoramiento de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se puedan presentar, garantizando la continuidad del servicio, y en los casos requeridos, la reubicación de la población escolar, en

sedes alternas alquiladas, durante la ejecución de las obras, en atención al principio de programación integral de la inversión, así como el aseguramiento de los bienes inmuebles de la SED. Todo esto bajo el principio de optimización de los recursos destinados para estas actividades.

3. **Dotación:** desde este componente se atenderán las necesidades de colegios y áreas administrativas, de igual forma, se adelantarán acciones orientadas a garantizar las dotación y renovación de los elementos requeridos y necesarios para atender el aumento de cobertura en los distintos niveles de educación, así como la compra y entrega de dispositivos tecnológicos y de conectividad, de los cuales se beneficiarán los estudiantes más vulnerables de la ciudad, aportando así a la disminución de la brecha digital de la comunidad educativa de la ciudad. De otra parte, se garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar las dotaciones adquiridas por la SED.

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

N/A.

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

N/A.

5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

El Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá, inició su ejecución presupuestal el 1 de enero de 2023 con una asignación de \$ 994.900.992.000, distribuidos de la siguiente manera: 01 CONSTRUCCION Y TERMINACIÓN \$ 814.450.683.000, 02 MEJORAMIENTOS \$103.250.564.000 y para el componente de 03 DOTACIONES \$77.199.145.000, como se observa a continuación:

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2023

Componente	Presupuesto inicial 2023	Traslados entre objetos de gasto y/o entre proyectos de inversión	Total, Presupuesto Vigente a junio de 2023
CONSTRUCCION Y TERMINACION	814.450.683.000	-95.937.249.000	718.513.434.000
MEJORAMIENTOS	103.250.564.000	2.819.506.000	106.070.070.000
DOTACIONES	77.199.745.000	8.000.000.000	85.199.745.000
TOTAL	994.900.992.000	-93.117.743.000	909.783.249.000

Frente a modificaciones presupuestales, entre los meses de abril a junio, el proyecto presento diferentes traslados entre componentes así:

En el componente de construcciones se realizó contra créditos por \$ 85.877.743.000, así: i. Se trasladaron recursos por \$760.000.000 millones para el componente de mejoramientos. ii. Se realizó reducción en el presupuesto del Proyecto de inversión 7638-componente de construcción de conformidad con el Decreto 194 del 24 de mayo de 2023 por \$41.880.000.000 millones. iii. Se trasladaron recursos por valor de \$40.832.743.000 millones con destino al proyecto 7736 - “Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C”. de la Dirección de Bienestar Estudiantil; y recursos por valor de \$2.405.000.000 millones para el proyecto de educación superior.

Tabla 2. Modificaciones presupuestales segundo trimestre

Componente	Presupuesto a 31/03/2023	Modificaciones Crédito	Modificaciones Contra crédito	Presupuesto a 30/06/2023
CONSTRUCCION Y TERMINACION	804.391.177.000		85.877.743.000	718.513.434.000
MEJORAMIENTOS	105.310.070.000	760.000.000		106.070.070.000
DOTACIONES	85.199.745.000			85.199.745.000
TOTAL	994.900.992.000	760.000.000	85.877.743.000	909.783.249.000

En cuanto al comportamiento de la ejecución presupuestal del proyecto 7638, a corte de junio 30, se comprometió el 34.1 % del presupuesto vigente, desagregado por componente así:


01 construcción y terminación: el componente de construcciones presenta compromisos por valor de \$220.801.097.139, correspondientes al 30.7 % de la asignación, direccionados a ejecución de obras, adiciones contractuales, contratación de personal de apoyo a la gestión y pago de trámites.

02 mejoramientos: este componente presenta compromisos por valor de \$ 41.344.519.490, correspondientes al 39.0 % de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra e interventoría y al pago de fallos y sentencias.

03 Dotación: Es preciso indicar que la ejecución presupuestal a 30 de junio alcanzó el 56.0%, comprometiendo recursos por valor de \$47.735.516.994, correspondiente a la contratación de prestación de servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión y adquisición de dotaciones.

5.1. Ejecución Presupuestal Acumulada


Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2023

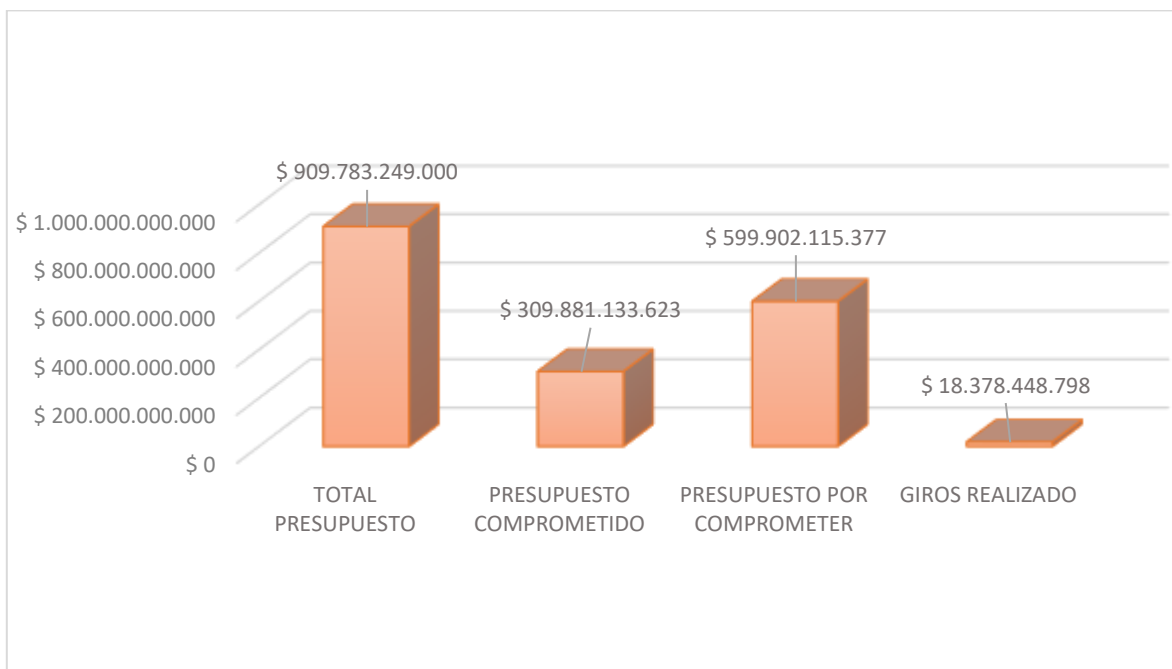

5.2. Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto

Frente a la ejecución presupuestal del proyecto, este se realiza a través de 3 componentes: 01 Construcción y terminación, 02 Mejoramientos y 03 Dotaciones. Los cuales presentan una ejecución al 30 de junio de 2023 del 30.7 %, 39,0 % y 56.0%, respectivamente. Así mismo, se realizaron giros por valor de \$18.378.448.798, como se muestra a continuación:

Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente

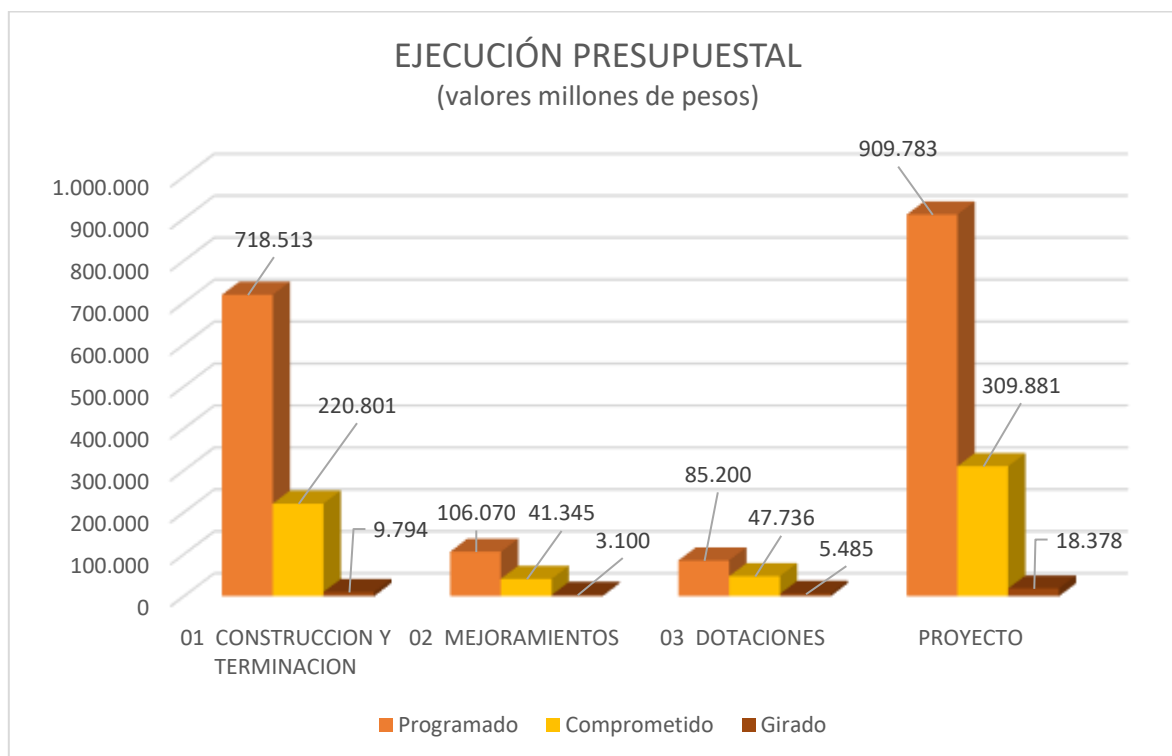

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por componente:

01 construcción y terminación: el componente de construcciones presenta compromisos por valor de \$220.801.097.139, correspondientes al 30.7 % de la asignación, direccionados a: la ejecución de los proyectos Indusel, La Paz, Procables y el contrato interadministrativo para la construcción de los colegios patrimoniales; la adición del contrato de suministros e instalación de avisos para sedes educativas; adiciones al contrato de interventoría del proyecto San Francisco sede B y Bolonia, proyecto de obra e interventoría de Arborizadora Alta y a los convenios interadministrativos de la ERU y ENTERRITORIO 2021. De otra parte, de contrato el monitoreo del talud del Colegio María Cano, por valor de \$201.993.344.740. Así mismo, se comprometieron recursos para el pago de trámites ante Curadurías por valor de \$187.128.748, contratación personal de apoyo a la gestión el valor de \$12.682.294.000 y pago de pasivos exigibles por \$5.938.329.651.

02 mejoramientos: para este componente se comprometieron recursos por valor de \$ 41.344.519.490, correspondiente al 39.0 % de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra de mejoramientos e interventorías por valor de \$37.916.593.025, pago de conexión de servicios públicos por \$2.719.460 y fallos y sentencias judiciales por \$762.114.005; la contratación de la póliza de seguros de bienes inmuebles por \$2.546.193.000 y la celebración de contratos de arrendamientos de inmuebles por \$116.900.000.

03 Dotación: Es preciso indicar que la ejecución presupuestal a 30 de junio alcanzó el 56.0 %, comprometiendo recursos por valor de \$47.735.516.994, entre prestación de servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión por \$3.258.912.804, procesos de adquisición de dotaciones de mobiliario, instrumentos musicales, balanzas, contenedores para residuos sólidos, computadores, e implementos deportivos, por \$39.458.895.963 en cumplimiento de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones, a fin de dar respuesta oportuna a lo plasmado en el proyecto de inversión. Igualmente, se comprometieron \$4.239.747.227 para el pago de pasivos exigibles por concepto de entrega de equipos de tecnología y mobiliario escolar y administrativo; así como \$777.961.000, para coadyuvar en el financiamiento de la adquisición de la póliza todo riesgo daño Material, con el fin de salvaguardar las dotaciones.

5.3. Ejecución Reservas Presupuestales

El proyecto constituyó reservas para la vigencia 2023 por valor de \$370.420.748.020, de las cuales al finalizar el segundo trimestre del año se gestionó el 41,1 % de la reserva constituida, incluidos los saldos liberados, como se muestra a continuación:

Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales

Componente	Reserva Constituida	Anulación Definitiva (Saldos Liberados)	Reserva Definitiva al 30/06/2023	Giros	% Reservas Gestionadas	Saldo por Gestionar 30/06/2023
CONSTRUCCION Y TERMINACION	127,070,030,469	78,110,503	126,991,919,966	65,661,305,471	52%	61,330,614,495
MEJORAMIENTOS	169,571,426,200	0	169,571,426,200	45,061,646,346	27%	124,509,779,854
DOTACIONES	73,779,291,351	141,384	73,779,149,967	41,413,851,045	56%	32,365,298,922
TOTAL	370,420,748,020	78,251,887	370,342,496,133	152,136,802,862	41%	218,205,693,271

6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

6.1. Objetivo Específico 1.

Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.

6.1.1. Producto 1

Infraestructura educativa construida: Para la vigencia 2023, se programó la construcción de seis (6) instituciones educativas. Estos colegios se encuentran ubicados en las localidades Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa y Fontibón.

Tabla 4. Producto Objetivo 1

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa construida	6	3	A 30 de junio, se ha terminado y/o entregado 3 colegios (2 sedes de primera infancia y 1 Colegio nuevo) 1. María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiara a 180 niños y 2. Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande, ampliando la cobertura en 225 cupos, estos ubicados en la localidad de Suba y 3. El Colegio Lucia Rubio de Laverde - Porvenir de la localidad de Engativá que beneficiara a 1040 niños. Es así como en el marco de la ejecución de la meta PDD, Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, se ha avanzado con la terminación de veinticinco (25) colegios. A la fecha el porcentaje acumulado de ejecución de la meta es del 71.42%.

6.1.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.1.2.1. *Meta 1:* Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, en lotes nuevos, intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

La Administración Distrital estableció una meta de entrega de 35 colegios nuevos y restituidos como parte del Plan Distrital de Desarrollo, sin embargo, y atendiendo las necesidades de la ciudad en cuanto a infraestructura educativa y sus apuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial, el avance logrado en gestión predial y contratación y elaboración de diseños, y en consonancia con lo aprobado por el Concejo Distrital, por medio del nuevo cupo de endeudamiento y demás recursos, la Secretaría de Educación Distrital contempla dejar adicionalmente al cumplimiento de la meta, en etapa de diseños con licencia de construcción, contratados o en ejecución de obra, por lo menos otras 35 sedes educativas en las diferentes localidades de la ciudad.

Los colegios que se reportan como terminados, en ejecución o próximos a iniciar corresponden a los proyectos con mayor avance en la planeación y ejecución de obra. En ese sentido, el cumplimiento de la meta de los 35, corresponderá a las 35 sedes educativas que presenten mayor avance al finalizar la respectiva administración y el actual Plan de Desarrollo.

En torno a lo anterior a corte de 30 junio, la entidad ha terminado o entregado 25 colegios, con un porcentaje acumulado de ejecución de la meta PDD es del 71,42 %.

Es así como la Secretaría viene ejecutando 15 proyectos que se encontraban contratados desde la administración anterior, de los cuales a corte de 30 de junio se han terminado 14 colegios y 1 está en ejecución la fase de terminación; dichos colegios se relacionan a continuación y corresponden a intervenciones en modalidad de obra nueva, restitución y/o ampliación:

Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2022	% Avance Junio 2023	Recursos restantes para finalizar su construcción	Estado de la obra
1	Kennedy	Carlos Arango Vélez	Restitución	89,00%	100%	N / A	Terminado
2	Bosa	Colegio de la Bici	Colegio Nuevo	61,00%	100%	N / A	Terminado
3	Engativá	Tabora	Restitución	84,00%	100%	N / A	Terminado
4	La Candelaria	La Candelaria (sede La Concordia)	Terminación	40,00%	100%	N / A	Terminado
5	Bosa	Campo Verde I – Laurel de Cera	Colegio Nuevo	60,00%	100%	N / A	Terminado
6	Bosa	Campo Verde II – Parques de Bogotá	Colegio Nuevo	61,00%	100%	N / A	Terminado
7	Ciudad Bolívar	Sierra Morena – Parque	Colegio Nuevo	63,66%	100%	N / A	Terminado
8	Kennedy	Ciudad de Techo I	Colegio Nuevo	29,00%	100%	N / A	Terminado
9	Fontibón	Integrado de Fontibón (Sede Emma Villegas de Gaitán)	Ampliación	0,60%	100%	N / A	Terminado
10	Tunjuelito	Rafael Uribe Uribe	Restitución	25,00%	100%	N / A	Terminado
11	San Cristóbal	República Del Ecuador	Restitución	28,00%	100%	N / A	Terminado
12	Engativá	Laureano Gómez	Restitución	48,00%	100%	N / A	Terminado
13	Ciudad Bolívar	Sierra Morena - La Curva	Colegio Nuevo	15,50%	100%	N / A	Terminado
14	Antonio Nariño	Guillermo León Valencia	Ampliación	63,00%	100%	N / A	Terminado
15	Usme	Ciudad, Chengdú – predio Bolonia*	Colegio Nuevo	75%	81,60%	N/A	Mayo 2021- Fase I Proceso sancionatorio

*En proceso sancionatorio

Así mismo, la entidad adelanto la terminación de cinco (5) sedes de primera infancia, de las cuales 4 se encuentran en funcionamiento y la 5ª se encuentran en legalización de servicios públicos así:

Tabla 6 Proyectos de primera infancia

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance Junio 2023	Estado de la obra
1 (16)	Bosa	Villas del Progreso Porvenir VII	Colegio Nuevo	100 %	Terminado
2 (17)	Kennedy	Gabriel Betancourt Mejia	Colegio Nuevo	100 %	Terminado
3 (18)	Bosa	Bosa Brasilia Porvenir IV	Colegio Nuevo	97%	Terminado
4 (19)	Suba	María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes Sabana de Tibabuyes Fase II	Colegio Nuevo	100%	Terminado
5 (20)	Suba	Ana Mercedes Hoyos Mejia- Fontana grande Fase II	Colegio Nuevo	100%	Terminado*

*Se adelanta proceso administrativo por presunto incumplimiento, sin embargo, la sede educativa se encuentra en funcionamiento

En la **vigencia de 2020**, se logró la terminación de la construcción de cuatro (4) proyectos: 1. "La Bici" ubicado en la localidad de Bosa, 2. "Carlos Arango Vélez", ubicado en la localidad de Kennedy, 3. Tabora ubicado en la localidad de Engativá y 4. el Colegio denominado La Candelaria ubicado en la localidad Candelaria. Los proyectos se encuentran en trámite de conexiones definitivas de servicios públicos, una vez se culmine esta actividad será suscrita el Acta de entrega a cada rector.

Durante la **vigencia 2021**, la Dirección de construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, terminó la construcción de siete (7) proyectos denominados: 1. "Parques de Bogotá – Campo Verde II" y 2. "Laurel de Cera – Campo Verde I" ubicados en la localidad de Bosa, 3. "Laureano Gómez", ubicado en la localidad de Engativá, el 4. Colegio denominado "El Nogal – Predio Sierra Morena Parque" ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, 5. el colegio "Ciudad de Techo I" ubicado en la localidad de Kennedy, 6. Integrado de Fontibón - Emma Villegas De Gaitán ubicado en la localidad de Fontibón, 7. Rafael Uribe Uribe en la localidad de Tunjuelito; no obstante, algunos de estos proyectos se encuentran en trámite de conexiones definitivas de servicios públicos y con terminación de obras complementarias como se muestra a continuación:

Para la **vigencia 2022**, a corte de 31 de diciembre han sido terminados (8) colegios y (3) sedes de primera infancia: 1. Esmeralda Arboleda Cadavid - La Palestina, 2. Laura Herrera de Varela - Encenillos Niños Jesús, 3. Ciudadela El Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo - Plaza Logística de la localidad de Bosa, 4. Abel Rodríguez Céspedes - Los Cerezos de la Localidad de Engativá con capacidad para 8300 estudiantes, 5, Guillermo León Valencia Localidad Antonio Nariño, con capacidad 720 estudiantes, 6. Angela Restrepo Moreno- Sierra Morena Curva, en la localidad de Ciudad Bolívar que atenderá 1040 estudiantes y 7. Gloria Valencia de Cataño - Santa Teresita con una capacidad de 1.040 cupos en la localidad de San Cristóbal, 8. Villas del Progreso Porvenir VII y 9. Bosa Brasilia Porvenir IV - de la localidad de Bosa, 10. Gabriel Betancourt Mejía – de la localidad de Kennedy, y 11. República del Ecuador – Localidad de San Cristóbal. Es de precisar que los colegios se encuentran en legalización de servicios públicos.

Durante la vigencia 2023, Se han terminado y/o entregado 3 colegios (2 sedes de primera infancia y 1 Colegio nuevo) 1. María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiara a 180 niños y 2. Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande, ampliando la cobertura en 225 cupos, estos ubicados en la localidad de Suba y 3. El Colegio Lucia Rubio de Laverde - Porvenir de la localidad de Engativá que beneficiara a 1040 niños, niñas y jóvenes de la localidad actualmente se encuentra en trámite de legalización de servicios públicos.

De otra parte, la administración avanza con el desarrollo de (23) colegios, de los cuales (14) están siendo ejecutados directamente por la SED, (5) mediante convenio interadministrativo SED-MEN y (4) más se desarrollan a través de contratos interadministrativos con la ERU y ENTERRITORIOS. Los proyectos citados se relacionan a continuación:

Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	% Avance Jun/2023	Estado de la Obra	Fecha estimada de entrega de la obra
(21) 1	Bosa	Laura Herrera de Varela Encenillos (Predio Niño Jesús)	Colegio Nuevo	0,00%	100%	Terminada	Oct-22
(22) 2	Bosa	Esmeralda Arboleda Cadavid - La Palestina	Colegio Nuevo	0,00%	100%	Terminada	Nov-22
(23) 3	San Cristóbal	Gloria Valencia de Cataño- Santa Teresita	Colegio Nuevo	0,00%	100%	Terminada	Oct-22
(24) 4	Fontibón	Villemar El Carmen Sede C*	Restitución	0,00%	93,39%	En ejecución	Oct-23
N/A 5	Usme	Ciudad Chengdu (Predio Bolonia) Fase II	Colegio Nuevo	N/A	89,99%	En ejecución	Sep-23
(25) 6	Ciudad Bolívar	Arborizadora Alta	Restitución	0,00%	81%	En ejecución	Dic-23
(26) 7	Ciudad Bolívar	San Francisco Sede B*	Restitución	N/A	40,96%	En ejecución	Feb-24
(27) 8	Kennedy	Feliza Burstyn - Hipotecho	Colegio Nuevo	N/A	57,94%	En ejecución	Feb-24
(28) 9	Fontibón	Procables	Colegio Nuevo	N/A	23,18%	En ejecución	May-24
(29) 10	Suba	Jaime Niño 10- Lombardía Fase II	Colegio Nuevo	N/A	15,88%	En ejecución	Nov-23
(30) 11	Bosa	Hena Rodríguez Parra -Indusel	Colegio Nuevo	N/A	15,88%	En ejecución	Ago-24
(31) 12	Kennedy	El Ferrol - La Paz	Colegio Nuevo	N/A	16,26%	En ejecución	Ago-24
(32) 13	Santafé	Los Pinos	restitución	N/A	29%	En ejecución	Dic-23
(33) 14	Puente Aranda	La Merced	Restitución	N/A	37,17%	En ejecución	Dic-23

* El contrato se encuentra suspendido

Las fechas estimadas de entrega de los proyectos que se encuentran en etapa de obra han tenido variaciones, producto de imprevistos técnicos y oportuno acceso a materiales, lo cual ha obligado a modificar el cronograma de ejecución de algunos proyectos de obra.

Adicionalmente, a través del convenio interadministrativo con el FFIE se han venido desarrollando cinco (5) nuevos colegios con cofinanciación de la nación por la suma de \$53.912.000.000, para los cuales la SED apropió recursos por valor de \$72.863.405.263,18, para un valor total ejecutado mediante dicho convenio de \$ 126.775.405.264. Ahora bien, de los proyectos enmarcados en este convenio, dos (2) colegios se encuentran terminados en legalización de servicios públicos, dos (2) se encuentran en ejecución y uno (1) está próximo a iniciar obra. Como se muestra a: continuación:

Tabla 8. Proyectos cofinanciados

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	% Avance	Fecha estimada de entrega de la obra
					Jun /2023	
(34) 1	Bosa	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint Malo - Plaza Logística	Colegio Nuevo	0,00%	100 %	Terminado
(35) 2	Engativá	Abel Rodríguez Céspedes - Los Cerezos	Colegio Nuevo	0,00%	100 %	Terminado
(36) 3	Engativá	Lucila Rubio de Laverde - Porvenir	Colegio Nuevo	0,00%	100%	May-23
(37) 4	Ciudad Bolívar	Agudelo Restrepo – Bonavista	Colegio Nuevo	0,00%	39,93%	Feb-24
(38) 5	Santafé	Policarpa Salavarrieta	Restitución	Próximo a iniciar		

De otra parte, en la vigencia 2021, se suscribieron dos (2) contratos interadministrativos con la ERU y ENTERRITORIO los cuales tienen por objeto “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para la ejecución de los proyectos Hacienda Casablanca y Boíta por parte de EN Territorio y San Francisco de Asís y La Magdalena, que serán desarrollados por la ERU.

Los proyectos que gerencia la entidad EN Territorio iniciaron su ejecución en el mes de marzo así: Hacienda Casablanca - 17 de marzo de 2022 y Boíta - 25 de marzo de 2022. En cuanto a los proyectos gerenciados por la ERU, el proyecto La Magdalena inició su ejecución el 23 de mayo de 2022, y frente al proyecto San Francisco de Asís, inició el 8 de junio de 2022.

Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Gerencia	% Avance Junio/ 2023	Estado de la Obra	Fecha estimada de entrega de la obra
(39) 1	Ciudad Bolívar	María Currea Manrique -Hacienda Casablanca	Colegio Nuevo	EN Territorio	57.18 %	En ejecución	May-2024
(40) 2	Kennedy	María Betsabé Espinal – Boíta	Colegio Nuevo	ENTerritorio	27.51%	En ejecución	Jun-2024
(41) 3	Mártires	San Francisco de Asís	Colegio Nuevo	ERU	72.16%	En ejecución	Feb-2024

INFORME DE GESTIÓN ABRIL– JUNIO 2023

Proyecto 7638

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Gerencia	% Avance Junio/ 2023	Estado de la Obra	Fecha estimada de entrega de la obra
(42) 4	Kennedy	Teresa La Magdalena	Colegio Nuevo	ERU	43.08 %	En ejecución	Abr-2024

A corte del periodo, la entidad ha terminado/entregado (25) colegios, (16) proyectos más se encuentran en ejecución, (1) está próximo a iniciar.

Adicionalmente, mediante Acuerdo 840 de junio 13 de 2022, se aprobaron recursos de cupo de endeudamiento para la construcción de 26 nuevas obras adicionales para la ciudad con 19 colegios nuevos/restituídos, 6 colegios para la primera infancia y 1 centro pedagógico, las cuales se encuentran en proceso de estudios y diseños y obtención de licencias.

Así mismo, se adelanta la ejecución de 1 consultoría de estudios y diseños, que no hace parte de los 26 proyectos aprobados en el Acuerdo y 1 más se encuentra en proceso de estructuración de contratación. A continuación, se relacionan los 28 proyectos:

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Estado Consultoría	% Avance Consultoría Junio 2023
(43) 1	Suba	Alfonso Jaramillo	Colegio Nuevo	Suspendido	63,00%
(44) 2	Engativá	Cardenal Luque	Restitución	Suspendido	89,21%
(45) 3	Rafael Uribe Uribe	Alexander Fleming	Restitución	Suspendido	93,81%
(46) 4	Engativá	La Palestina	Restitución	Suspendido	64,00%
(47) 5	Usaquén	General Santander	Restitución	Suspendido	96,00%
(48) 6	Santafé	Altos de Egipto	Colegio Nuevo	Suspendido	75,00%
(49) 7	La Candelaria	Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez	Restitución	Suspendido	64,00%
(50) 8	San Cristóbal	Las Brisas	Nuevo - PI	En ejecución	51%
(51) 9	Usme	La Parroquia	Restitución - PI	En ejecución	81%
(52) 10	Ciudad Bolívar	Madelena	Nuevo - PI	En ejecución	30%
(53) 11	Suba	Fontanar del Rio	Nuevo - PI	En ejecución	64,50%
(54) 12	San Cristóbal	Plazuela Álamos	Nuevo-PI	En ejecución	55%
(55) 13	Suba	Theilard de Chardan	Nuevo - PI	En ejecución	36%
(56) 14	Engativá	Antonio Villavicencio	Restitución	En ejecución	57%
(57) 15	Engativá	Antonio Villavicencio (Cesión)	Colegio Nuevo	En ejecución	57%

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Estado Consultoría	% Avance Consultoría Junio 2023
(58) 16	Bosa	Villas del Progreso (compra)	Colegio Nuevo	En ejecución	18,76%
(59) 17	Suba	Ciudadela Cafam II	Colegio Nuevo	En ejecución	14,98%
(60) 18	Bosa	Villas del Progreso (Cesión)	Colegio Nuevo	En ejecución	17%
(61) 19	Bosa	Porvenir II	Colegio Nuevo	En ejecución	29%
(62) 20	Engativá	Miguel Antonio Caro	Restitución	En ejecución	15%
(63) 21	Ciudad Bolívar	Villas del Diamante	Restitución	En ejecución	15%
(64) 22	Fontibón	Integrado de Fontibón	Restitución	En ejecución	13,75%
(65) 23	Santafé	El Verjon	Restitución	En ejecución	5%
(66) 24	Rafael Uribe Uribe	Liceo Femenino Mercedes Nariño (patrimonial)	Restitución	En ejecución	5%
(67) 25	Bosa	Francisco de Paula Santander (patrimonial)	Restitución	En ejecución	5%
(68) 26	Los Mártires	Agustín Nieto Caballero (patrimonial)	Restitución	En ejecución	5%
(69) 27	Engativá	Porvenir ERU- Ciudadela el Cortijo	Colegio Nuevo	Próxima a iniciar	N/A
(70) 28	Tunjuelito	San Benito Abad	Restitución	En estructuración de la contratación de la Consultoría - SED	

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

Frente a retrasos y dificultades, los siguientes proyectos presentan novedades, la cuales se detallan a continuación:

Para el Colegio San Francisco Sede B, se aprobó la suspensión del contrato de obra CO1.PCCNTR.3137553, el 11 de mayo de 2023, dado que no han sido subsanadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión ha sido necesario prorrogar hasta el 30 de julio de 2023, con nueva fecha de terminación al 23 de septiembre de 2023.

Así mismo, para el caso del Colegio Villemar el Carmen sede C- Gimnasio Académico, el día 12 de junio de 2023 se legalizo la prórroga No.4 a la suspensión No.1 del contrato de obra CO1.PCCNTR.2798219/21, por un término de 30 días calendario, es decir hasta el 12 de julio de 2023. teniendo en cuenta que el Proyecto incluye obras de urbanismo, específicamente el volteadero cuya ejecución, requiere de la intervención de las diferentes empresas de servicios públicos EAAB-ENEL CODENSA-UAESP-VANTI y adicionalmente el Instituto de Desarrollo Urbano, fecha estimada de terminación al 19 de julio de 2023.

Ahora bien, para el Colegio Jaime Niño Diez- Lombardía se evidencia un retraso representativo frente a lo programación aprobada, por lo cual la Entidad adelanta el proceso administrativo por

incumplimiento, a la fecha se han realizado tres audiencias del proceso y se encuentra en la etapa de descargos por parte del Contratista de obra.

De otra parte, los contratos de consultoría de los proyectos: Alfonso Jaramillo, General Santander, Alexander Fleming, Cardenal Luque, Altos de Egipto, La Palestina, se encuentran suspendidos, ya que fueron radicados en debida forma ante las curadurías urbanas para los tramites de licencia de construcción y/o urbanismo, y expedición de las actas de observaciones y/o actos resolutorios, así como el proyecto Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez, por trámites ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

c. Registro Fotográfico

1. Colegio Abel Rodríguez Céspedes (Los Cerezos) – Engativá



- Estudiantes beneficiados: 1.040
- Área Construida: 9.013 M2

2. Colegio María Cristina Salazar - (Sabana Tibabuyes) - Suba



- Estudiantes beneficiados: 180
- Área Construida: 1.497 M2

6.2. Objetivo Específico 2.

Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.

6.2.1. Producto 2.

Para la vigencia 2023 se proyectó la intervención de 282 sedes educativas, de las cuales 173 corresponde a meta rezago de la vigencia 2022 y 109 a la meta establecida para la presente vigencia.

Tabla 10. Productos 2

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa mejorada	282	84	A 30 de junio, se logró la intervención de 84 IED, equivalentes al 48.55 % de la meta rezago de la vigencia 2022. Estas intervenciones beneficiarán la comunidad educativa de las localidades de Suba, Engativá, Usme, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Los Mártires, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Puente Aranda y Fontibón. Se continua con la ejecución de 134 frentes de mejoramiento, de los cuales 13 frentes corresponden al proyecto 2021 y 121 frentes al proyecto 2022. A la fecha se terminó en 100% los contratos del 2021 del grupo 3, 4, 5, 7 y 8 correspondiente a las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda, San Cristóbal y Santa fe. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 8 grupos de mejoramiento 2021 del 98.19% y de mejoramientos 2022 del 25.87%, encontrándose en ejecución 12 contratos de obra y 12 de interventoría. Se ha alcanzado una meta acumulada de 532 sedes educativas con 859 intervenciones desde la vigencia 2020 hasta el 30 de junio de 2023.

6.2.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

- 6.2.2.1. *Meta 2:* Intervenir 730 sedes educativas existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

Desde la vigencia 2020 hasta el 30 de junio de 2023, la entidad ha logrado intervenir 532 sedes educativas, en las cuales se ha ejecutado 859 intervenciones con mejoramientos, con el fin de robustecer las condiciones de las plantas físicas educativas, en cuanto a baterías sanitarias, cubiertas, áreas libres y recreativas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, cerramientos y mejoramiento de ventilación y carpintería metálica.

Ahora bien, en el periodo de abril a junio de 2023, se ha adelantado la siguiente gestión:

Para el mes de abril de 2023 se terminaron en total 45 intervenciones de mejoramiento; de las cuales aportan a la meta 15 intervenciones, distribuidas en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda, Usaquén, Santa fe, San Cristóbal y Sumapaz, de igual forma se continua con la ejecución de obras en 101 frentes de mejoramientos entre 2021 (17 frentes) y 2022 (84 frentes). A la fecha se terminó en 100% los contratos del 2021 del grupo 3, 4, 5, 7 y 8 correspondiente a las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda, San Cristóbal y Santa fe. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 8 grupos de mejoramiento 2021 del 96.91% y de mejoramientos 2022 del 13.66%, encontrándose en ejecución 12 contratos de obra y 12 de interventoría.

Para el mes de mayo de 2023 se terminaron en total 35 intervenciones de mejoramiento de las cuales aportan a la meta 17 intervenciones; distribuidas en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, de igual forma se continua con la ejecución de obras en 113 frentes de mejoramientos entre 2021 (15 frentes) y 2022 (98 frentes). A la fecha se terminó en 100% los contratos del 2021 del grupo 3, 4, 5, 7 y 8 correspondiente a las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda, San Cristóbal y Santa fe. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 8 grupos de mejoramiento.

Para el mes de junio de 2023 se terminaron 20 intervenciones; distribuidas en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Suba, Fontibón y Tunjuelito; de igual forma se continua con la ejecución de 134 frentes de mejoramiento, de los cuales 13 frentes corresponden al proyecto 2021 y 121 frentes al proyecto 2022. A la fecha se terminó en 100% los contratos del 2021 del grupo 3, 4, 5, 7 y 8 correspondiente a las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda, San Cristóbal y Santa fe. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 8 grupos de mejoramiento 2021 del 98.19% y de mejoramientos 2022 del 25.87%, encontrándose en ejecución 12 contratos de obra y 12 de interventoría.

Los mejoramientos relacionados integran actividades propias de reparaciones locativas dentro de las instituciones educativas, intervenciones en los colegios en atención a requerimientos de servicios públicos y atención de emergencias.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

Se acordó con los directivos de las instituciones educativas los planes de contingencia de los frentes de obra que se encuentran en ejecución con el fin de no afectar la operación en los colegios. Sin

embargo, en aquellos planes de contingencia donde se realizan paralelamente actividades de obra y actividades propias de los establecimientos educativos se ha tenido que coordinar horarios de trabajo e ingreso y salida de materiales con el fin de no afectar la presencialidad, lo que ha ocasionado que las actividades demoren más de lo previsto.

Adicionalmente, se espera adelantar el trámite correspondiente de los arrendamientos que se requieren para algunas sedes que se van a intervenir integralmente, a la fecha de corte del presente informe se encuentra en trámite el contrato de arrendamiento para el colegio Rafael Núñez y se firmó el contrato de arrendamiento para el colegio Villa Elisa IED.

Respecto al contrato de obra del grupo 6, se firmó acta de inicio con fecha del 31 de marzo de 2023, sin embargo, no ha habido respuesta satisfactoria por parte del contratista de obra, razón por la cual la interventoría radicó a la SED el informe correspondiente para la apertura del proceso por presunto incumplimiento, el cual se remitió a la Oficina de Contratos mediante radicado I-2023-68328 del 08 de junio de 2023. Con radicado I-2023-68904 del 9 de junio de 2023 se recibieron observaciones al informe y se remite a la interventoría para los ajustes correspondientes con radicado S-2023-207760 del 16 de junio de 2023. La interventoría el 30 de junio de 2023 remitió el informe ajustado a la SED, el cual se encuentra en revisión por parte del área jurídica.

Respecto al contrato de obra del grupo 10, se ha presentado dificultades en la ejecución de las intervenciones en los frentes de obra, por esta razón se radicó a la Oficina de Contratos el informe para presunto incumplimiento, bajo el radicado I-2023-67872 del 08 de junio de 2023.

c. Registro Fotográfico

1. Colegio Manuel Elkin Patarroyo Sede A	
Antes	Después
	



2. Colegio Restrepo Millán Sede A



3. Colegio Isabel II Sede B



6.3. Objetivo Específico 3

Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

6.3.1 Producto 3. Infraestructura educativa dotada

Tabla 11. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa dotada	107	63	Para la vigencia 2023 se programaron (99) sedes educativas, más (8) que corresponden a la reserva presupuestal 2022. A 30 de junio 2023, se suscribieron trece (13) compromisos por \$47.736 millones; y se avanzó con las actividades precontractuales de otros 6 procesos por valor de \$28.848 millones, para la adquisición de las dotaciones prioritarias de equipos e instrumentos para laboratorios de física, química, ciencias naturales, maquinaria y equipos especializados para el fortalecimiento de los ambientes de formación, calculadoras graficadoras, de acuerdo con lo planeado en el PAA en respuesta al proyecto de inversión. Igualmente se continuó con la entrega de las dotaciones contratadas durante la vigencia 2022 registrando entregas por valor de \$41.278 millones. Se reporta un cumplimiento en lo corrido de la vigencia 2023 de sesenta y tres (63) sedes, de las cuales ocho (8) que corresponden a las programadas para el 2023 en ejecución de los recursos de las reservas presupuestales 2022; que corresponde al 58.57% de la meta programada para la vigencia.

Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.3.2.1 Meta 3: Dotar las 770 sedes educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial

a. Avances y/o Logros:

En el cuatrienio, De las 770 sedes programadas para dotar en el cuatrienio, es preciso indicar que al finalizar la vigencia 2020 se obtuvo un logro de 57 sedes dotadas, al cierre de la vigencia 2021 el logro obtenido fue de 237 sedes adicionales dotadas, y al cierre de la vigencia 2022, el logro obtenido fue de 295 sedes dotadas, en lo corrido de la vigencia 2023 se reportan 63 sedes, de las cuales 8 que corresponden a las programadas para el 2023 en ejecución de los recursos de las reservas presupuestales 2022, logrando así la dotación acumulada de 652 sedes, durante las tres vigencias

anteriores y lo corrido de la vigencia 2023, lo cual representa un avance acumulado del 85% del total programado para el cuatrienio.

Es preciso indicar, que las sedes reportadas durante los cinco primeros meses de la vigencia 2023 son aquellas que recibieron dotaciones en lo relacionado con mobiliario escolar y administrativo, instrumentos musicales, material bibliográfico para las bibliotecas escolares, paquetes con útiles escolares, materiales e implementos deportivos, equipos e instrumentos necesarios para los laboratorios de física, química, ciencias naturales y ambientes de formación, equipos de tecnología; al igual que maquinaria y equipos especializados necesarios para el fortalecimiento de los ambientes de formación en las instituciones educativas, balanzas para el pesaje de los residuos generados en las sedes principales de las IED, como parte de la gestión y manejo integral de los desechos peligrosos a cargo de la SED y canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarios ubicadas en las IED entre otras.

Para la adquisición de dotaciones de la vigencia 2023, entre marzo y junio se contrató el grupo de profesionales y técnicos de apoyo que se requieren para asistir las diferentes labores que implican la ejecución de los recursos asignados al proyecto, para lo cual a la fecha se han comprometido recursos por valor de \$3.258.912.804 que corresponden a 29 contratos de prestación de servicios profesionales y 24 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, sobre los cuales se registran giros acumulados por valor de \$1.175.341.374 al finalizar junio.

A 30 de junio de 2023, se realizaron entregas de dotaciones contratadas en la vigencia 2022, justificadas en la reserva presupuestal, alcanzando una ejecución de \$41.413.851.045 equivalente al 56,13% de la reserva definitiva. Paralelamente, luego de haberse contratado los servicios profesionales y de apoyo a la gestión entre enero y junio; se avanzó en las actividades precontractuales para la ejecución de los recursos asignados.

Al finalizar febrero se realizó la adición al CONTRATO DE COMPRAVENTA 101092 DE 2022 suscrito con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS mediante el acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP-2019, para la adquisición de mobiliario escolar y administrativo para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local por valor de \$7.717.504.704; igualmente se adquirieron instrumentos y accesorios musicales para las instituciones educativas distritales, de acuerdo con las necesidades identificadas por valor de \$1.149.705.234 mediante la adición al contrato DE COMPRAVENTA No. 3798306 de 2022 suscrito con CENTRO MUSICAL SAS.

Adicionalmente en marzo, mediante contrato No. 105959 suscrito con la COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, se adquirieron balanzas para el pesaje de los residuos generados en las sedes principales de las instituciones educativas distritales, por valor de \$116.182.570, como parte de la gestión y manejo integral de los desechos peligrosos a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito.

En abril, mediante contrato de compraventa No. 107247 con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. se adquirieron contenedores, puntos ecológicos y canecas para el almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos en el nivel central y local, como parte de la gestión y manejo integral de los desechos a cargo de la SED por valor de \$101.827.110.

En mayo, mediante contrato de compraventa No. 108903 con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. se adquirieron canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarias ubicadas en las instituciones educativas por valor de \$34.653.514, también se suscribieron los contratos de suministro de computadores portátiles y de escritorio No. 109151 y No. 109152 con SISTETRONICS SAS por valor de \$13.508.426.088 y \$14.875.088.536 respectivamente.

En junio, mediante contrato de suministro No. 5068354 con EFFORT COLOMBIA S.A.S. se adquirieron implementos deportivos para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en las instituciones educativas distritales por valor de \$1.955.508.207.

Igualmente, en el mes de mayo, se invirtieron \$778 millones, para coadyuvar en el financiamiento de la adquisición de la póliza Todo Riesgo daño Material, con el fin de salvaguardar las dotaciones, que permitan atender de manera oportuna la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación y sus sedes administrativas.

Asimismo, a junio 30, se han comprometido recursos por valor de \$4.240 millones, para el pago de pasivos exigibles por concepto de entrega de equipos de tecnología con destino a las instituciones educativas distritales y mobiliario escolar y administrativo.

Paralelamente se avanzó con las actividades precontractuales de otros 6 procesos por valor de \$28.848 millones, para la adquisición de las dotaciones prioritarias de equipos e instrumentos para laboratorios de física, química, ciencias naturales, maquinaria y equipos especializados para el fortalecimiento de los ambientes de formación, calculadoras graficadoras como parte de la dotación para fortalecer el programa de bachillerato internacional (PBI) en las IED focalizadas, parques infantiles, material bibliográfico con el fin fortalecer las bibliotecas escolares y material pedagógico, entre otros, con el fin de cumplir lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones, a fin de dar respuesta oportuna a lo plasmado en el proyecto de inversión.

Frente a la meta de ***“Beneficiar a 124.579 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”***, a 31 de diciembre de la vigencia 2021 se realizó la entrega de 101.749 dispositivos tecnológicos equivalente a una ejecución de la meta del 101.75%. Para la vigencia 2022 se programó la entrega de 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, para cumplir con la nueva meta del cuatrienio de 124.574 dispositivos tecnológicos, de conformidad con el incremento de meta aprobado por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018

Los avances y logros en referencia a esta meta corresponden a los siguientes antecedentes:

En el 2022, una vez perfeccionado el acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de la tienda virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente, se logró culminar el proceso de adquisición de los 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, mediante la adjudicación de los contratos No. 92352 por valor de \$10.847.269.834,00 con NUEVA ERA SOLUCIONES SAS para la compra de 21.738 tabletas digitales y contrato No. 92353 por valor de \$ 979.930.500,00 con

SISTETRONICS SAS, para la compra de 1.087 computadores portátiles, los cuales fueron entregados a 31 de diciembre en la SED; el proveedor, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS argumentó retrasos en los procesos de importación de los otros 21.738 dispositivos derivado de factores de la logística global en puertos, por lo que fue necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023, y modificar el cronograma de entrega de los equipos a partir de febrero de 2023. Paralelamente en diciembre de 2022 se suscribió el CONVENIO DE ASOCIACION No. 4300430 con la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA, quien previo inicio de las actividades académicas 2023, realiza el apoyo profesional y técnico en el proceso de coordinación logística para las entregas a los estudiantes beneficiados.

En febrero de 2023, se reinició el contrato No. 92352 con NUEVA ERA SOLUCIONES, y se entregaron todas las 21.738 tabletas digitales en los sitios previamente acordados. En el mes de marzo luego del proceso de prelistamiento, bajo la coordinación y asesoría técnica y operativa de la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA, se inició la entrega de los dispositivos digitales a los estudiantes beneficiado, según cronograma aprobado.

En este mismo sentido es importante resaltar las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvieron 1.057 provenientes de la Campaña #DonatónPorLosNiños, 2.509 del Grupo de Energía de Bogotá y 140 de la Organización Internacional para las Migraciones, 1.067 dispositivos del Fondo de Desarrollo Local de suba, 5.212 tabletas por parte de PROBOGOTA y 16 de United Way, para un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero.

A 30 de junio de 2023 se reporta un logro acumulado durante la vigencia 2023 de 30.598 dispositivos entregados, para un total acumulado de 133.434 dispositivos entregados a la fecha.

Con estas acciones, se evidencia el cumplimiento anticipado de la meta del cuatrienio y se enfatiza en las gestiones realizadas para el incremento de esta meta con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018, lo que se constituye en un hito en la ciudad y en el país, puesto que en los últimos 30 años la Secretaría de Educación había entregado sólo 89 mil dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

Durante el segundo trimestre de 2023, no se presentaron retrasos considerables, solo los imprevistos propios que surgen en la estructuración de este tipo de contratos que se solucionan con oportunas gestiones administrativas por parte de las diferentes áreas responsables en la SED.

Es pertinente mencionar que la planificación y entrega de dotaciones a las instituciones educativas están supeditadas, en parte, a los avances e imprevistos propios de las obras de infraestructura, por lo cual se modifican los cronogramas de entregas en caso de que se requiera o se reciben las dotaciones en el término de ejecución de los contratos y se almacenan los bienes dotacionales. Así

mismo, una sede educativa se va dotando en el transcurso de cada vigencia a través de diferentes contratos, estos aspectos inciden en la oportunidad del reporte de avance de la meta anual, el cual se realiza cuando las entregas de dotaciones concertadas se encuentren en un estado avanzado y se han dotado con más de una familia de elementos.

c. Registro Fotográfico



6.4. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto

El plan de adquisiciones del proyecto 7638 programó 47 ítems para el segundo trimestre de la vigencia, y se ejecutaron 37 ítems. La ejecución del PAA por componente se dio de la siguiente manera:

01 Construcción: en el PAA se habían programado 26 ítems que corresponden a procesos de obra e interventorías, modificaciones contractuales y contratos de apoyo a la gestión, de los cuales fueron ejecutados 21.

02 Mejoramientos: Para el componente de mejoramientos en el segundo trimestre del 2023 se programaron 6 ítems en el PAA, de los cuales se comprometieron 4 ítems. Los ítems pendientes por comprometer están asociados a la adjudicación de los contratos de obra e interventoría de mejoramientos de la vigencia 2023.

03 Dotaciones: En el segundo trimestre de la vigencia 2023 fueron programados 15 ítems y en el PAA, siendo ejecutados 12 ítems. De los ítems ejecutados 5 corresponden a prórrogas a contratos en ejecución para adquisición de dotaciones, otros 5 ítems se ejecutaron para la adquisición de nuevas dotaciones, 1 ítem, corresponden a un contrato de prestación de servicios profesionales y 1 ítem para la adquisición de la póliza de seguros Todo riesgo Daño Material.

Los ítems contratados por adquisiciones contenedores, puntos ecológicos y canecas para el almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos en el nivel central y local, como parte de la gestión y manejo integral de los desechos a cargo de la SED, canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarios ubicadas en las IED, computadores portátiles y de escritorio e implementos deportivos para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en las IED.

A 30 de junio, se habían adjudicado dos procesos que corresponden a los Ítems 258 para la adquisición de maquinaria y equipos especializados y el ítem 172 para la adquisición de equipos de tecnología, los dos se encontraban en elaboración y firma de minutas para ser registrados los primeros días de julio.

Tabla 12. Plan de Adquisiciones segundo trimestre 2023

COMPONENTE	OBJETO DE GASTO	N.º DE	N.º DE	VALOR EJECUTADO
		CONTRATOS PROGRAMADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	
01 CONSTRUCCION Y TERMINACION	Compra de lotes, diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa nuevas y existentes en modalidades de: colegio nuevo, restitución, terminación o ampliación y/o adicionales	12	7*	\$ 38.503.710.570
	Suministrar el personal de apoyo profesional y técnico para garantizar la adecuada ejecución del proyecto	14	14	\$ 846.658.000
02 MEJORAMIENTOS	Adelantar diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento menor complementarias a la infraestructura de los colegios distritales y/o adicionales	4	2**	\$ 68.722.500

INFORME DE GESTIÓN ABRIL– JUNIO 2023

Proyecto 7638

COMPONENTE	OBJETO DE GASTO	N.º DE	N.º DE	VALOR EJECUTADO
		CONTRATOS PROGRAMADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar los inmuebles de propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito, bajo su responsabilidad, tenencia, control y/o custodia.	1	1	\$ 2.546.193.000
	Pago de arrendamientos de bienes inmuebles, para garantizar el derecho a la educación, durante la ejecución de obras	1	1	\$ 116.900.000
03 DOTACIONES	Dotar mobiliario, equipos, maquinaria, herramientas e implementos de cómputo, tecnología, comunicaciones, audiovisuales, laboratorio, taller, recreación, deporte, cocina y comedor, recursos bibliotecas, arte, cultura, instrumentos y su mantenimiento.	13****	10*****	\$ 30.475.503.455
	Garantizar el personal de apoyo profesional y técnico en la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; así como el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución del componente.	1	1	\$ 22.274.000
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar las dotaciones para atender la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación, y sus sedes administrativas.	1	1	\$ 777.961.000
Total		47	37	\$ 73.357.922.525

*En este objeto de gasto quedo pendiente por comprometer 5 ítems los cuales se encuentran publicados en proyecto de pliegos

** Se encuentran dos ítems por comprometer los cuales están en proceso de adjudicación

****Se programaron 13 ítems de los cuales 5 corresponden a prórrogas a contratos de ejecución que fueron suscritas conforme a lo programado.

*****A 30 de junio quedaron 2 ítems por comprometer, que se encontraban en elaboración de minutas y que serán registrados los primeros días de julio:

Ítem 258 Adquisición de maquinaria y equipos especializados, e ítem 172 Adquisición de equipos de tecnología.

7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

7.1. Meta Plan 91.

Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, En lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

7.1.1. Avances, logros y compromisos

En el marco de la ejecución de la meta (91) Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, a la fecha se han terminado 25 colegios, de los cuales en el 2020 se terminaron/entregaron (4) colegios; (7)

proyectos más fueron terminados /entregados en la vigencia 2021 ; (11) colegios y sedes de primera infancia fueron terminados/entregados en el año 2022, y en la presente vigencia se han terminado 2 sedes de primera infancia y 1 colegio; para una ejecución acumulada de la meta plan de desarrollo del 71.42%.

Es así como, en la vigencia 2023 se proyectó como meta la terminación de 6 proyectos de obra, de las cuales, a corte de 30 de junio de 2023, se ha terminado y/o entregado 3 colegios (2 sedes de primera infancia y 1 Colegio nuevo) 1. María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiara a 180 niños y 2. Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande, ampliando la cobertura en 225 cupos, estos ubicados en la localidad de Suba y 3. El Colegio Lucia Rubio de Laverde - Porvenir de la localidad de Engativá que beneficiara a 1040 niños.

7.1.2. Retrasos y soluciones

Frente a retrasos y dificultades, los siguientes proyectos presentan novedades:

Para el Colegio San Francisco Sede B, se aprobó la suspensión del contrato de obra CO1.PCCNTR.3137553, el 11 de mayo de 2023, dado que no han sido subsanadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión ha sido necesario prorrogar hasta el 30 de julio de 2023, con nueva fecha de terminación al 23 de septiembre de 2023.

Así mismo, para el caso del Colegio Villemar el Carmen sede C- Gimnasio Académico, el día 12 de junio de 2023 se legalizo la prórroga No.4 a la suspensión No.1 del contrato de obra CO1.PCCNTR.2798219/21, por un término de 30 días calendario, es decir hasta el 12 de julio de 2023. teniendo en cuenta que el Proyecto incluye obras de urbanismo, específicamente el volteadero cuya ejecución, requiere de la intervención de las diferentes empresas de servicios públicos EAAB-ENEL CODENSA-UAESP-VANTI y adicionalmente el Instituto de Desarrollo Urbano, fecha estimada de terminación al 19 de julio de 2023.

Ahora bien, para el Colegio Jaime Niño Diez- Lombardía se evidencia un retraso representativo frente a lo programación aprobada, por lo cual la Entidad adelanta el proceso administrativo por incumplimiento, a la fecha se han realizado tres audiencias del proceso y se encuentra en la etapa de descargos por parte del Contratista de obra.

De otra parte, los contratos de consultoría de los proyectos: Alfonso Jaramillo, General Santander, Alexander Fleming, Cardenal Luque, Altos de Egipto, La Palestina, se encuentran suspendidos, ya que fueron radicados en debida forma ante las curadurías urbanas para los tramites de licencia de construcción y/o urbanismo, y expedición de las actas de observaciones y/o actos resolutorios, así como el proyecto Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez, por trámites ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

7.1.3. Beneficios

En el marco del cumplimiento de la meta plan de desarrollo, Con los colegios terminados y/o entregados a corte 30 de junio 2023, se amplió la cobertura en 23.490 cupos nuevos en las

localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Fontibón, Tunjuelito, Antonio Nariño, San Cristóbal y Suba

Se proyecta que las obras que se encuentran en ejecución beneficiarán a más de 22.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Antonio Nariño, Fontibón, San Cristóbal, Tunjuelito, y Engativá, aportando de esta manera al cierre de brechas de acceso y permanencia en la educación con equidad e igualdad en la ciudad.

7.2 Meta Plan 90:

“Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”

Es necesario precisar, que la nueva meta para el cuatrienio quedó establecida en 124.574 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso, de conformidad con el incremento de 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, aprobado por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018, lo anterior teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2021 la meta 90 inicial, ya se encontraba cumplida al 101.75%.

7.2.1 Avances, logros y compromisos

A 31 de diciembre de 2021 la SED realizó la entrega de 101.749 (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) dispositivos tecnológicos, logrando una ejecución de la meta del 101,75%. Estos dispositivos fueron entregados a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes, a su vez, las entregan a estudiantes vulnerables beneficiados en la focalización de colegios oficiales del Distrito de grados 6º a 11º. Es preciso indicar que la SED adicional a lo anterior, realizó gestiones para recolectar el mayor número de dispositivos tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. A la fecha se ha realizado la recolección y entrega de 3.706 dispositivos adicionales (Donaton:1057 dispositivos, Grupo de Energía de Bogotá: 2.509 dispositivos y Organización Internacional para las Migraciones: 140 dispositivos) logrando así un total de 105.455 equipos entregados.

Conforme a lo previsto en la planeación del proceso, a 31 de diciembre de 2021 se culminó la respectiva distribución y entrega de los 101.749 dispositivos adquiridos, en instituciones educativas distritales de las localidades, para estudiantes vulnerables focalizados de los grados de sexto a undécimo. Lo anterior implicó realizar las respectivas pruebas técnicas y alistamiento de los mismos, en razón al proceso de fabricación, transporte y alistamiento de nuevos dispositivos. Estos dispositivos están particularmente orientados a estudiantes de educación secundaria y media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad (según el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT), quienes se priorizan a partir de los criterios de pobreza, ruralidad y pertenencia a poblaciones de especial protección constitucional (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, entre otros).

Es pertinente mencionar que el logro de la meta “100.000 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”, estaba previsto para ser alcanzado a lo largo del cuatrienio, conforme lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del SIGLO XXI”. Sin embargo, la SED adelantó todos los procesos jurídicos, administrativos y contractuales que permitieron cumplir anticipadamente la meta en el segundo semestre de 2021.

En la vigencia 2022, observando que al cierre de 2021 la meta ya se encontraba cumplida con la entrega de los 101.749 dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes a su vez los entregan a los estudiantes focalizados; y que para el 2022 se apropiaron recursos para este propósito; en el primer trimestre, se tramitó ante la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, un incremento de la magnitud del indicador de esta meta el cual fue aprobado, y que se fundamentó en la necesidad de igualar en la vigencia 2021 la meta programada, al logro obtenido de 101.749 , y para la vigencia 2022 incrementarla en 22.825 con el fin de cubrir el déficit de estudiantes de colegios públicos sin computador o tableta en sus hogares; conforme a los resultados de la encuesta de Calidad de vida DANE 2018, por lo que al cierre del trimestre la meta quedo reprogramada en **“124.574 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”**.

Luego de culminar el trámite administrativo y presupuestal interno, con la modificación de la ficha de formulación del proyecto de inversión 7638 Versión 30, que nos permite reportar el cumplimiento como logros de la meta 90 para la actual vigencia; al finalizar el mes de junio, los estudios previos para la adquisición de los dispositivos obtuvieron su aprobación y se radicó el proceso de adquisición de los 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, mediante adhesión al acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, logrando la adjudicación de dos (2) contratos mediante los cuales se adquirieron los 22.825 dispositivos de acceso para la conectividad programados para el 2022; a través de los contratos de compraventa No. 92352 por valor de \$10.847.269.834,00 con NUEVA ERA SOLUCIONES SAS para la compra de 21.738 tabletas digitales y contrato No. 92353 por valor de \$ 979.930.500,00 con SISTETRONICS SAS, para la compra de 1.087 computadores portátiles.

En los primeros días del mes de julio 2022, una vez superada la etapa de constitución y aprobación de garantías, se firmaron las actas de inicio de los contratos de compraventa; a 31 de diciembre, todos los equipos ya habían culminado su etapa de fabricación; el proveedor SISTETRONICS SAS realizó la entrega de 1.087 computadores portátiles a la SED; el otro proveedor, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS argumentó retrasos en los procesos de importación de los otros 21.738 dispositivos derivado de factores de la logística global en puertos de China a Colombia, por lo que fue necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023, y modificar el cronograma de entrega de los equipos, previo inicio de las actividades académicas.

En febrero de 2023, se reinició el contrato No. 92352 con NUEVA ERA SOLUCIONES, y se entregaron todas las 21.738 tabletas digitales en los sitios previamente acordados. En el mes de marzo luego del proceso de prelistamiento, bajo la coordinación y asesoría técnica y operativa de la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA en ejecución del contrato No. 4300430, se inició la entrega de los dispositivos digitales a los estudiantes beneficiados.

Por otra parte es importante resaltar las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvieron 1.057 provenientes de la Campaña #DonatónPorLosNiños, 2.509 del Grupo de Energía de Bogotá y 140 de la Organización Internacional para las Migraciones, 1.067 dispositivos del Fondo de Desarrollo Local de suba, 5.212 tabletas por parte de PROBOGOTA y 16 de United Way, para un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero, teniendo en cuenta que estos dispositivos no se habían reportado como logros de esta meta.

Al finalizar el mes de junio, se reporta un logro de 30.598 dispositivos entregados en la vigencia 2023, entre los que se incluyen los 10.001 dispositivos correspondientes a las gestiones adicionales realizadas y que sumados a los reportes anteriores nos totaliza un acumulado de 133.434 dispositivos entregados a 30 de junio 2023, equivalente al 107% sobre el total de 124.574 dispositivos total programado para esta meta durante el cuatrienio.

7.2.2 Retrasos y soluciones

En la vigencia 2021, Los dispositivos superaron su etapa de fabricación, con algunos retrasos generados por las dinámicas mundiales con relación a la pandemia del COVID 19, asociados al desabastecimiento de partes tecnológicas, sin embargo, ya superados estos imprevistos, y una vez nacionalizado el ultimo lote de dispositivos se dio celeridad al cumplimiento de la totalidad de las entregas, durante el segundo semestre de la vigencia.

Para la vigencia 2022 uno de los retrasos correspondió al perfeccionamiento del nuevo del acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y a las gestiones interinstitucionales para el incremento en la meta plan, para posteriormente reflejar los logros por esta meta sectorial.

Igualmente a 31 de diciembre de 2022, el contratista NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, quien ejecuta el contrato No. 92352 de 2022, argumentó retrasos en los procesos de importación y llegada de 21.738 dispositivos a Colombia, derivado de factores de logística global de mercado y embarque en puertos que les impidió cumplir con el cronograma de entrega de los equipos a la SED, siendo necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023, y modificar el cronograma de entrega de los equipos a partir de febrero de 2023. En febrero de 2023, se reinició el contrato y se entregó la totalidad de los dispositivos digitales en los sitios previamente acordados, a la fecha se está culminando la entrega de los dispositivos a los estudiantes beneficiados, según el cronograma aprobado.

7.2.3 Beneficios

Las acciones que se han adelantado en el marco de la ejecución de los contratos para adquirir dispositivos de acceso y equipos portátiles, a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, permitirán avanzar de forma determinante en la contribución al cierre

de brechas digitales en el Distrito Capital, aspecto asociado directamente a la meta del Plan de Desarrollo Distrital definida como “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables. Con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad para contribuir al cierre de brechas digitales”; que, junto con las gestiones adicionales realizadas por la SED, nos permite beneficiar a la fecha a 133.434 estudiantes vulnerables matriculados en los establecimientos educativos oficiales.

7. CONCLUSIONES

La presente administración distrital tiene especial preocupación por cerrar las brechas de acceso, permanencia y calidad que actualmente tiene la ciudad entre poblaciones y territorios, con énfasis especial en la zona rural. Así, uno de los programas planteados está orientado a lograr una “Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. En consonancia con lo anterior, el Acuerdo 761 de 2020 y el Acuerdo 840 de 2022, ponen como proyecto estratégico la construcción y dotación de infraestructura educativa para el desarrollo de la jornada única, la primera infancia y educación inclusiva, con mejores ambientes de aprendizaje para la educación del siglo XXI, ampliación de la cobertura con énfasis en las localidades más deficitarias, disminución de brecha digital, actualización de la dotación escolar, entre otros.

Conforme con lo anterior en materia de infraestructura, la ciudad cuenta con 25 colegios terminados y/o entregados, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 13 Proyectos terminados y/o entregados Meta 91

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
1	Bosa	Colegio Nuevo	Colegio de la Bici	1.120
2	Kennedy	Restitución	Carlos Arango Vélez	986
3	La Candelaria	Restitución	La Candelaria	440
4	Engativá	Restitución	Tabora	1.545
5	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Sierra Morena - Parque (El Nogal)	1.120
6	Kennedy	Colegio Nuevo	Ciudad Techo I	550
7	Fontibón	Ampliación	Integrado de Fontibón – Sede B	620
8	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde I (Laurel de Cera)	1.040
9	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde II (Parques de Bogotá)	1.040
10	Engativá	Restitución	Laureano Gómez	1.545
11	Tunjuelito	Restitución	Rafael Uribe Uribe	1.480
12	Antonio Nariño	Restitución	Guillermo León Valencia	720
13	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Ángela Restrepo Moreno	1.040
14	San Cristóbal	Colegio Nuevo	Gloria Valencia de Castaño	1.040
15	Bosa	Colegio Nuevo	Esmeralda Arboleda Cadavid	1.560

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
16	Bosa	Colegio Nuevo	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio	1.040
17	Bosa	Colegio Nuevo	Laura Herrera de Varela	1.040
18	Engativá	Colegio Nuevo	Abel Rodríguez Céspedes	1.040
19	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Villas del Progreso - Porvenir VII	225
20	Kennedy	Colegio Nuevo – primera infancia	Gabriel Betancourt Mejía / Villa Mejía Tagaste	225
21	San Cristóbal	Restitución	República del Ecuador	1.105
22	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Bosa Brasilia / Porvenir IV	225
23	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes	180
24	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande	225
25	Engativá	Colegio Nuevo	Lucía Rubio de Laverde - Porvenir	1.040

Así mismo se han intervenido con mejoramientos y atención a emergencias la infraestructura de 532 sedes educativas con 859 intervenciones desde la vigencia 2020 a 2023, beneficiando a más de 500.000 estudiantes de las 20 localidades, garantizando así ambientes escolares en los que puedan desarrollar todo su potencial académico, deportivo, artístico y científico.


Adicionalmente en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se desarrollaron actividades de demarcación, dotación con elementos de bioseguridad, y mantenimiento de estos; con estas acciones se garantizaron ambientes de aprendizaje adecuados y que cumplieran con la normatividad para un retorno progresivo gradual y seguro en modalidad de alternancia de los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad educativa.

Es preciso aclarar que, la fluctuación de precios en insumos para las obras de construcción y disponibilidad de mano de obra local sigue generando afectación en los cronogramas de trabajo para la ejecución de las obras, sin embargo, la entidad ha adelantado las acciones técnicas y jurídicas necesarias, con el fin de minimizar el riesgo en el cumplimiento de las metas trazadas para la vigencia y la ejecución presupuestal.

En relación con los dispositivos tecnológicos, las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvo un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero, teniendo en cuenta que estos dispositivos no se habían reportado como logros de esta meta; y que sumados con los dispositivos que se entregaron hasta el 30 de junio de 2023, nos permite totalizar un logro acumulado de 133.434 dispositivos entregados a la fecha, equivalente al 107% sobre el total de 124.574 dispositivos total programado para esta meta durante el cuatrienio.

Por otra parte, durante el segundo trimestre 2023, se avanzó con la entrega de las dotaciones contratadas durante la vigencia 2022 registrando entregas acumuladas por valor de \$41.278 millones, paralelamente en ejecución de los recursos de la vigencia 2023 al finalizar junio, se habían

suscrito trece (13) compromisos por valor de \$47.736 millones, lo cual nos permite reportar 63 sedes dotadas en la actual vigencia, precisando que 8 sedes corresponden a las programadas para el 2023 en ejecución de los recursos de las reservas presupuestales 2022, logrando así la dotación acumulada a la fecha de 652 sedes, durante las tres vigencias anteriores y lo corrido de la vigencia 2023, equivalente a un avance acumulado del 85% del total programado para el cuatrienio.



LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Gerente de Proyecto

Preparó: Luis Alberto Cantor Bello – Profesional DDE
Sandra Galeano - Profesional DCCEE
María Aydee Jiménez Porras – Profesional DCCEE

Revisó: Liliana Díaz Poveda - Directora de Dotaciones
Andrea Lorena Beracasa Villarraga – Asesora SAP
