

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 octubre a 31 diciembre de 2023

PROYECTO 7638 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES
DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Elaborado por:
LUIS ALBERTO CANTOR
MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS
MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
SANDRA PATRICIA GALEANO MENDIVELO

Diciembre 2023

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.1. <i>Objetivo General</i>	4
1.2. <i>Objetivos Específicos</i>	4
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	4
3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	5
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT).....	5
5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA.....	5
5.1. <i>Ejecución Presupuestal Acumulada</i>	7
5.2. <i>Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto</i>	7
5.3. <i>Ejecución Reservas Presupuestales</i>	9
6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	10
6.1. <i>Objetivo Específico 1.</i>	10
6.1.1. <i>Producto 1</i>	10
6.1.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	11
6.2. <i>Objetivo Específico 2.</i>	19
6.2.1. <i>Producto 2.</i>	19
6.2.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	20
6.3. <i>Objetivo Específico 3</i>	32
6.3.1 <i>Producto 3. Infraestructura educativa dotada</i>	33
6.4. <i>Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto</i>	38
7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.....	40
7.1. <i>Meta Plan 91.</i>	40
7.2. <i>Meta Plan 90:</i>	41
7. CONCLUSIONES	43

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2023	5
Tabla 2. Modificaciones presupuestales cuarto trimestre	6
Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales	9
Tabla 4. Producto Objetivo 1	10
Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación	12
Tabla 6 Proyectos de primera infancia	13
Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED	14
Tabla 8. Proyectos cofinanciados.....	15
Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas	16
Tabla 10 Proyectos adicionales Acuerdo 840	16
Tabla 11. Productos Objetivo 2.....	19
Tabla 12 Discriminación de mejoramientos recibidos 2023	23
Tabla 13. Productos Objetivo 3.....	33
Tabla 14. Plan de Adquisiciones tercer trimestre 2023	39
Tabla 15 Proyectos terminados y/o entregados Meta 91.....	44
Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2023	7
Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente	8

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.

1.2. Objetivos Específicos

- Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.
- Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.
- Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Con este proyecto se fortalecerá y dotará la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general, cuenten con espacios educativos dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y el acceso a la educación. El proyecto desarrolla a través de tres (3) objetivos específicos asociados a:

1. **Construcción y terminación:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de construcción, restitución, y ampliación, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje.
2. **Mejoramiento (conservación):** mediante las acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura se priorizará y desarrollaran intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la necesidad, riesgo y población beneficiada, así como el mejoramiento de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se puedan presentar, garantizando la continuidad del servicio, y en los casos requeridos, la reubicación de la población escolar, en sedes alternas alquiladas, durante la ejecución de las obras, en atención al principio de

programación integral de la inversión, así como el aseguramiento de los bienes inmuebles de la SED. Todo esto bajo el principio de optimización de los recursos destinados para estas actividades.

3. **Dotación:** desde este componente se atenderán las necesidades de colegios y áreas administrativas, de igual forma, se adelantarán acciones orientadas a garantizar las dotación y renovación de los elementos requeridos y necesarios para atender el aumento de cobertura en los distintos niveles de educación, así como la compra y entrega de dispositivos tecnológicos y de conectividad, de los cuales se beneficiarán los estudiantes más vulnerables de la ciudad, aportando así a la disminución de la brecha digital de la comunidad educativa de la ciudad. De otra parte, se garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar las dotaciones adquiridas por la SED.

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

N/A.

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

N/A.

5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

El Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá, inició su ejecución presupuestal el 1 de enero de 2023 con una asignación de \$ 994.900.992.000, distribuidos de la siguiente manera: 01 CONSTRUCCION Y TERMINACIÓN \$ 814.450.683.000, 02 MEJORAMIENTOS \$103.250.564.000 y para el componente de 03 DOTACIONES \$77.199.745.000, como se observa a continuación:

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2023

Componente	Presupuesto inicial 2023	Traslados entre objetos de gasto y/o entre proyectos de inversión	Total, Presupuesto Vigente a diciembre de 2023
CONSTRUCCION Y TERMINACION	814,450,683,000	-316,361,826,071	498,088,856,929
MEJORAMIENTOS	103,250,564,000	37,377,349,217	140,627,913,217
DOTACIONES	77,199,745,000	27,455,434,854	104,655,179,854
TOTAL	994,900,992,000	-251,529,042,000	743,371,950,000

Frente a modificaciones presupuestales, entre los meses de octubre a diciembre, el proyecto presento diferentes traslados entre componentes y proyectos de inversión así:

En el componente de construcciones se realizó contra créditos por \$ -41,047,478,923, así: la Secretaria de Hacienda del Distrito, realizó traslado por \$13.000.000.000, mediante Resolución No 4243 del 6 de diciembre de 2023, los cuales fueron trasladados al proyecto 7736 “Fortalecimiento del Bienestar de los Estudiantes Matriculados en el Sistema Educativo Oficial a través del Fomento de Estilos de Vida Saludable, Alimentación y Movilidad Escolares en Bogotá D.C.”; de otra parte se realizó traslado entre objetos de gasto por valor de \$15.381.235.135, para los componentes de mejoramientos y dotaciones escolares; así mismo, se trasladó recursos por \$2.814.000.000 conforme a lo establecido en la Resolución No 4201 del 29 de noviembre de 2023; recursos por \$9.254.944.778 direccionados para los componentes de mejoramientos y dotaciones y finalmente se realizó una reducción de acuerdo a concepto favorable SDP 1-2023-83227 y Decreto 641 de 29 de 2023 diciembre por valor de \$597.299.000.

Frente al componentes de mejoramientos se realizó un contra crédito por \$6.022.883.203, recursos orientados para el componente de construcción/terminación y dotaciones escolares.

Tabla 2. Modificaciones presupuestales cuarto trimestre

Componente	Presupuesto a 30/09/2023	Modificaciones Contra crédito	Modificaciones Crédito	Presupuesto a 31/12/2023
CONSTRUCCION Y TERMINACION	538,206,507,861	-41,047,478,923	929,827,991	498,088,856,929
MEJORAMIENTOS	134,048,435,468	-6,022,883,203	12,602,360,952	140,627,913,217
DOTACIONES	87,528,305,671		17,126,874,183	104,655,179,854
TOTAL	759,783,249,000	-47,070,362,126	30,659,063,126	743,371,950,000

En cuanto al comportamiento de la ejecución presupuestal del proyecto 7638, a corte de diciembre 31, se comprometió el 100 % del presupuesto vigente, desagregado por componente así:


01 construcción y terminación: el componente de construcciones presenta compromisos por valor de \$498.041.563.595, correspondientes al 100 % de la asignación, direccionados a ejecución de obras, adiciones contractuales, compra de predios, contratación de personal de apoyo a la gestión y pago de trámites ante curadurías.

02 mejoramientos: este componente presenta compromisos por valor de \$140.611.169.171 correspondientes al 100 % de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra e interventoría, pago de fallos y sentencias y la adjudicación de los contratos de obra e interventoría 2023 para la intervención de sedes existentes.

03 Dotación: La ejecución presupuestal a 31 de diciembre alcanzó el 100,0%, comprometiendo recursos por valor de \$104.655.111.401, correspondiente a la contratación de prestación de servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión y adquisición de dotaciones.

5.1. Ejecución Presupuestal Acumulada


Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2023

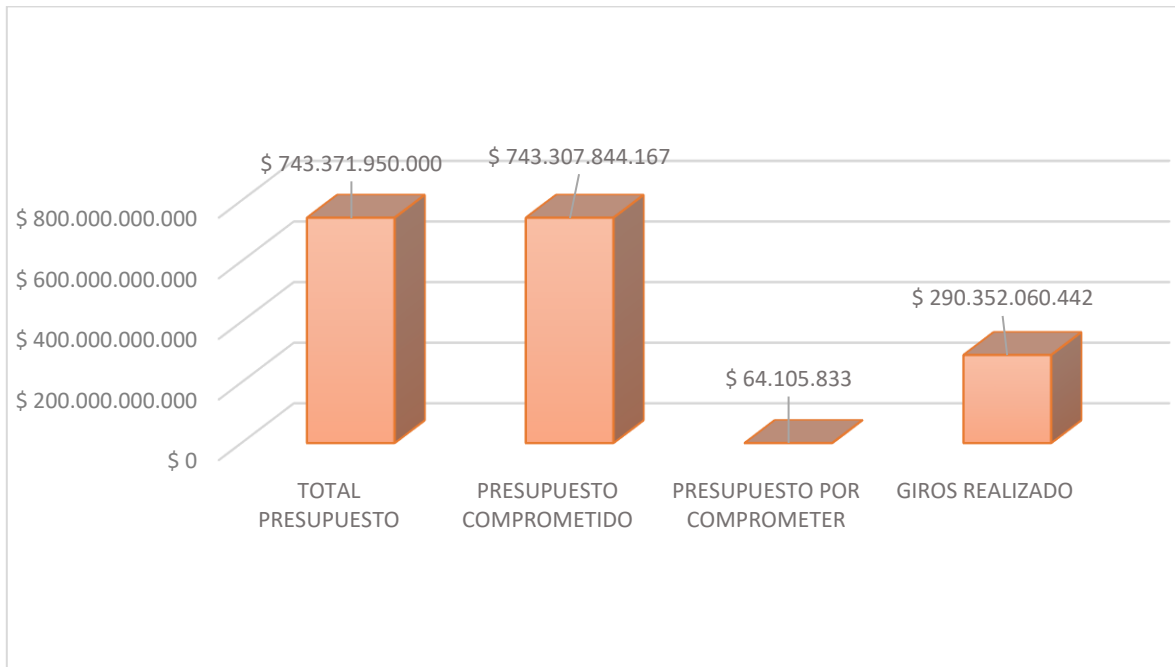

5.2. Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto

Frente a la ejecución presupuestal del proyecto, este se realiza a través de 3 componentes: 01 Construcción y terminación, 02 Mejoramientos y 03 Dotaciones. Los cuales presentan una ejecución a 31 de diciembre de 2023 del 100 %, 100% y 100%, respectivamente. Así mismo, se realizaron giros por valor de \$290.352.060.442, como se muestra a continuación:

Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente

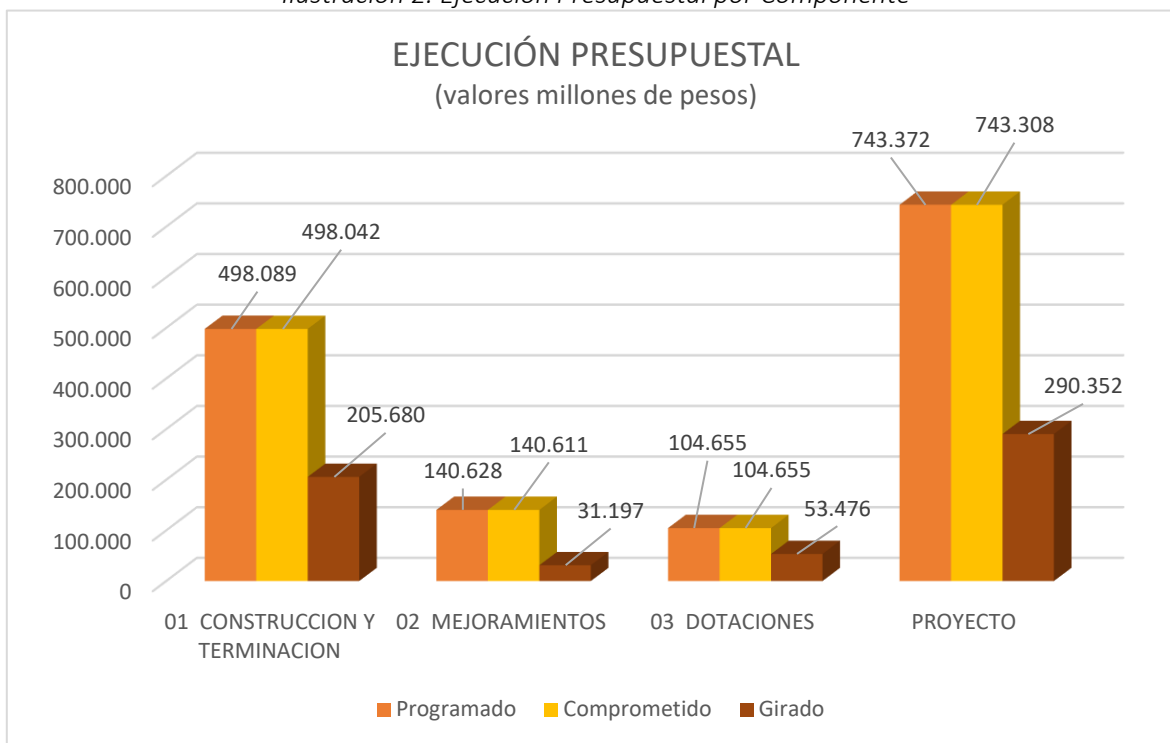

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por componente:

01 construcción y terminación: el componente de construcciones presenta compromisos por valor de \$498.041.563.595, correspondientes al 100 % de la asignación; de los cuales se comprometieron recursos por \$436.883.888.082 orientados a : la ejecución de los proyectos Indusel, La Paz, Procables Alexander Fleming, General Santander y Cardenal Luque, el contrato interadministrativo para la construcción de los colegios patrimoniales (RENOBO) y la suscripción del contrato interadministrativo con FINDETER para la construcción de 9 colegios ; adiciones para el contrato de suministros e instalación de avisos para sedes educativas; el contrato de interventoría de los proyectos San Francisco sede B, Bolonia, Lombardía e Hipotecho, al contrato de obra de los proyectos La Merced y Villemar El Carmen, a los contratos de obra e interventoría de Arborizadora Alta, Los Pinos, a los convenios interadministrativos de la ERU y ENTERRITORIO 2021, la contratación de consultorías para los Cortijo Vianey y para el saneamiento de predios, contrato para el monitoreo del talud del Colegio María Cano y la oferta de compra de los predios Jardín II, Piedra Verde y Arcadia. Así mismo, se comprometieron recursos para el pago de trámites ante Curadurías por valor de \$706.403.253, contratación personal de apoyo a la gestión el valor de \$12.909.131.634 y pago de pasivos exigibles por \$47.542.140.626.

02 mejoramientos: para este componente se comprometieron recursos por valor de \$ 140.611.169.171, correspondiente al 100 % de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra de mejoramientos e interventorías y la adjudicación de

la licitación de obra SED-LP-OP-DCCEE-018-2023 y el concurso de méritos SED-CM-A-DCCEE-022-2023 por valor de \$131.103.078.620; pago de conexión de servicios públicos por \$1.287.676.795; fallos y sentencias judiciales por \$2.142.058.006; la contratación de la póliza de seguros de bienes inmuebles por \$4.362.474.569, celebración de contratos de arrendamientos de inmuebles por \$1.556.123.586 y trámites de gestión ambiental por \$159.757.595

03 Dotación: Es preciso indicar que la ejecución presupuestal a 31 de diciembre alcanzó el 100%, comprometiendo recursos por valor de \$104.655.111.401, entre prestación de servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión por \$3.353.539.438; procesos de adquisición de dotaciones mobiliario escolar y administrativo, instrumentos y accesorios musicales, balanzas para el pesaje de los residuos, contenedores, puntos ecológicos y canecas para el almacenamiento de residuos, computadores portátiles y de escritorio, implementos deportivos, maquinaria y equipos especializados para el fortalecimiento de los ambientes de formación, equipos de tecnología, equipos e instrumentos para laboratorios, material pedagógico, calculadoras graficadoras, paquetes con útiles escolares y la dotación de bienes para el funcionamiento de la emisora virtual "EMISED" del centro de innovación docente por \$90.195.117.753, en cumplimiento de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones y en respuesta a los objetivos del proyecto de inversión. Igualmente, se comprometieron \$9.773.548.543 para el pago de pasivos exigibles por concepto de entrega de equipos de tecnología y mobiliario escolar y administrativo; así como \$1.332.905.667, para coadyuvar en el financiamiento de la adquisición de la póliza todo riesgo daño material, con el fin de salvaguardar las dotaciones.

5.3. Ejecución Reservas Presupuestales

El proyecto constituyó reservas para la vigencia 2023 por valor de \$370.420.748.020; al finalizar el cuarto trimestre del año se gestionaron recursos por valor de \$313.412.326.854, correspondientes al 85 % de la reserva constituida (\$370.342.748.020), incluidos los saldos liberados, como se muestra a continuación:

Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales

Componente	Reservas Constituidas a 01/01/2023	Giros a 31 de diciembre 2023	Anulación Definitiva a 31 de diciembre 2023	% Reservas Gestionadas	Saldo por Gestionar 30/12/2023
CONSTRUCCION Y TERMINACION	127,070,030,469	103,500,011,888	208,298,440	82%	23,361,720,141
MEJORAMIENTOS	169,571,426,200	136,502,799,472	28,286,169	81%	33,040,340,559
DOTACIONES	73,779,291,351	73,409,515,494	223,855	99%	369,552,002
TOTAL	370,420,748,020	313,412,326,854	236,808,464	85%	56,771,612,702

6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

6.1. Objetivo Específico 1.

Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.

6.1.1. Producto 1

Infraestructura educativa construida: Para la vigencia 2023, se programó la construcción de seis (6) instituciones educativas. Estos colegios se encuentran ubicados en las localidades Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa y Fontibón.

Tabla 4. Producto Objetivo 1

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa construida	6	11	En la vigencia 2023, a corte de 31 de diciembre, se ha terminado y/o entregado once (11) proyectos (9 colegios y 2 sedes de primera infancia) 1. María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiará a 180 niños, 2. Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande, ampliando la cobertura en 225 cupos, estos ubicados en la localidad de Suba, 3. El Colegio Lucia Rubio de Laverde - Porvenir de la localidad de Engativá que beneficiará a 1040 niños, niñas y jóvenes de la localidad, 4. El Colegio Ciudad de Chengdu (Bolonía) de la localidad de Usme, el cual beneficiará a 550 niños de la localidad, 5. Villemar el Carmen sede C, ubicado en la localidad de Fontibón, la cual beneficiará a 800 niños, 6. Arborizadora Alta, la cual beneficiará a 2240 niños, en la localidad de Ciudad Bolívar, 7. El colegio San Francisco de Asís ubicado en Los Mártires, el cual beneficiará a 600 niños, 8. El colegio Jaime Niño Diez, de la localidad de Suba, el cual beneficiará 520 niños de la localidad de Suba, 9. el colegio La Merced – de la localidad de Puente Aranda, la cual beneficiará a 2440 niños, 10. El colegio los pinos – de la localidad de Santa Fé, la cual beneficiará a 1120 niños y 11. Primera etapa del Colegio Teresa Martínez de Varela – La Magdalena de la localidad de Kennedy, con capacidad para 1680 estudiantes. Es así como en el marco de la ejecución de la meta PDD, Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, se

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
			han terminado y entregado treinta y tres (33) colegios. Al mismo tiempo, es importante precisar que, 2 colegios más cuentan con entrega parcial y, actualmente, se encuentran en proceso de legalización de acta para el respectivo reporte en meta.

6.1.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.1.2.1. *Meta 1:* Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, en lotes nuevos, intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

La Administración Distrital estableció una meta de entrega de 35 colegios nuevos y restituidos como parte del Plan Distrital de Desarrollo, sin embargo, y atendiendo las necesidades de la ciudad en cuanto a infraestructura educativa y sus apuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial, el avance logrado en gestión predial y contratación y elaboración de diseños, y en consonancia con lo aprobado por el Concejo Distrital, por medio del nuevo cupo de endeudamiento y demás recursos, la Secretaría de Educación Distrital contempla dejar adicionalmente al cumplimiento de la meta, en etapa de diseños con licencia de construcción, contratados o en ejecución de obra, por lo menos otras 35 sedes educativas en las diferentes localidades de la ciudad.

Los colegios que se reportan como terminados, en ejecución o próximos a iniciar corresponden a los proyectos con mayor avance en la planeación y ejecución de obra. En ese sentido, el cumplimiento de la meta de los 35, corresponderá a las 35 sedes educativas que presenten mayor avance al finalizar la respectiva administración y el actual Plan de Desarrollo.

En torno a lo anterior, a corte de 31 de diciembre, la entidad ha terminado y entregado treinta y tres (33) colegios y, al mismo tiempo, 2 colegios más con entrega parcial, que están en proceso de legalización de acta para reporte de meta.

Es así como la Secretaría venía ejecutando 15 proyectos que se encontraban contratados desde la administración anterior, de los cuales a corte de 31 de diciembre se han terminado y entregado al 100%; dichos colegios se relacionan a continuación y corresponden a intervenciones en modalidad de obra nueva, restitución y/o ampliación:

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

Tabla 5. Relación proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación para terminación

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	% Avance Diciembre 2023	Estado de la obra
1	Kennedy	Carlos Arango Vélez	Restitución	89,00%	100%	Terminado
2	Bosa	Colegio de la Bici	Colegio Nuevo	61,00%	100%	Terminado
3	Engativá	Tabora	Restitución	84,00%	100%	Terminado
4	La Candelaria	La Candelaria (sede La Concordia)	Terminación	40,00%	100%	Terminado
5	Bosa	Campo Verde I – Laurel de Cera	Colegio Nuevo	60,00%	100%	Terminado
6	Bosa	Campo Verde II – Parques de Bogotá	Colegio Nuevo	61,00%	100%	Terminado
7	Ciudad Bolívar	Sierra Morena – Parque	Colegio Nuevo	63,66%	100%	Terminado
8	Kennedy	Ciudad de Techo I	Colegio Nuevo	29,00%	100%	Terminado
9	Fontibón	Integrado de Fontibón (Sede Emma Villegas de Gaitán)	Ampliación	0,60%	100%	Terminado
10	Tunjuelito	Rafael Uribe Uribe	Restitución	25,00%	100%	Terminado
11	San Cristóbal	República Del Ecuador	Restitución	28,00%	100%	Terminado
12	Engativá	Laureano Gómez	Restitución	48,00%	100%	Terminado
13	Ciudad Bolívar	Sierra Morena - La Curva	Colegio Nuevo	15,50%	100%	Terminado
14	Antonio Nariño	Guillermo León Valencia	Ampliación	63,00%	100%	Terminado
15	Usme	Ciudad, Chengdú – predio Bolonia*	Colegio Nuevo	75%	100%	Terminado

*En proceso sancionatorio

Así mismo, la entidad ejecuto la terminación de cinco (5) sedes de primera infancia, las cuales, con corte a diciembre 31 de 2023, han sido terminadas y entregadas:

Tabla 6 Proyectos de primera infancia

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance Diciembre 2023	Estado de la obra
1 (16)	Bosa	Villas del Progreso Porvenir VII	Colegio Nuevo	100 %	Terminado
2 (17)	Kennedy	Gabriel Betancourt Mejía	Colegio Nuevo	100 %	Terminado
3 (18)	Bosa	Bosa Brasilia Porvenir IV	Colegio Nuevo	100%	Terminado
4 (19)	Suba	María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes Sabana de Tibabuyes Fase II*	Colegio Nuevo	100%	Terminado
5 (20)	Suba	Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande Fase II*	Colegio Nuevo	100%	Terminado*

* Los contratos legalizados en los años 2018 y 2019, para las obras de los proyectos María Cristina Salazar y Ana Mercedes Mejía, terminaron sin el cumplimiento del objeto contractual, razón por la cual en el año 2021 se adelantaron los procesos de contratación de las fases de terminación y la obra fue terminada y entregada a la comunidad en el año 2023.

En la **vigencia de 2020**, se logró la terminación de la construcción de cuatro (4) proyectos: 1. "La Bici" ubicado en la localidad de Bosa, 2. "Carlos Arango Vélez", ubicado en la localidad de Kennedy, 3. Tabora ubicado en la localidad de Engativá y 4. el Colegio denominado La Candelaria ubicado en la localidad Candelaria.

Durante la **vigencia 2021**, la Dirección de construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, terminó la construcción de siete (7) proyectos denominados: 1. "Parques de Bogotá – Campo Verde II" y 2. "Laurel de Cera – Campo Verde I" ubicados en la localidad de Bosa, 3. "Laureano Gómez", ubicado en la localidad de Engativá, el 4. Colegio denominado "El Nogal – Predio Sierra Morena Parque" ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, 5. el colegio "Ciudad de Techo I" ubicado en la localidad de Kennedy, 6. Integrado de Fontibón - Emma Villegas De Gaitán ubicado en la localidad de Fontibón, 7. Rafael Uribe Uribe en la localidad de Tunjuelito.

Para la **vigencia 2022**, a corte de 31 de diciembre fueron terminados (8) colegios y (3) sedes de primera infancia: 1. Esmeralda Arboleda Cadavid - La Palestina, 2. Laura Herrera de Varela - Encenillos Niños Jesús, 3. Ciudadela El Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo - Plaza Logística de la localidad de Bosa, 4. Abel Rodríguez Céspedes - Los Cerezos de la Localidad de Engativá con capacidad para 8300 estudiantes, 5, Guillermo León Valencia Localidad Antonio Nariño, con capacidad 720 estudiantes, 6. Angela Restrepo Moreno- Sierra Morena Curva, en la localidad de Ciudad Bolívar que atenderá 1040 estudiantes y 7. Gloria Valencia de Cataño - Santa Teresita con una capacidad de 1.040 cupos en la localidad de San Cristóbal, 8. Villas del Progreso Porvenir VII y 9. Bosa Brasilia Porvenir IV - de la localidad de Bosa, 10. Gabriel Betancourt Mejía – de la localidad de Kennedy, y 11. República del Ecuador – Localidad de San Cristóbal.

Durante la **vigencia 2023**, Se han terminado y/o entregado once (11) proyectos (9 colegios y 2 sedes de primera infancia) 1. María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiara a 180 niños, 2. Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande, ampliando la cobertura en 225 cupos, estos ubicados en la localidad de Suba, 3. El Colegio Lucia Rubio de Laverde - Porvenir de la localidad de Engativá que beneficiara a 1040 niños, niñas y jóvenes de la localidad, 4. El Colegio Ciudad de

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

Chengdu (Bolonia) de la localidad de Usme, el cual beneficiara a 550 niños de la localidad, 5. Villemar el Carmen sede C, ubicado en la localidad de Fontibón, la cual beneficiará a 800 niños, 6. Arborizadora Alta, la cual beneficiara a 2240 niños, en la localidad de Ciudad Bolívar, 7. El colegio San Francisco de Asís ubicado en Los Mártires, el cual beneficiará a 600 niños, 8. El colegio Jaime Niño Diez, de la localidad de Suba, el cual beneficiara 520 niños de la localidad de Suba, 9. el colegio La Merced – de la localidad de Puente Aranda, la cual beneficiará a 2440 niños, 10. El colegio los pinos – de la localidad de Santa Fe, la cual beneficiará a 1120 niños y 11. Primera etapa del Colegio Teresa Martínez de Varela – La Magdalena de la localidad de Kennedy, no obstante, algunos de estos proyectos se encuentran en trámite de conexiones definitivas de servicios públicos.

Es de precisar que, se realizó la entrega parcial de 2 colegios nuevos que están actualmente en legalización de actas para efectuar el respectivo reporte en meta en el transcurso del primer semestre de 2023.

La administración distrital, desde el año 2020, avanzó con el desarrollo de (23) colegios, de los cuales (16) están siendo ejecutados directamente por la SED, (5) mediante convenio interadministrativo SED-MEN y (5) más se desarrollan a través de contratos interadministrativos con la ERU y ENTERRITORIO,

Los proyectos citados se relacionan a continuación:

Tabla 7. Proyectos ejecutados por la SED

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	% Avance Diciembre /2023	Recursos restantes para finalizar construcción	Fecha estimada de entrega de la obra
1 (21)	Bosa	Laura Herrera de Varela Encenillos (Predio Niño Jesús)	Colegio Nuevo	0,00%	100%	N / A	oct-22
2 (22)	Bosa	Esmeralda Arboleda Cadavid - La Palestina	Colegio Nuevo	0,00%	100%	N / A	nov-22
3 (23)	San Cristóbal	Gloria Valencia de Cataño- Santa Teresita	Colegio Nuevo	0,00%	100%	N / A	oct-22
4 (24)	Santafé	Los Pinos	Restitución	N/A	100%	N / A	dic-23
5 (25)	Puente Aranda	La Merced	Restitución	N/A	100%	N / A	dic-23
6 (26)	Fontibón	Villemar El Carmen Sede C	Restitución	0,00%	100%	N / A	dic-23
7 (27)	Ciudad Bolívar	Arborizadora Alta	Restitución	N/A	100%	N / A	dic-23
8 (28)	Suba	Jaime Niño 10- Lombardía	Colegio Nuevo	N/A	100%	N / A	dic-23
9 (29)	Kennedy	Feliza Burstyn - Hipotecho	Colegio Nuevo	N/A	85,89%	N / A	mar-24 Entrega Parcial
10 (30)	Kennedy	Luz Gabriela Arango El Ferrol - La Paz	Colegio Nuevo	N/A	50,15%	N / A	ago-24
11 (31)	Bosa	Hena Rodríguez Parra -Indusel	Colegio Nuevo	N/A	42,67%	N / A	oct-24
12 (32)	Fontibón	María Josefa Canelones - Procables	Colegio Nuevo	N/A	38,72%	N/A	mar-24

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

13 (33)	Ciudad Bolívar	San Francisco Sede B Fase I	Restitución	N/A	40,96%	N / A	Proceso* Sancionatorio
14 (34)	Suba	Alfonso Jaramillo	Restitución	N/A	Próximo a iniciar		
15 (35)	Engativá	Cardenal Luque	Restitución	N/A	Próximo a iniciar		
16 (36)	Usaquén	General Santander	Restitución	N/A	Próximo a iniciar		

*Para el caso de San Francisco sede B el contrato de obra terminó el 23 de octubre de 2023, sin el cumplimiento del objeto contractual por lo tanto se encuentra en proceso sancionatorio y paralelamente se adelanta el en proceso de contratación para su terminación

Las fechas estimadas de entrega de los proyectos que se encuentran en etapa de obra han tenido variaciones, producto de imprevistos técnicos, jurídicos y oportuno acceso a materiales, lo cual ha obligado a modificar el cronograma de ejecución de algunos proyectos de obra.

Adicionalmente, a través del convenio interadministrativo con el FFIE se han venido desarrollando cinco (5) nuevos colegios con cofinanciación de la nación por la suma de \$53.912.000.000, para los cuales la SED apropió recursos por valor de \$72.863.405.263,18, para un valor total ejecutado de \$ 126.775.405.264. Ahora bien, de los proyectos enmarcados en este convenio, tres (3) colegios se encuentran terminados, uno (1) se encuentran en ejecución y uno (1) más está próximo a iniciar obra. Como se muestra a continuación:

Tabla 8. Proyectos cofinanciados

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance	Fecha estimada de entrega de la obra
				dic-23	
1 (37)	Bosa	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint Malo - Plaza Logística	Colegio Nuevo	100%	Terminado
2 (38)	Engativá	Abel Rodríguez Céspedes - Los Cerezos	Colegio Nuevo	100%	Terminado
3 (39)	Engativá	Lucila Rubio de Laverde -Porvenir	Colegio Nuevo	100%	Terminado
4 (40)	Ciudad Bolívar	Agudelo Restrepo – Bonavista*	Colegio Nuevo	88,87%	mar-24
5 (41)	Santafé	Policarpa Salavarrieta	Restitución	Próximo a iniciar	

* Entrega parcial

De otra parte, en la vigencia 2021, se suscribieron dos (2) contratos interadministrativos con la ERU y ENTERRITORIO los cuales tienen por objeto “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para la ejecución de los proyectos Hacienda Casablanca y Boíta por parte de EN Territorio y San Francisco de Asís y La Magdalena, que serán desarrollados por la ERU.

Los proyectos que gerencia la entidad EN Territorio iniciaron su ejecución en el mes de marzo de 2022 así: Hacienda Casablanca - 17 de marzo de 2022 y Boíta - 25 de marzo de 2022. En cuanto a los proyectos gerenciados por la ERU, el proyecto La Magdalena inició su ejecución el 23 de mayo de 2022, y frente al proyecto San Francisco de Asís Fase II, inició el 8 de junio de 2022.

Tabla 9 Proyectos con Gerencias Externas

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Gerencia	% Avance Diciembre/ 2023	Estado de la Obra	Fecha estimada de entrega de la obra
1 (42)	Ciudad Bolívar	María Currea Manrique -Hacienda Casablanca	Colegio Nuevo	EN Territorio	72,57%	En ejecución	May-2024
2 (43)	Kennedy	María Betsabé Espinal – Boíta	Colegio Nuevo	EN Territorio	41.46%	En ejecución	Jul-2024
3 (44)	Mártires	San Francisco de Asís	Colegio Nuevo	ERU	100%	Terminado	Dic-2023
4 (45)	Kennedy	Teresa La Magdalena*	Colegio Nuevo	ERU	56,47%	En ejecución	Entrega Primera Etapa Dic-23
	Ciudad Bolívar	San Francisco Sede B Fase II	Restitución	ERU	Próximo a iniciar		

*Entrega parcial

A corte del periodo, la entidad terminó y entrego (33) colegios, (2) más entregados parcialmente, están en proceso de legalización de acta para reportar en meta, otros (5) proyectos se encuentran en ejecución y (5) están próximos a iniciar.

Adicionalmente, mediante Acuerdo 840 de junio 13 de 2022, se aprobaron recursos de cupo de endeudamiento para la construcción de 26 nuevas obras adicionales para la ciudad con 19 colegios nuevos/restituidos, 6 colegios para la primera infancia y 1 centro pedagógico, las cuales se encuentran en proceso de estudios y diseños y obtención de licencias. Así mismo, se adelanta la ejecución de 3 consultoría de estudios y diseños adicionales, que no hacen parte de los 26 proyectos aprobados en el Acuerdo.

Conforme a lo citado anteriormente, de los 29 proyectos que venían en fase de consultoría, 3 se encuentran por iniciar obra contratada directamente por la SED (Alexander Fleming, Cardenal Luque y General Santander), 16 se encuentran en ejecución de consultoría y cuenta con financiamiento para la ejecución de las obras y 10 Proyectos más están en etapa de consultoría y requieren apropiación de recursos para la ejecución de las obras. A continuación, se relacionan el estado de 26 proyectos en fase de consultoría:

Tabla 10 Proyectos adicionales Acuerdo 840

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Estado	% Avance Dic-31
1 (46)	Suba	Alfonso Jaramillo	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Gestión de recursos para obra	63,00%
2 (47)	Engativá	La Palestina	Restitución	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Gestión de recursos para obra	64,00%

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

3 (48)	Santafé	Altos de Egipto	Colegio Nuevo	Con Licencia Ejecutoriada- Obra contratada Gerencia externa	88,00%
4 (49)	La Candelaria	Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez	Restitución	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	85,30%
5 (50)	Suba	Fontanar del Rio	Nuevo - PI	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción - Obra contratada Gerencia externa	69,36%
6 (51)	Engativá	Antonio Villavicencio	Restitución	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	82,35%
7 (52)	Engativá	Antonio Villavicencio (Cesión)	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	82,35%
8 (53)	San Cristóbal	Plazuela Álamos	Nuevo-PI	Suspendido- Gestión de recursos para obra	66,00%
9 (54)	San Cristóbal	Las Brisas	Nuevo - PI	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	57,24%
10 (55)	Bosa	Porvenir II	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	45,25%
11 (56)	Usme	La Parroquia	Restitución - PI	Suspendido por tramite IDPC- Gestión de recursos para obra	81,00%
13 (57)	Ciudad Bolívar	Madelena	Nuevo - PI	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	70,16%
13 (58)	Suba	Theilard de Chardan	Nuevo - PI	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	53,00%
14 (59)	Bosa	Villas del Progreso (compra)	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	49,00%
15 (60)	Suba	Ciudadela Cafam II	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	63,45%
16 (61)	Bosa	Villas del Progreso (Cesión)	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción- Obra contratada Gerencia externa	70,26%
17 (62)	Engativá	Miguel Antonio Caro	Restitución	En ejecución- Gestión de recursos para obra	18,02%
18 (63)	Ciudad Bolívar	Brisas del Diamante	Restitución	Suspendido- Obra contratada Gerencia externa	49,88%
19 (64)	Fontibón	Integrado de Fontibón	Restitución	En ejecución- Gestión de recursos para obra	19,75%
20 (65)	Santafé	El Verjon	Restitución	Suspendido- Gestión de recursos para obra	81,02%
21 (66)	Rafael Uribe Uribe	Liceo Femenino Mercedes Nariño (patrimonial)	Restitución	En ejecución- Obra contratada Gerencia externa	5%
22 (67)	Bosa	Francisco de Paula Santander (patrimonial)	Restitución	En ejecución- Obra contratada Gerencia externa	5%



INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

23 (68)	Los Mártires	Agustín Nieto Caballero (patrimonial)	Restitución	En ejecución- Obra contratada Gerencia externa	5%
24 (69)	Engativá	Porvenir ERU	Colegio Nuevo	En ejecución- Gestión de recursos para obra	6,40%
25 (70)	Tunjuelito	San Benito Abad	Restitución	En ejecución- Gestión de recursos para obra	10%
26 (71)	Usme	Cortijo Vianey	Restitución	Próxima a iniciar - Gestión de recursos para obra	N/A

* Las consultorías que se encuentran radicadas en debida forma ante las curadurías urbanas para los tramites de licencia de construcción y/o urbanismo, y expedición de las actas de observaciones y/o actos resolutorios, se encuentran en estado suspendido.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

A corte del reporte no se presentan retrasos o dificultades en los proyectos de obra que están en ejecución o próximos a iniciar.

c. Registro Fotográfico

1. Colegio Arborizadora alta Sede Daniel Esteven Duque Buitrago – Ciudad Bolívar



- Estudiantes beneficiados: 2.240
- Área Construida: 13.877 M2

2. Colegio María Cristina Salazar - (Sabana Tibabuyes) - Suba



- Estudiantes beneficiados: 180
- Área Construida: 1.497 M2

6.2. Objetivo Específico 2.

Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.

6.2.1. Producto 2.

Para la vigencia 2023 se proyectó la intervención de 282 sedes educativas, de las cuales 173 corresponde a meta rezago de la vigencia 2022 y 109 a la meta establecida para la presente vigencia.

Tabla 11. Productos Objetivo 2

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa mejorada	282	244	A 31 de diciembre, se logró la intervención de 244 IED, equivalentes al 100 % de la meta rezago de la vigencia 2022 y al 65,13% de la meta proyectada para la vigencia 2023. Estas intervenciones beneficiarán la comunidad educativa de las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santafé, Suba, Tunjuelito, Usaquén y Usme. se continua con la ejecución de 96 frentes de mejoramiento, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 62%, encontrándose en

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
			ejecución 11 contratos de obra y 11 de interventoría. El contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 11.18%, quedando pendiente por iniciar el contrato de obra del grupo 7 /2023. Es de precisar que se ha alcanzado una meta acumulada de 692 sedes educativas y administrativas con 1109 intervenciones desde la vigencia 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, correspondiente al 94,8%

6.2.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.2.2.1. *Meta 2:* Intervenir 730 sedes educativas existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

Desde la vigencia 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, la entidad ha logrado intervenir 692 sedes educativas, en las cuales se ha ejecutado 1109 intervenciones con mejoramientos, con el fin de robustecer las condiciones de las plantas físicas educativas, en cuanto a baterías sanitarias, cubiertas, áreas libres y recreativas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, cerramientos y mejoramiento de ventilación y carpintería metálica.

Ahora bien, en el periodo de octubre a diciembre de 2023, se ha adelantado la siguiente gestión:

En el mes de octubre de 2023 se terminaron 53 intervenciones; distribuidas en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santafé, Suba, Tunjuelito y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 115 frentes de mejoramiento, los cuales corresponden al proyecto 2022. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 57.15%, encontrándose en ejecución 11 contratos de obra y 11 de interventoría. Los contratos de obra e interventoría del Grupo 6 se encuentran en proceso jurídico.

En el mes de noviembre de 2023 se terminaron intervenciones que están distribuidas en las localidades de Bosa, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santafé, Suba, Ciudad Bolívar, Mártires y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 150

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

frentes de mejoramiento, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 66.08%, encontrándose en ejecución 11 contratos de obra y 11 de interventoría. El contrato de obra del Grupo 6 se encuentran en proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 3.67%.

Adicionalmente, se suscribieron las modificaciones de los contratos de obra e interventoría de los grupos 4 y 11 del 2022, y del contrato de obra del grupo 12 del 2022. Actualmente se adelantan los tramites de modificación para los demás grupos de los contratos de obra e interventoría 2022 y 2023:

ZONA	GRUPO	TIPO CONTRATO	CONTRATO OBRA
NORTE	1	OBRA	4087800 - 2022
		INT	4146203-2022
	2	OBRA	4077642 - 2022
		INT	4146207-2022
	3	OBRA	4077648 - 2022
		INT	4146210-2022
SUR	4	OBRA	4077396 - 2022
		INT	4146302 -2022
	5	INT	4146216-2022
ORIENTE	7	OBRA	4077644 - 2022
	7	INT	4146220-2022
	8	OBRA	4077645 - 2022
	8	INT	4155718-2022
	9	OBRA	4088303 - 2022
	9	INT	4146223-2022
OCCIDENTE	11	OBRA	4077400 - 2022
	11	INT	4146311-2022
	12	OBRA	4077647 - 2022
	12	INT	4146314-2022
ZONA	GRUPO	TIPO CONTRATO	CONTRATO OBRA
SUR	4	OBRA	5305901 - 2023

En el mes de diciembre de 2023 se terminaron 69 intervenciones que están distribuidas en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santafé, Suba, Tunjuelito, Usaquén y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 96 frentes de mejoramiento, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 62%, encontrándose en ejecución 11 contratos de obra y 11 de interventoría. El contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 11.18%, quedando pendiente por iniciar el contrato de obra del grupo 7 /2023.

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

Se suscribieron las modificaciones de los contratos de obra e interventoría de los grupos 2022 y 2023:

ZONA	GRUPO	TIPO CONTRATO	CONTRATO OBRA
NORTE	1	OBRA	4087800 - 2022
		INT	4146203-2022
	2	OBRA	4077642 - 2022
		INT	4146207-2022
	3	OBRA	4077648 - 2022
		INT	4146210-2022
SUR	4	OBRA	4077396 - 2022
		INT	4146302 -2022
	5	INT	4146216-2022
ORIENTE	7	OBRA	4077644 - 2022
	7	INT	4146220-2022
	8	OBRA	4077645 - 2022
	8	INT	4155718-2022
	9	OBRA	4088303 - 2022
	9	INT	4146223-2022
OCCIDENTE	11	OBRA	4077400 - 2022
	11	INT	4146311-2022
	12	OBRA	4077647 - 2022
	12	INT	4146314-2022
ZONA	GRUPO	TIPO CONTRATO	CONTRATO OBRA
SUR	4	OBRA	5305901 - 2023

A continuación, se relacionan los mejoramientos recibidos que aportan a la meta en el periodo:

COMPONENTES	MEJORAMIENTOS	EMERGENCIAS	TOTAL
ENERO	5	0	5
FEBRERO	17	0	17
MARZO	10	0	10
ABRIL	13	2	15
MAYO	8	9	17
JUNIO	18	2	20
JULIO	8	2	10
AGOSTO	11		11
SEPTIEMBRE	34	2	36
OCTUBRE	10	3	13
NOVIEMBRE	21	0	21
DICIEMBRE	69	0	69
INTERVENCIONES			244

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

Tabla 12 Discriminación de mejoramientos recibidos 2023

TERMINADOS EN ENERO 2023						
No.	LOCALIDAD	CPF	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	TIPO
449	SAN CRISTOBAL	448	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	REPUBLICA DE CANADA I	C	MEJORAMIENTO
450	USAQUEN	122	COLEGIO TOBERIN (IED)	TOBERIN	A	MEJORAMIENTO
451	SUBA	1167	COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	SEDE B	B	MEJORAMIENTO
452	SUBA	1106	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	EL SALITRE	A	MEJORAMIENTO
453	USME	544	COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	OLARTE	A	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN FEBRERO 2023						
No.	LOCALIDAD	CPF	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	TIPO
454	ENGATIVA	1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	A	MEJORAMIENTO
455	ENGATIVA	1003	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ANDALUCIA	C	MEJORAMIENTO
456	SUMAPAZ	2002	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	ADELINA GUTIERREZ PALACIOS	F	MEJORAMIENTO
457	SUMAPAZ	2008	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	LOS RIOS	L	MEJORAMIENTO
458	USME	513	COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	DANUBIO AZUL	B	MEJORAMIENTO
459	SUMAPAZ	2025	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	TUNAL BAJO	C	MEJORAMIENTO
460	SUMAPAZ	2018	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SANTO DOMINGO	M	MEJORAMIENTO
461	SANTAFE	304	COLEGIO LOS PINOS (IED)	EL PAREJO	C	MEJORAMIENTO
462	SAN CRISTOBAL	412	COLEGIO AGUAS CLARAS (IED)	AGUAS CLARAS	A	MEJORAMIENTO
463	ANTONIO NARIÑO	1512	COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)	REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	B	MEJORAMIENTO
464	RAFAEL URIBE	1826	COLEGIO JOSE MARTI (IED)	LA RESURRECCION	D	MEJORAMIENTO
465	KENNEDY	838	COLEGIO ISABEL II (IED)	PIO XII	B	MEJORAMIENTO
466	KENNEDY	879	COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED)	COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED)	A	MEJORAMIENTO
467	BOSA	740	COLEGIO ARGELIA (IED)	COLEGIO ARGELIA (IED)	A	MEJORAMIENTO
468	ANTONIO NARIÑO	1501	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED)	NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI	B	MEJORAMIENTO
469	KENNEDY	836	COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)	JAIRO ANIBAL NIÑO	A	MEJORAMIENTO
470	ENGATIVA	1056	COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	GARCES NAVAS III	C	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN MARZO 2023						
No.	LOCALIDAD	CPF	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	TIPO
471	SUBA	1152	COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)	COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)	A	MEJORAMIENTO
472	ANTONIO NARIÑO	1510	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	REPUBLICA DE MEXICO	B	MEJORAMIENTO
473	RAFAEL URIBE	1840	COLEGIO PALERMO SUR (CED)	PALERMO SUR	A	MEJORAMIENTO
474	BOSA	744	COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	A	MEJORAMIENTO
475	BOSA	741	COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)	COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)	A	MEJORAMIENTO
476	RAFAEL URIBE	1838	COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	NESTOR FORERO ALCALA	A	MEJORAMIENTO
477	PUENTE ARANDA	1624	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	B	MEJORAMIENTO
478	BOSA	749	COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	KIMI PERNIA DOMICO	A	MEJORAMIENTO
479	BOSA	724	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)	LOS NARANJOS	D	MEJORAMIENTO
480	SAN CRISTOBAL	429	COLEGIO TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	JARDIN INFANTIL NACIONAL POPULAR No. 2	C	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN ABRIL 2023						

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

No.	LOCALIDAD	CPF	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	TIPO
481	USAQUEN	136	COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)	COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)	A	MEJORAMIENTO
482	SUMAPAZ	2020	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	ERASMO VALENCIA	I	MEJORAMIENTO
483	USME	532	COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)	LA MAYORIA	A	MEJORAMIENTO
484	USME	569	COLEGIO MIRAVALLE (IED)	COLEGIO MIRAVALLE (IED)	A	MEJORAMIENTO
485	SANTAFE	302	COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	MANUEL ELKIN PATARROYO	A	MEJORAMIENTO
486	SAN CRISTOBAL	465	COLEGIO LOS ALPES (IED)	SEDE C	C	MEJORAMIENTO
487	LOS MARTIRES	1408	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)	SAMPER MENDOZA	B	MEJORAMIENTO
488	RAFAEL URIBE URIBE	1851	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	ESCUELA HOGAR BRAVO PAEZ	C	MEJORAMIENTO
489	KENNEDY	806	COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)	ALQUERIA DE LA FRAGUA	A	MEJORAMIENTO
490	SANTAFE	V3	PREDIO VITELMA	PREDIO VITELMA	A	MEJORAMIENTO
491	USME	562	COLEGIO LOS TEJARES (IED)	EL CURUBO	B	MEJORAMIENTO
492	PUENTE ARANDA	1603	COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	DIEGO LUIS CORDOBA	C	MEJORAMIENTO
493	SAN CRITOBAL	LOT4	LOTE SAN MARTIN DE LOBA	LOTE SAN MARTIN DE LOBA	UNICA	EMERGENCIAS
494	FONTIBON	910	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)	EMMA VILLEGAS DE GAITAN	B	MEJORAMIENTO
495	BOSA	757	COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	LA CONCEPCION	C	EMERGENCIAS
TERMINADOS EN MAYO 2023						
No.	LOCALIDAD	CPF	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	TIPO
496	RAFAEL URIBE URIBE	1846	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	RESTREPO MILLAN	A	MEJORAMIENTO
497	USME	536	COLEGIO RURAL LOS ANDES (CED)	LOS ANDES	A	MEJORAMIENTO
498	CIUDAD BOLIVAR	1924	COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)	LA CASONA	B	MEJORAMIENTO
499	CIUDAD BOLIVAR	1929	COLEGIO VILLAMAR (IED)	MARANDU	B	MEJORAMIENTO
500	CIUDAD BOLIVAR	1908	COLEGIO CANADA (IED)	CANADA	A	MEJORAMIENTO
501	SAN CRISTOBAL	450	COLEGIO TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	SAN CRISTOBAL SUR	A	MEJORAMIENTO
502	BOSA	750	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	GERMAN ARCINIEGAS	A	MEJORAMIENTO
503	KENNEDY	801	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	A	MEJORAMIENTO
504	SAN CRITOBAL	459	COLEGIO LA VICTORIA (IED)	SANTA FERREÑA I	B	EMERGENCIAS
505	USME	578	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	PAULO FREIRE	A	EMERGENCIAS
506	CIUDAD BOLIVAR	1913	COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	DIVINO NIÑO	C	MEJORAMIENTO
507	USME	582	IED SAN CAYETANO SEDE A	SAN CAYETANO	A	EMERGENCIAS
508	USME	547	IED SANTA MARTA	SANTA MARTA	A	EMERGENCIAS
509	BOSA		COLEGIO LA BICI (IED)	DE LA BICI	A	EMERGENCIAS
510	BOSA		COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA	LA PALESTINA	A	EMERGENCIAS
511	BOSA		COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA	ENCENILLOS NIÑO JESUS	A	EMERGENCIAS
512	BOSA		COLEGIO SONIA OSORIO DE SAINT	SONIA OSORIO DE SAINT	A	EMERGENCIAS
TERMINADOS EN JUNIO 2023						
No.	LOCALIDAD	CPF	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	TIPO
513	CHAPINERO	201	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	ANTONIO JOSE DE SUCRE	B	MEJORAMIENTO
514	CHAPINERO	208	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	PLAN PADRINOS SAN LUIS	A	MEJORAMIENTO
515	USME	505	COLEGIO USMINIA (IED)	ANTONIO JOSE DE SUCRE	C	MEJORAMIENTO

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

516	USME	518	COLEGIO EL DESTINO (IED)	EL DESTINO	A	MEJORAMIENTO
517	USME	567	COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)	COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)	A	MEJORAMIENTO
518	USME	568	COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)	COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)	A	MEJORAMIENTO
519	TUNJUELITO	622	COLEGIO SAN CARLOS (IED)	JOSE ANTONIO RICAURTE	A	MEJORAMIENTO
520	BOSA	739	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	A	MEJORAMIENTO
521	ENGATIVA	1020	DIRECCION LOCAL DE ENGATIVA	DIRECCION LOCAL DE ENGATIVA	UNICA	MEJORAMIENTO
522	CIUDAD BOLIVAR	1914	COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	EL PARAISO	B	MEJORAMIENTO
523	CIUDAD BOLIVAR	1915	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	EL RECUERDO	B	MEJORAMIENTO
524	CIUDAD BOLIVAR	1941	COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	QUIBA ALTA	A	MEJORAMIENTO
525	CIUDAD BOLIVAR	1952	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	SANTA ROSITA LAS VEGAS	D	MEJORAMIENTO
526	CIUDAD BOLIVAR	1971	COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)	PASQUILLA RURAL	D	MEJORAMIENTO
527	CIUDAD BOLIVAR	1978	COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	SANTO DOMINGO SAVIO	B	MEJORAMIENTO
528	CIUDAD BOLIVAR	1993	COLEGIO ANGELA RESTREPO (IED)	COLEGIO ANGELA RESTREPO (IED)	A	EMERGENCIAS
529	CIUDAD BOLIVAR	1995	COLEGIO EL NOGAL (IED)	COLEGIO EL NOGAL (IED)	A	EMERGENCIAS
530	SUMAPAZ	2006	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	LAS AURAS	A	MEJORAMIENTO
531	SUMAPAZ	2021	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	EL CAPITOLIO	N	MEJORAMIENTO
532	FONTIBON	BF9	BODEGA FONTIBON	BODEGA FONTIBON	UNICA	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN JULIO 2023						
533	BARRIOS UNIDOS	1220	COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)	SEDE A	A	MEJORAMIENTO
534	ANTONIO NARIÑO	1514	DIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO	DIRECCION LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	A	MEJORAMIENTO
535	CHAPINERO	1304	OFICINAS DE RED P	OFICINAS DE RED P	B	MEJORAMIENTO
536	USME	534	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (CED)	LAS MERCEDES	A	MEJORAMIENTO
537	USME	537	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED)	LOS ARRAYANES	A	MEJORAMIENTO
538	USME	561	COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	EL VIRREY ULTIMA ETAPA	B	MEJORAMIENTO
539	BOSA	738	COLEGIO LA ESPERANZA (IED)	COLEGIO LA ESPERANZA (IED)	A	MEJORAMIENTO
540	KENNEDY	829	COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)	LA FLORESTA SUR	A	MEJORAMIENTO
541	USME	590	DIRECCION LOCAL DE USME	DIRECCION LOCAL DE USME	UNICA	EMERGENCIA
542	BOSA	760	COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	ENRIQUE DUSSEL	B	EMERGENCIA
TERMINADOS EN AGOSTO 2023						
543	TEUSAQUILLO	1303	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	ANTONIO NARIÑO	B	MEJORAMIENTO
544	USME	508	COLEGIO BRASILIA - USME (IED)	BRASILIA - USME	A	MEJORAMIENTO
545	USME	530	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)	LA ARGENTINA	A	MEJORAMIENTO
546	USME	533	COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)	LA UNION USME	A	MEJORAMIENTO
547	RAFAEL URIBE	1803	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	ANTONIO RICAURTE	B	MEJORAMIENTO
548	USME	507	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	BATANIA	B	MEJORAMIENTO
549	SAN CRISTOBAL	D4	DIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	DILE SAN CRISTOBAL	UNICA	MEJORAMIENTO
550	FONTIBON	916	COLEGIO ATAHUALPA (IED)	ATAHUALPA	A	MEJORAMIENTO
551	BOSA	711	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	NUEVA ISLANDIA	D	MEJORAMIENTO
552	PUENTE ARANDA	1628	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	JORGE GAITAN CORTES	C	MEJORAMIENTO
553	BOSA	715	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	B	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN SEPTIEMBRE 2023						
554	USAQUEN	112	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	TORCA	D	MEJORAMIENTO
555	USAQUEN	120	COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	DIVINO MAESTRO	B	MEJORAMIENTO
556	USAQUEN	131	COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	PILOTO BAVARIA	A	MEJORAMIENTO

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

557	USAQUEN	132	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	PILOTO DE APLICACION	A	MEJORAMIENTO
558	SANTA FE	313	COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	JORGE SOTO DEL CORRAL	A	MEJORAMIENTO
559	SAN CRISTOBAL	416	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	A	MEJORAMIENTO
560	BOSA	702	COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	SAN PABLO BOSA	A	MEJORAMIENTO
561	BOSA	703	COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	NUEVO CHILE	A	MEJORAMIENTO
562	BOSA	706	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)	GRAN COLOMBIANO	A	MEJORAMIENTO
563	BOSA	727	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	PORFIRIO BARBA JACOB	A	MEJORAMIENTO
564	BOSA	732	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO	B	MEJORAMIENTO
565	SUBA	1153	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	TUNA ALTA	A	MEJORAMIENTO
566	RAFAEL URIBE	1828	COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	CHIRCALES	A	MEJORAMIENTO
567	RAFAEL URIBE	1829	COLEGIO JOSE MARTI (IED)	LUIS LOPEZ DE MESA	A	MEJORAMIENTO
568	RAFAEL URIBE	1848	COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	SAN AGUSTIN	A	MEJORAMIENTO
569	RAFAEL URIBE	BOD15	BODEGA PLANTAS FISICAS	BODEGA PLANTAS FISICAS	UNICA	MEJORAMIENTO
570	USME	565	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	BETANIA	C	MEJORAMIENTO
571	TUNJUELITO	618	COLEGIO VENECIA (IED)	NUEVO MUZU	B	MEJORAMIENTO
572	SUBA	1125	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	RAMON DE ZUBIRIA	A	MEJORAMIENTO
573	SUBA	1126	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SAN CARLOS DE SUBA	B	MEJORAMIENTO
574	ANTONIO NARIÑO	1511	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	REPUBLICA DE PANAMA	C	MEJORAMIENTO
575	USME	520	COLEGIO EL UVAL (IED)	EL UVAL	A	MEJORAMIENTO
576	USME	551	COLEGIO CORTIJO VIANEY	VIANEY	B	EMERGENCIA
577	USME	585	COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)	COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)	A	EMERGENCIA
578	BOSA	718	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)	LOS LAURELES	B	MEJORAMIENTO
579	SUBA	1131	COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	TEILAR DE CHARDAN	C	MEJORAMIENTO
580	PUENTE ARANDA	1634	COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	CULTURA POPULAR	A	MEJORAMIENTO
581	BARRIOS UNIDOS	1202	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	JORGE ELIECER GAITAN	A	MEJORAMIENTO
582	BOSA	756	DIRECCION LOCAL DE BOSA	DIRECCION LOCAL DE BOSA	UNICA	MEJORAMIENTO
583	FONTIBON	924	DIRECCION LOCAL DE FONTIBON	DIRECCION LOCAL DE FONTIBON	UNICA	MEJORAMIENTO
584	MARTIRES	1416	BODEGA ROSA ZARATE	BODEGA ROSA ZARATE	UNICA	MEJORAMIENTO
585	PUENTE ARANDA	1636	DIRECCION LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCION LOCAL DE PUENTE ARANDA	UNICA	MEJORAMIENTO
586	SUMAPAZ	2010	DIRECCION LOCAL DE SUMAPAZ	SANTA ROSA DE BODEGAS	UNICA	MEJORAMIENTO
587	BARRIOS UNIDOS	D12	DIRECCION LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	DIRECCION LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	UNICA	MEJORAMIENTO
588	RAFAEL URIBE	D18	DIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCION LOCAL DE RAFAEL URIBE	UNICA	MEJORAMIENTO
589	TEUSAQUILLO	NC13	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	UNICA	MEJORAMIENTO

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

TERMINADOS EN OCTUBRE 2023						
590	SAN CRISTOBAL	446	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	RAMAJAL	B	MEJORAMIENTO
591	ENGATIVA	1044	COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	FLORIDABLANCA	A	MEJORAMIENTO
592	SUBA	1119	COLEGIO HUNZA (IED)	DIVINO NIÑO JESUS EL CONDOR	B	MEJORAMIENTO
593	BARRIOS UNIDOS	1219	COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)	GLORIA GAITAN	B	MEJORAMIENTO
594	SAN CRISTOBAL		GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	A	EMERGENCIA
595	RAFAEL URIBE	1811	COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	DIANA TURBAY II	B	MEJORAMIENTO
596	SUBA	1115	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	LA PALMA	B	MEJORAMIENTO
597	TUNJUELITO	601	COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)	JOSE MARIA CORDOBA	A	MEJORAMIENTO
598	BARRIOS UNIDOS	1214	COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	A	MEJORAMIENTO
599	USME	517	COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)	EL CURUBITAL	A	MEJORAMIENTO
600	BOSA	716	COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	NUEVA GRANADA	C	MEJORAMIENTO
601	SAN CRISTOBAL		PREDIO LAS BRISAS		A	EMERGENCIA
602	SAN CRISTOBAL		PREDIO SAN DIEGO		A	EMERGENCIA
TERMINADOS EN NOVIEMBRE 2023						
603	BOSA	742	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	EL RECUERDO	B	MEJORAMIENTO
604	CHAPINERO	1307	CIUDAD MAESTRA	CIUDAD MAESTRA	UNICA	MEJORAMIENTO
605	CIUDAD BOLIVAR	1917	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	ESTRELLA DEL SUR	A	MEJORAMIENTO
606	CIUDAD BOLIVAR	1938	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	PERDOMO ALTO	C	MEJORAMIENTO
607	CIUDAD BOLIVAR	1925	COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	LA CUMBRE	B	MEJORAMIENTO
608	CIUDAD BOLIVAR	1919	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	ESTRELLA DEL SUR	C	MEJORAMIENTO
609	ENGATIVA	1074	COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	GARCES NAVAS III	A	MEJORAMIENTO
610	KENNEDY	844	COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	VISION DE COLOMBIA	C	MEJORAMIENTO
611	KENNEDY	883	COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	SALUDCOOP SUR	A	MEJORAMIENTO
612	MARTIRES	1405	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)	REPUBLICA DE VENEZUELA	A	MEJORAMIENTO
613	MARTIRES	1404	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	EMMA VILLEGAS DE GAITAN	B	MEJORAMIENTO
614	RAFAEL URIBE	1816	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	ENRIQUE OLAYA HERRERA	A	MEJORAMIENTO
615	RAFAEL URIBE	1821	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	ISABEL II DE INGLATERRA	B	MEJORAMIENTO
616	SAN CRISTOBAL	458	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	SANTA RITA SU ORIENTAL	D	MEJORAMIENTO
617	SAN CRISTOBAL	403	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED)	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	A	MEJORAMIENTO

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

618	SAN CRISTOBAL	404	COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED)	JOSE MARIA CARBONELL	A	MEJORAMIENTO
619	SAN CRISTOBAL	430	COLEGIO TECNICO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	JOSE A MORALES	B	MEJORAMIENTO
620	SANTA FE	D3-17	DIRECCION LOCAL SANTA FE - CANELARIA	DILE SANTA FE - CANELARIA	UNICA	MEJORAMIENTO
621	SANTA FE	306	COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	LOS ANGELES	B	MEJORAMIENTO
622	SUBA	1107	COLEGIO VILLA ELISA (IED)	EL RUBI-JAPON	C	MEJORAMIENTO
623	USME	523	COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	FABIO LOZANO SIMONELLI	A	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN DICIEMBRE 2023						
624	CHAPINERO	109	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	SAN MARTIN DE PORRES	A	MEJORAMIENTO
625	USAQUEN	212	COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	SAN CRISTOBAL NORTE	C	MEJORAMIENTO
626	CHAPINERO	137	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	JULIO ANTONIO GAITAN	B	MEJORAMIENTO
627	USAQUEN	106	COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)	SALUDCOOP NORTE	A	MEJORAMIENTO
628	USAQUEN	102	COLEGIO TOBERIN (IED)	LAS ORQUIDEAS	C	MEJORAMIENTO
629	USAQUEN	202	COLEGIO TOBERIN (IED)	BABILONIA	B	MEJORAMIENTO
630	CHAPINERO	207	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	BOSQUE CALDERON TEJADA	C	MEJORAMIENTO
631	CHAPINERO	1009	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	NUEVA GRANADA	B	MEJORAMIENTO
632	ENGATIVA	1019	COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	CLUB DEL COMERCIO	B	MEJORAMIENTO
633	ENGATIVA	1011	COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	LA ESPAÑOLA	B	MEJORAMIENTO
634	SUBA	1142	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	NUEVA ZELANDIA	A	MEJORAMIENTO
635	SUBA	1102	COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	JUAN LOZANO Y LOZANO	A	MEJORAMIENTO
636	SUBA	1116	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	CASABLANCA	C	MEJORAMIENTO
637	SUBA	1114	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	LA TOSCANA	A	MEJORAMIENTO
638	SUBA	1132	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	A	MEJORAMIENTO
639	SUBA	1150	COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	TIBABUYES UNIVERSAL	A	MEJORAMIENTO
640	SUBA	564	COLEGIO VILLA ELISA (IED)	Preescolar Villa Elisa	B	MEJORAMIENTO
641	USME	1944	COLEGIO TENERIFE (IED)	GRANADA SUR	B	MEJORAMIENTO
642	CIUDAD BOLIVAR	1958	COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	REPUBLICA DE MEXICO	A	MEJORAMIENTO
643	CIUDAD BOLIVAR	1901	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	MEJORAMIENTO
644	CIUDAD BOLIVAR	1905	COLEGIO ACACIA II (IED)	ACACIA I	B	MEJORAMIENTO
645	CIUDAD BOLIVAR	1911	COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)	ARGENTINA LA NUEVA	B	MEJORAMIENTO
646	CIUDAD BOLIVAR	1932	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	COMPARTIR LUCERO ALTO	A	MEJORAMIENTO
647	CIUDAD BOLIVAR	1936	COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	MOCHUELO ALTO	A	MEJORAMIENTO
648	CIUDAD BOLIVAR	1937	COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)	LAURELES	A	MEJORAMIENTO

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

649	CIUDAD BOLIVAR	1942	COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)	PASQUILLITA	C	MEJORAMIENTO
650	CIUDAD BOLIVAR	1985	COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	QUIBA BAJA	B	MEJORAMIENTO
651	CIUDAD BOLIVAR	1960	COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	JOSE CELESTINO MUTIS	A	MEJORAMIENTO
652	CIUDAD BOLIVAR	1923	COLEGIO SANTA BARBARA (IED)	COMPARTIR MEISSEN	B	MEJORAMIENTO
653	CIUDAD BOLIVAR	434	COLEGIO LA ARABIA (IED)	LA ARABIA	A	MEJORAMIENTO
654	SAN CRISTOBAL	1819	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	JUAN XXIII	C	MEJORAMIENTO
655	RAFAEL URIBE	1845	COLEGIO JOSE MARTI (IED)	GRANJAS SAN PABLO	C	MEJORAMIENTO
656	RAFAEL URIBE	1818	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	REPUBLICA DE ISRAEL	B	MEJORAMIENTO
657	RAFAEL URIBE	1827	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	GENERAL PAEZ	A	MEJORAMIENTO
658	RAFAEL URIBE	1823	COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	REINO DE HOLANDA	A	MEJORAMIENTO
659	RAFAEL URIBE	1841	COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	JUAN DEL RIZZO	C	MEJORAMIENTO
660	RAFAEL URIBE	1820	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	QUIROGA ALIANZA	A	MEJORAMIENTO
661	RAFAEL URIBE	FA1	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	GUSTAVO RESTREPO	A	MEJORAMIENTO
662	RAFAEL URIBE	809	COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR (IED)	FE Y ALEGRÍA	A	MEJORAMIENTO
663	KENNEDY	810	COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	CAMILO TORRES	C	MEJORAMIENTO
664	KENNEDY	862	COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)	CAMPO HERMOSO	C	MEJORAMIENTO
665	KENNEDY	316	COLEGIO VILLA RICA (IED)	PERPETUO SOCORRO	B	MEJORAMIENTO
666	SANTA FE	921	COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	EL GUAVIO	C	MEJORAMIENTO
667	FONTIBON	856	COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	CARLO FEDERICI	A	MEJORAMIENTO
668	KENNEDY	1956	COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)	NICOLAS ESGUERRA	A	MEJORAMIENTO
669	CIUDAD BOLIVAR	726	COLEGIO VILLAMAR (IED)	VILLA GLORIA	A	MEJORAMIENTO
670	BOSA	824	COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	RODRIGO DE BASTIDAS	B	MEJORAMIENTO
671	KENNEDY		COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	GRAN BRITALIA	B	MEJORAMIENTO
672	ENGATIVA	1002	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	AGUAS CLARAS	B	MEJORAMIENTO
673	ENGATIVA	1011	COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN (IED)	NUEVA CONSTITUCION	A	MEJORAMIENTO
674	SUBA	1140	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	GERARDO PAREDES MARTINEZ	A	MEJORAMIENTO
675	BARRIOS UNIDOS	1222	COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)	MODELO DEL NORTE	A	MEJORAMIENTO
676	BARRIOS UNIDOS	1211	COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	JUAN FRANCISCO BERBEO	A	MEJORAMIENTO
677	BARRIOS UNIDOS	1203	COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)	JOSE ANTONIO RICAURTE	D	MEJORAMIENTO
678	SUBA	1108	COLEGIO VISTA BELLA (IED)	GRANADA NORTE	C	MEJORAMIENTO
679	SUBA	1163	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	CATALANES SEDE B	B	MEJORAMIENTO
680	SUBA	1136	COLEGIO VISTA BELLA (IED)	VISTA BELLA	B	MEJORAMIENTO

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

681	USME	502	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)	ALMIRANTE PADILLA PRIMARIA	C	MEJORAMIENTO
682	TUNJUELITO	613	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	ROCKEFELLER	B	MEJORAMIENTO
683	CIUDAD BOLIVAR	1950	COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)	SANTA BARBARA	B	MEJORAMIENTO
684	SAN CRISTOBAL	445	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (IED)	PANTALEON GAITAN PEREZ	A	MEJORAMIENTO
685	SAN CRISTOBAL	447	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	REPUBLICA DE ISRAEL	C	MEJORAMIENTO
686	RAFAEL URIBE	1817-A	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	GABRIELA MISTRAL	D	MEJORAMIENTO
687	BOSA	743	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)	SAN JOSE	C	MEJORAMIENTO
688	BOSA	762	COLEGIO JORGE ISAACS (IED)	COLEGIO JORGE ISAACS (IED) - SEDE PRINCIPAL	A	MEJORAMIENTO
689	ANTONIO NARIÑO	1509	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA	B	MEJORAMIENTO
690	FONTIBON	905	COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)	LA CABAÑA	B	MEJORAMIENTO
691	KENNEDY	821	COLEGIO SAN JOSE (IED)	EL DESCANSO	B	MEJORAMIENTO
692	PUENTE ARANDA	1633	COLEGIO SORRENTO (IED)	SAN RAFAEL	B	MEJORAMIENTO

Los mejoramientos relacionados integran actividades propias de reparaciones locativas dentro de las instituciones educativas, intervenciones en los colegios en atención a requerimientos de servicios públicos y atención de emergencias.

Finalmente, es de precisar que, las obras de mejoramientos pendientes por terminar están en desarrollo en el marco de los contratos que se encuentran en ejecución 2022 y 2023 y se prevé que su terminación y entrega se realice antes del mes de mayo de 2024.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

En las sedes educativas donde se realizan paralelamente actividades de obra y prestación del servicio educativo, se ha tenido que coordinar horarios de trabajo e ingreso y salida de materiales con el fin de no afectar la presencialidad, lo que ha ocasionado que las actividades demoren más de lo previsto.


Frente al contrato de obra del grupo 6-2022, se ha tramitado en dos ocasiones la cesión del contrato, sin embargo, a la fecha no ha sido posible realizarse. Adicionalmente, se solicitó al contratista de obra, la firma de acta de terminación bilateral; situación sobre la cual no se ha tenido respuesta. De otra parte, se ha solicitado a la interventoría el informe para iniciar proceso de incumplimiento contractual nuevamente contra caducidad.

En cuanto al contrato de obra del grupo 10-2022-Contrato No CO1.PCCNTR. 4077646-2022 asociado con las obras en las localidades de Kennedy y Fontibón, presento dificultades en la ejecución de los frentes de obra, por esta razón se dio inicio proceso de presunto incumplimiento y el contratista decidió sesionar el contrato.

EL contrato de obra del grupo 7/2023, contrato de obra CO1.PCCNTR.5305650 de 2023 asociado a las localidades de Kennedy y Fontibón, presento dificultades en razón a las medidas cautelares de proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Samaná-Caldas, medidas que afectaron el inicio de la ejecución contractual, pero que han venido siendo superadas. Así las cosas, se programó cronograma de visitas a campo para evidenciar los alcances de obra en todos los 17 colegios, actualmente el contratista trabaja en el informe preliminar, los presupuestos, los cronogramas y la programación de obra; se tiene proyectado fecha para suscripción de acta de inicio el día 5 de enero de 2024.

c. Registro Fotográfico

1. Colegio Manuel Elkin Patarroyo Sede A	
Antes	Después
	
	
2. Colegio Restrepo Millán Sede A	
Antes	Después

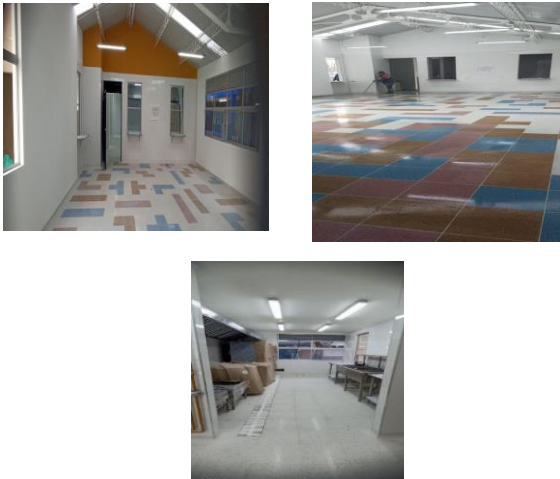	
3. Colegio Isabel II Sede B	
Antes	Después
 	

6.3. Objetivo Específico 3

Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

6.3.1 Producto 3. Infraestructura educativa dotada

Tabla 13. Productos Objetivo 3

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa dotada	107	107	Para la vigencia 2023 se programaron (99) sedes educativas, más (8) que corresponden a la reserva presupuestal 2022. A 31 de diciembre 2023, se continuó la entrega de dotaciones contratadas en la vigencia 2022 justificadas en reserva presupuestal, igualmente se culminó la contratación de las dotaciones con recursos asignados para el 2023, para lo cual se suscribieron 41 compromisos por un valor total de \$101.301.571.963 pesos. Se reporta un cumplimiento al finalizar la vigencia 2023 de ciento siete (107) sedes, de las cuales ocho (8) que corresponden a las programadas para el 2023 en ejecución de los recursos de las reservas presupuestales 2022; que corresponde al 100% de la meta programada para la vigencia.

Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.3.2.1 Meta 3: Dotar las 770 sedes educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial

a. Avances y/o Logros:

De las 770 sedes programadas para dotar en el cuatrienio, es preciso indicar que al finalizar la vigencia 2020 se obtuvo un logro de 57 sedes dotadas, al cierre de la vigencia 2021 el logro obtenido fue de 237 sedes adicionales dotadas, y al cierre de la vigencia 2022, el logro obtenido fue de 295 sedes dotadas; al finalizar la vigencia 2023 se reportan 107 sedes, de las cuales 8 que corresponden a las programadas para el 2023 en ejecución de los recursos de las reservas presupuestales 2022, logrando el cumplimiento del 100% de la meta programada para el 2023; y un logro acumulado de 696 sedes dotadas, durante las vigencias 2020 a 2023, equivalente a un avance acumulado del 90.4% del total programado para el cuatrienio.

Es preciso indicar, que las sedes reportadas hasta finalizar la vigencia 2023, son aquellas que recibieron dotaciones en lo relacionado con mobiliario escolar y administrativo, computadores portátiles y de escritorio, instrumentos musicales, material bibliográfico para las bibliotecas escolares, paquetes con útiles escolares, materiales e implementos deportivos, equipos e instrumentos necesarios para los laboratorios de física, química, ciencias naturales y ambientes de formación, equipos de tecnología; al igual que maquinaria y equipos especializados necesarios para el fortalecimiento de los ambientes de formación en las instituciones educativas, material pedagógico para las instituciones educativas distritales, balanzas para el pesaje de los residuos generados en las sedes principales de las IED, como parte de la gestión y manejo integral de los desechos peligrosos a cargo de la SED y canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarios ubicadas en las IED entre otras.

Para la adquisición de dotaciones de la vigencia 2023, entre enero y diciembre se contrató el grupo de profesionales y técnicos de apoyo que se requieren para asistir las diferentes labores que implican la ejecución de los recursos asignados al proyecto, igualmente se realizaron las adiciones pertinentes para garantizar la prestación del servicio durante los primeros días de la vigencia 2024, para lo cual se comprometieron recursos por valor de \$3.353.539.438 que corresponden a 29 contratos de prestación de servicios profesionales y 24 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, sobre los cuales se registran giros acumulados por valor de \$3.130.338.115 al finalizar diciembre.

A 31 de diciembre de 2023, se realizaron entregas de dotaciones contratadas en la vigencia 2022, justificadas en la reserva presupuestal por valor de \$73.273.651.227, que sumadas a los \$135.864.267 correspondientes a las prestaciones de servicio de los primeros días de enero, alcanzan una ejecución \$73.409.515.494 equivalente al 99,5% de la reserva definitiva. Paralelamente, se adelantaron todos los procesos precontractuales y contractuales programados dentro del plan anual de adquisiciones de la vigencia 2023, logrando la ejecución de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia, los cuales se describen así:

Al finalizar febrero se realizó la adición al CONTRATO DE COMPRAVENTA 101092 DE 2022 suscrito con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS mediante el acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP-2019, para la adquisición de mobiliario escolar y administrativo para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas del nivel central y/o local por valor de \$7.717.504.704; igualmente se adquirieron instrumentos y accesorios musicales para las instituciones educativas distritales, de acuerdo con las necesidades identificadas por valor de \$1.149.705.234 mediante la adición al contrato DE COMPRAVENTA No. 3798306 de 2022 suscrito con CENTRO MUSICAL SAS.

Adicionalmente en marzo, mediante contrato No. 105959 suscrito con la COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, se adquirieron balanzas para el pesaje de los residuos generados en las sedes principales de las instituciones educativas distritales, por valor de \$116.182.570, como parte de la gestión y manejo integral de los desechos peligrosos a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito.

En abril, mediante contrato de compraventa No. 107247 con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. se adquirieron contenedores, puntos ecológicos y canecas para el almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos en el nivel central y local, como parte de la gestión y manejo integral de los desechos a cargo de la SED por valor de \$101.827.110.

En mayo, mediante contrato de compraventa No. 108903 con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. se adquirieron canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarias ubicadas en las instituciones educativas por valor de \$34.653.514, también se suscribieron los contratos de suministro de computadores portátiles y de escritorio No. 109151 y No. 109152 con SISTETRONICS SAS por valor de \$13.508.426.088 y \$14.875.088.536 respectivamente.

En junio, mediante contrato de suministro No. 5068354 con EFFORT COLOMBIA S.A.S. se adquirieron implementos deportivos para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en las instituciones educativas distritales por valor de \$1.955.508.207.

En julio, se realizó la adquisición de maquinaria y equipos especializados para el fortalecimiento de los ambientes de formación de las instituciones educativas distritales por valor de \$3.950.911.374 a través del contrato de suministro No. 5141423 suscrito con ICL DIDACTICA SAS, igualmente se adquirieron equipos de tecnología con destino a las instituciones educativas distritales, nivel central y local, conforme a las necesidades de la SED, por valor de \$6.499.888.368 mediante el contrato de suministro No. 5175276 suscrito con COMPUTEL SYSTEM SAS.

En agosto, se realizó la adquisición de equipos e instrumentos necesarios para los laboratorios de física, química, ciencias naturales y ambientes de formación especializados de las instituciones educativas distritales por valor de \$9.683.309.337 a través del contrato de suministro No. 5274964 suscrito con ICL DIDACTICA SAS.

En septiembre, mediante contrato de suministro No. 5326556 con COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. se adquirieron parques infantiles para el fortalecimiento de los ambientes de formación de las instituciones educativas distritales, por valor de \$504.134.902; los cuales serán instalados de conformidad con el cronograma de entrega de obras en los meses siguientes.

En octubre, mediante contrato No. 5419361 con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, se realizó la adquisición material bibliográfico para las bibliotecas escolares de las instituciones educativas distritales focalizadas, por valor de \$6.865.897.806, igualmente se suscribieron siete (7) órdenes de compra que totalizan \$453.030.692 para la adquisición de material pedagógico para las instituciones educativas distritales, a través del acuerdo marco de precios cce-166-amp-2021 y que a continuación se describen: No. 116911-COMERCIALIZADORA VINARTA SAS, No. 116909-YUBARTA SAS, No. 116908-TECNOPHONE COLOMBIA S A S, No. 116910-COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE DEPORTES SAS, No. 116912- GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS, No. 116923-OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS, No. 116922-JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

En noviembre, mediante contrato No. 119538 con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA, se realizó la adquisición de mobiliario escolar y administrativo a través del acuerdo marco de PRECIOS CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas distritales y áreas administrativas por valor de \$1.964.097.481; así mismo se adquirieron paquetes con útiles escolares para entrega en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital mediante contrato No. 5561184 con COMERCIALIZADORA COMSILA SAS por valor de \$3.999.998.690; igualmente se suscribió el contrato No. 5496296 con AMERICA INDUSTRIAL CORPORATIVO S.A.S por valor \$999.628.851 mediante el cual se entregaran calculadoras graficadoras como parte de la dotación para fortalecer el programa de bachillerato internacional (PBI) en las instituciones educativas distritales focalizadas.

En diciembre, mediante los contratos No. 5674326 con TECNOPROCESOS SAS y No. 5674327 con COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS se adquirieron los diferentes bienes dotacionales requeridos para el funcionamiento de la emisora virtual "EMISED", ubicada en las instalaciones del centro de innovación docente "CIUDAD MAESTRA" de la Secretaría de Educación del Distrito por valor de \$171.070.271. Teniendo en cuenta que, en el mes de diciembre, las directivas del proyecto decidieron adicionar al componente dotaciones, recursos por valor de \$14.372.473.999, fruto de utilidades en las adjudicaciones de otros procesos, con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos

y cubrir necesidades dotacionales previamente identificadas que no se habían atendido por limitaciones presupuestales, se realizaron las siguientes adiciones a contratos en ejecución, así:

Adición por valor de \$11.918.029.086 a los contratos Nos. 109151 y 109152 de 2023 con SISTETRONICS SAS para adquirir computadores portátiles y de escritorio para las instituciones educativas distritales, el nivel central y local de la SED; con el objeto de adquirir equipos de tecnología con destino a las instituciones educativas distritales, nivel central y local se adicionaron \$3.249.612.974 al contrato No. 5175276 de 2023 con COMPUTEL SYSTEM SAS, igualmente se realizó una adición por valor de \$265.775.952 al contrato No. 119538 con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA suscrito a través del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP-2019 para adquisición de mobiliario escolar y administrativo, también se realizó una adición al contrato de suministro No. 5561184 con la COMERCIALIZADORA COMSILA SAS por valor de \$210.836.177 para adquirir paquetes con útiles escolares para entrega a estudiantes vulnerables en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital.

Igualmente, a 31 de diciembre, se invirtieron \$1.332.905.667, para coadyuvar en el financiamiento del contrato de seguros CO1.PCCNTR. No 4973848 con la UNIÓN TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - AXA COLPATRIA SEGUROS, específicamente en la adquisición y prórroga de la póliza Todo Riesgo daño Material, con el fin de salvaguardar las dotaciones, que permitan atender de manera oportuna la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación y sus sedes administrativas.

Asimismo, a septiembre 30, se han comprometido recursos por valor de \$7.832 millones, para el pago de pasivos exigibles por concepto de entrega de equipos de tecnología con destino a las instituciones educativas distritales y mobiliario escolar y administrativo.

Frente a la meta de ***“Beneficiar a 124.579 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”***, a 31 de diciembre de la vigencia 2021 se realizó la entrega de 101.749 dispositivos tecnológicos equivalente a una ejecución de la meta del 101.75%. Para la vigencia 2022 se programó la entrega de 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, para cumplir con la nueva meta del cuatrienio de 124.574 dispositivos tecnológicos, de conformidad con el incremento de meta aprobado por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018

Los avances y logros en referencia a esta meta corresponden a los siguientes antecedentes:

En el 2022, una vez perfeccionado el acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de la tienda virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente, se logró culminar el proceso de adquisición de los 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, mediante la adjudicación de los contratos No. 92352 por valor de \$10.847.269.834,00 con NUEVA ERA SOLUCIONES SAS para la compra de 21.738 tabletas digitales y contrato No. 92353 por valor de \$ 979.930.500,00 con SISTETRONICS SAS, para la compra de 1.087 computadores portátiles, los cuales fueron entregados a 31 de diciembre en la SED; el proveedor, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS argumentó retrasos en los

procesos de importación de los otros 21.738 dispositivos derivado de factores de la logística global en puertos, por lo que fue necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023, y modificar el cronograma de entrega de los equipos a partir de febrero de 2023. Paralelamente en diciembre de 2022 se suscribió el CONVENIO DE ASOCIACION No. 4300430 con la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA, quien previo inicio de las actividades académicas 2023, realiza el apoyo profesional y técnico en el proceso de coordinación logística para las entregas a los estudiantes beneficiados.

En febrero de 2023, se reinició el contrato No. 92352 con NUEVA ERA SOLUCIONES, y se entregaron todas las 21.738 tabletas digitales en los sitios previamente acordados. En el mes de marzo luego del proceso de pre-alistamiento, bajo la coordinación y asesoría técnica y operativa de la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA, se inició la entrega de los dispositivos digitales a los estudiantes beneficiado, según cronograma aprobado.

En este mismo sentido es importante resaltar las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvieron 1.057 provenientes de la Campaña #DonatónPorLosNiños, 2.509 del Grupo de Energía de Bogotá y 140 de la Organización Internacional para las Migraciones, 1.067 dispositivos del Fondo de Desarrollo Local de suba, 5.212 tabletas por parte de PROBOGOTA y 16 de United Way, para un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero de 2023.

A 31 de diciembre se reporta un logro acumulado durante la vigencia 2023 de 31.671 dispositivos entregados, para un total de 134.507 dispositivos entregados hasta la fecha; equivalente al 108% de la meta finalmente programada.

Con estas acciones, se evidencia el cumplimiento de la meta del cuatrienio y se enfatiza en las gestiones realizadas para el incremento de esta meta con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018, lo que se constituye en un hito en la ciudad y en el país, puesto que en los últimos 30 años la Secretaría de Educación había entregado sólo 89 mil dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales.


b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

En el periodo no se presentaron retrasos considerables, solo los imprevistos propios que surgen en la estructuración de este tipo de contratos que se solucionan con oportunas gestiones administrativas por parte de las diferentes áreas responsables en la SED.

Es pertinente mencionar que la planificación y entrega de dotaciones a las instituciones educativas están supeditadas, en parte, a los avances e imprevistos propios de las obras de infraestructura, por lo cual se modifican los cronogramas de entregas en caso de que se requiera o se reciben las dotaciones en el término de ejecución de los contratos y se almacenan los bienes dotacionales. Así

mismo, una sede educativa se va dotando en el transcurso de cada vigencia a través de diferentes contratos, estos aspectos inciden en la oportunidad del reporte de avance de la meta anual, el cual se realiza cuando las entregas de dotaciones concertadas se encuentren en un estado avanzado y se han dotado con más de una familia de elementos.

c. Registro Fotográfico



6.4. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto

El plan de adquisiciones del proyecto 7638 programó 88 ítems para el cuatro trimestre de la vigencia, y se ejecutaron 100 ítems. La ejecución del PAA por componente se dio de la siguiente manera:

01 Construcción: en el PAA se programaron 33 ítems que corresponden a procesos de obra e interventorías y modificaciones contractuales, de los cuales fueron ejecutados 33.

02 Mejoramientos: Para el componente de mejoramientos en el cuarto trimestre del 2023 se programaron 26 ítems en el PAA, los cuales fueron comprometidos en su totalidad.

03 Dotaciones: En el cuarto trimestre de la vigencia 2023 fueron programados 29 ítems en el PAA, y se ejecutaron 41 contratos. De los ítems ejecutados 5 corresponden a adiciones a contratos en ejecución para adquisición de dotaciones, catorce (14) se ejecutaron para la adquisición de nuevas dotaciones, se observa una diferencia con respecto a los ítems programados ya que en el proceso para la adquisición de material pedagógico se suscribieron siete (7) contratos y dos (2) en el proceso de dotación de la emisora; Igualmente se suscribieron diecinueve (19) adiciones contractuales a contratos de prestación de servicios y uno (1) para adicionar el contrato de seguros para salvaguardar las dotaciones y 2 compromisos derivados de pasivos exigibles.

Tabla 14. Plan de Adquisiciones tercer trimestre 2023

COMPONENTE	OBJETO DE GASTO	N.º DE	N.º DE	VALOR EJECUTADO
		CONTRATOS PROGRAMADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	
01 CONSTRUCCION Y TERMINACION	Compra de lotes, diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa nuevas y existentes en modalidades de: colegio nuevo, restitución, terminación o ampliación y/o adicionales	24	24	\$200,379,706,387
	Suministrar el personal de apoyo profesional y técnico para garantizar la adecuada ejecución del proyecto	9	9	\$137,675,967
02 MEJORAMIENTOS	Adelantar diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento menor complementarias a la infraestructura de los colegios distritales y/o adicionales	22	22	\$29,170,652,023
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar los inmuebles de propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito, bajo su responsabilidad, tenencia, control y/o custodia.	0	0	\$0
	Pago de arrendamientos de bienes inmuebles, para garantizar el derecho a la educación, durante la ejecución de obras	4	4	\$1,200,123,586
03 DOTACIONES	Dotar mobiliario, equipos, maquinaria, herramientas e implementos de cómputo, tecnología, comunicaciones, audiovisuales, laboratorio, taller, recreación, deporte, cocina y comedor, recursos bibliotecas, arte, cultura, instrumentos y su mantenimiento.	9*	19**	\$30,097,977,980
	Garantizar el personal de apoyo profesional y técnico en la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; así como el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución del componente.	19	19	\$118,956,766
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar las dotaciones para atender la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación, y sus sedes administrativas.	1	1	\$554,944,667
	Pagar Pasivos exigibles	0	2	\$1,941,940,987
	Total	88	100	\$263,601,978,363

*Se programaron 9 ítems de los cuales 5 corresponden a adiciones a contratos en ejecución que fueron suscritas conforme a lo programado.

**A 31 de diciembre a se ejecutaron 19 contratos, la diferencia con los ítems programados se explica; en que en el ítem correspondiente al proceso para la adquisición de material pedagógico se suscribieron siete (7) contratos, igual sucedió con el ítem para el proceso de dotación de la emisora donde se suscribieron dos (2) contratos, los restantes corresponden a ítems que se iniciaron en el trimestre anterior conforme a lo programado en el PAA, pero su adjudicación y compromiso se refleja en el cuarto trimestre.

7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

7.1. Meta Plan 91.

Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, En lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

7.1.1. Avances, logros y compromisos

En el marco de la ejecución de la meta (91) Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, a la fecha se han terminado y/o entregado 33 colegios, y 2 colegios más, cuentan con entrega parcial y, actualmente, se encuentran en proceso de legalización de acta para el respectivo reporte en meta, generando 32.511 cupos para la ciudad: (11) colegios fueron terminados en el 2023, (11) colegios y sedes de primera infancia fueron terminados/entregados en el año 2022, (7) proyectos más fueron terminados /entregados en la vigencia 2021 y (4) proyectos más fueron terminado en la vigencia 2020.

Es así como, en la vigencia 2023 se proyectó como meta la terminación de 6 proyectos de obra, y se logró la terminación de 11 colegios (9 colegios y 2 sedes de primera infancia): 1. María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes, la cual beneficiara a 180 niños, 2. Ana Mercedes Hoyos Mejía-Fontana grande, ampliando la cobertura en 225 cupos, estos ubicados en la localidad de Suba, 3. El Colegio Lucia Rubio de Laverde - Porvenir de la localidad de Engativá que beneficiara a 1040 niños, niñas y jóvenes de la localidad, 4. El Colegio Ciudad de Chengdu (Bolonía) de la localidad de Usme, el cual beneficiara a 550 niños de la localidad, 5. Villemar el Carmen sede C, ubicado en la localidad de Fontibón, la cual beneficiará a 800 niños, 6. Arborizadora Alta, la cual beneficiara a 2240 niños, en la localidad de Ciudad Bolívar, 7. El colegio San Francisco de Asís ubicado en Los Mártires, el cual beneficiará a 600 niños, 8. El colegio Jaime Niño Diez, de la localidad de Suba, el cual beneficiara 520 niños de la localidad de Suba, 9. el colegio La Merced – de la localidad de Puente Aranda, la cual beneficiará a 2440 niños, 10. El colegio los pinos – de la localidad de Santa Fe, la cual beneficiará a 1120 niños y 11. Primera etapa del Colegio Teresa Martínez de Varela – La Magdalena de la localidad de Kennedy, con capacidad para 1680 estudiantes.

7.1.2. Retrasos y soluciones

A corte del reporte no se presentan retrasos o dificultades en los proyectos de obra que están en ejecución o próximos a iniciar.

7.1.3. Beneficios

En el marco del cumplimiento de la meta plan de desarrollo, Con los colegios terminados y/o entregados a corte 31 de diciembre 2023, se amplió la cobertura en 32.511 cupos nuevos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Fontibón, Tunjuelito, Antonio Nariño, San Cristóbal, Suba, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, y Usme.

Se proyecta que las obras que se encuentran en ejecución beneficiarán a más de 22.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Antonio Nariño, Fontibón, San Cristóbal, Tunjuelito, y Engativá, aportando de esta manera al cierre de brechas de acceso y permanencia en la educación con equidad e igualdad en la ciudad.

7.2 Meta Plan 90:

“Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”

Es necesario precisar, que la nueva meta para el cuatrienio quedó establecida en 124.574 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso, de conformidad con el incremento de 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, aprobado por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, con el fin de llegar al total de estudiantes de educación secundaria y media de colegios públicos que no cuentan con equipos en sus hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018, lo anterior teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2021 la meta 90 inicial, ya se encontraba cumplida al 101.75%.

7.2.1 Avances, logros y compromisos

A 31 de diciembre de 2021 la SED realizó la entrega de 101.749 (96.183 tabletas y 5.566 portátiles) dispositivos tecnológicos, logrando una ejecución de la meta del 101,75%. Estos dispositivos fueron entregados a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes, a su vez, las entregan a estudiantes vulnerables beneficiados en la focalización de colegios oficiales del Distrito de grados 6º a 11º. Es preciso indicar que la SED adicional a lo anterior, realizó gestiones para recolectar el mayor número de dispositivos tecnológicos para conectar con la educación a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables de colegios públicos de la capital. A la fecha se ha realizado la recolección y entrega de 3.706 dispositivos adicionales (Donaton:1057 dispositivos, Grupo de Energía de Bogotá: 2.509 dispositivos y Organización Internacional para las Migraciones: 140 dispositivos) logrando así un total de 105.455 equipos entregados.

Conforme a lo previsto en la planeación del proceso, a 31 de diciembre de 2021 se culminó la respectiva distribución y entrega de los 101.749 dispositivos adquiridos, en instituciones educativas distritales de las localidades, para estudiantes vulnerables focalizados de los grados de sexto a undécimo. Lo anterior implicó realizar las respectivas pruebas técnicas y alistamiento de estos, en razón al proceso de fabricación, transporte y alistamiento de nuevos dispositivos. Estos dispositivos están particularmente orientados a estudiantes de educación secundaria y media de las instituciones

educativas oficiales de la ciudad (según el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT), quienes se priorizan a partir de los criterios de pobreza, ruralidad y pertenencia a poblaciones de especial protección constitucional (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, entre otros).

Es pertinente mencionar que el logro de la meta “100.000 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”, estaba previsto para ser alcanzado a lo largo del cuatrienio, conforme lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del SIGLO XXI”. Sin embargo, la SED adelantó todos los procesos jurídicos, administrativos y contractuales que permitieron cumplir anticipadamente la meta.

En la vigencia 2022, observando que al cierre de 2021 la meta ya se encontraba cumplida con la entrega de los 101.749 dispositivos tecnológicos a las Instituciones Educativas Distritales (IED), quienes a su vez los entregan a los estudiantes focalizados; y que para el 2022 se apropiaron recursos para este propósito; en el primer trimestre, se tramitó ante la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, un incremento de la magnitud del indicador de esta meta el cual fue aprobado, y que se fundamentó en la necesidad de igualar en la vigencia 2021 la meta programada, al logro obtenido de 101.749 , y para la vigencia 2022 incrementarla en 22.825 con el fin de cubrir el déficit de estudiantes de colegios públicos sin computador o tableta en sus hogares; conforme a los resultados de la encuesta de Calidad de vida DANE 2018, por lo que al cierre del trimestre la meta quedo reprogramada en **“124.574 estudiantes beneficiados con conectividad y dispositivos de acceso”**.

Luego de culminar el trámite administrativo y presupuestal interno, con la modificación de la ficha de formulación del proyecto de inversión 7638 Versión 30, que nos permite reportar el cumplimiento como logros de la meta 90 para la actual vigencia; al finalizar el mes de junio, los estudios previos para la adquisición de los dispositivos obtuvieron su aprobación y se radicó el proceso de adquisición de los 22.825 nuevos dispositivos tecnológicos, mediante adhesión al acuerdo marco de precios No. CCE-280-AMP-2021 en el portal de TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, logrando la adjudicación de dos (2) contratos mediante los cuales se adquirieron los 22.825 dispositivos de acceso para la conectividad programados para el 2022; a través de los contratos de compraventa No. 92352 por valor de \$10.847.269.834,00 con NUEVA ERA SOLUCIONES SAS para la compra de 21.738 tabletas digitales y contrato No. 92353 por valor de \$ 979.930.500,00 con SISTETRONICS SAS, para la compra de 1.087 computadores portátiles.

En los primeros días del mes de julio 2022, una vez superada la etapa de constitución y aprobación de garantías, se firmaron las actas de inicio de los contratos de compraventa; a 31 de diciembre, todos los equipos ya habían culminado su etapa de fabricación; el proveedor SISTETRONICS SAS realizó la entrega de 1.087 computadores portátiles a la SED; el otro proveedor, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS argumentó retrasos en los procesos de importación de los otros 21.738 dispositivos derivado de factores de la logística global en puertos de China a Colombia, por lo que fue necesario suspender el contrato hasta el 30 de enero de 2023, y modificar el cronograma de entrega de los equipos, previo inicio de las actividades académicas.

En febrero de 2023, se reinició el contrato No. 92352 con NUEVA ERA SOLUCIONES, y se entregaron todas las 21.738 tabletas digitales en los sitios previamente acordados. En el mes de marzo luego del

proceso de pre-alistamiento, bajo la coordinación y asesoría técnica y operativa de la UNION TEMPORAL EDUCACION INCLUSIVA en ejecución del contrato No. 4300430, se inició la entrega de los dispositivos digitales a los estudiantes beneficiados.

Por otra parte es importante resaltar las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvieron 1.057 provenientes de la Campaña #DonatónPorLosNiños, 2.509 del Grupo de Energía de Bogotá y 140 de la Organización Internacional para las Migraciones, 1.067 dispositivos del Fondo de Desarrollo Local de suba, 5.212 tabletas por parte de PROBOGOTA y 16 de United Way, para un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero, teniendo en cuenta que estos dispositivos no se habían reportado como logros de esta meta.

A 31 de diciembre se reporta un logro acumulado durante la vigencia 2023 de 31.671 dispositivos entregados, para un logro total acumulado de 134.507 dispositivos entregados hasta la fecha, equivalente al 108% de la meta finalmente programada.

7.2.2 Beneficios

Las acciones adelantadas en el marco de la ejecución de los contratos para adquirir dispositivos de acceso y equipos portátiles, a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, permitieron de forma determinante contribuir al cierre de las brechas digitales en el Distrito Capital, aspecto asociado directamente a la meta del Plan de Desarrollo Distrital definida como “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables, con la entrega de los dispositivos de acceso y conectividad para contribuir al cierre de brechas digitales”; que, junto con las gestiones adicionales realizadas por la SED, nos permite reportar un logro a la fecha de 134.507 estudiantes vulnerables matriculados en los establecimientos educativos oficiales, beneficiados.

7. CONCLUSIONES

La administración distrital de la Alcaldesa Claudia López, tuvo especial preocupación por cerrar las brechas de acceso, permanencia y calidad que actualmente tiene la ciudad entre poblaciones y territorios, con énfasis especial en la zona rural. Así es que uno de los programas planteados por el plan de desarrollo 2020-2024, estuvo orientado a lograr una “Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. En consonancia con lo anterior, el Acuerdo 761 de 2020 y el Acuerdo 840 de 2022, estableció como proyecto estratégico la construcción y dotación de infraestructura educativa para el desarrollo de la jornada única, la primera infancia y educación inclusiva, con mejores ambientes de aprendizaje para la educación del siglo XXI, ampliación de la cobertura con énfasis en las localidades más deficitarias, disminución de brecha digital, actualización de la dotación escolar, entre otros.

Conforme a lo anterior, la administración distrital ha venido desarrollando 71 (31 restituciones y 40 colegios nuevos); de estos 33 han sido terminados y/o entregados. Es importante precisar que, 2

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

colegios más cuentan con entrega parcial y, actualmente, se encuentran en proceso de legalización de acta para el respectivo reporte en meta generando 32.511 cupos para la ciudad.

Adicionalmente 10 proyectos se encuentran en ejecución de obra o próximos a iniciar obra, 16 con obra contratada o garantizada (y en distinto avance de consultoría) y 10 en diseño para gestión de recursos para la ejecución de la obra por parte de la nueva Administración.

A continuación, se relación los colegios terminados / entregados:

Tabla 15 Proyectos terminados y/o entregados Meta 91

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
1	Bosa	Colegio Nuevo	Colegio de la Bici	1.120
2	Kennedy	Restitución	Carlos Arango Vélez	986
3	La Candelaria	Restitución	La Candelaria	440
4	Engativá	Restitución	Tabora	1.545
5	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Sierra Morena - Parque (El Nogal)	1.120
6	Kennedy	Colegio Nuevo	Ciudad Techo I	550
7	Fontibón	Ampliación	Integrado de Fontibón – Sede B	620
8	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde I (Laurel de Cera)	1.040
9	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde II (Parques de Bogotá)	1.040
10	Engativá	Restitución	Laureano Gómez	1.545
11	Tunjuelito	Restitución	Rafael Uribe Uribe	1.480
12	Antonio Nariño	Restitución	Guillermo León Valencia	720
13	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Ángela Restrepo Moreno	1.040
14	San Cristóbal	Colegio Nuevo	Gloria Valencia de Castaño	1.040
15	Bosa	Colegio Nuevo	Esmeralda Arboleda Cadavid	1.560
16	Bosa	Colegio Nuevo	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio	1.040
17	Bosa	Colegio Nuevo	Laura Herrera de Varela	1.040
18	Engativá	Colegio Nuevo	Abel Rodríguez Céspedes	1.040
19	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Villas del Progreso - Porvenir VII	225
20	Kennedy	Colegio Nuevo – primera infancia	Gabriel Betancourt Mejía / Villa Mejía Tagaste	225
21	San Cristóbal	Restitución	República del Ecuador	1.105
22	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Bosa Brasilia / Porvenir IV	225
23	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes	180
24	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande	225
25	Engativá	Colegio Nuevo	Lucia Rubio de Laverde - Porvenir	1.040

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE–DICIEMBRE 2023

Proyecto 7638

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
26	Usme	Colegio Nuevo	Ciudad, Chengdú – predio Bolonia	550
27	Fontibón	Restitución	Villemar el Carmen	800
28	Ciudad Bolívar	Restitución	Arborizadora Alta	2.240
29	Los Mártires	Restitución	San Francisco de Asís	600
30	Suba	Colegio Nuevo	Jaime Niño Diez - Lombardía	520
31	Santa Fe	Restitución	Los Pinos	560
32	Puente Aranda	Restitución	La Merced	1.220
33	Kennedy	Restitución	Teresa Martínez de Varela- La Magdalena *	1.680
34	Kennedy	Colegio Nuevo	Feliza Bursztyn – Hipotecho*	1.040
35	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Agudelo Restrepo – Bonavista*	1.110

*Terminación parcial

Así mismo se han intervenido con mejoramientos y atención a emergencias la infraestructura de 692 sedes educativas con 1.109 intervenciones desde la vigencia 2020 a 2023, beneficiando a más de 900.000 estudiantes de las 20 localidades, garantizando así ambientes escolares en los que puedan desarrollar todo su potencial académico, deportivo, artístico y científico.

Adicionalmente en las vigencias 2020, 2021 y 2022, se desarrollaron actividades de demarcación, dotación con elementos de bioseguridad, y mantenimiento de estos; con estas acciones se garantizaron ambientes de aprendizaje adecuados y que cumplieran con la normatividad para un retorno progresivo gradual y seguro en modalidad de alternancia de los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad educativa.

Es preciso aclarar que, la fluctuación de precios en insumos para las obras de construcción y disponibilidad de mano de obra local sigue generando afectación en los cronogramas de trabajo para la ejecución de las obras, sin embargo, la entidad ha adelantado las acciones técnicas y jurídicas necesarias, con el fin de minimizar el riesgo en el cumplimiento de las metas trazadas para la vigencia y la ejecución presupuestal.

En relación con los dispositivos tecnológicos, las gestiones adicionales adelantadas por la SED, con el fin de conseguir más equipos y así aumentar la cobertura relacionada con el beneficio de más estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos tecnológicos, se obtuvo un total de 10.001 dispositivos adicionales que se reportaron en febrero, teniendo en cuenta que estos dispositivos no se habían reportado como logros de esta meta; y que sumados con los dispositivos que se entregaron hasta el 31 de diciembre de 2023, nos permite totalizar un logro acumulado de 134.507 dispositivos entregados a la fecha, equivalente al 108% sobre el total de 124.574 dispositivos total programado para esta meta durante el cuatrienio.

Por otra parte, durante el cuarto trimestre del 2023, se continuó con la entrega de las dotaciones contratadas durante la vigencia 2022 registrando entregas por valor de \$73.410 millones, el reporte de cumplimiento en lo corrido de la vigencia 2023 es de 107 sedes dotadas, de las cuales 8

corresponden a las programadas para el 2023 en ejecución de los recursos de las reservas presupuestales 2022, logrando el cumplimiento del 100% de la meta programada para el 2023; y un logro acumulado de 696 sedes dotadas, durante las tres vigencias anteriores y la vigencia 2023, equivalente a un avance acumulado del 90.4% del total programado para el cuatrienio.

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Gerente de Proyecto

Preparó: Luis Alberto Cantor Bello – Profesional contratista DDE
Maryid Betty Castaneda Romero – Profesional contratista DDE
Sandra Galeano – Profesional contratista DCCEE
María Aydee Jiménez Porras – Profesional contratista DCCEE

Revisó: Liliana Díaz Poveda - Directora de Dotaciones
Jeysson Daza – Asesor SAP

