



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

Radicado N°

I-2024-87348

Fecha: 30-07-2024 - 09:28

Folios: 1 Anexos:

Radicador: CESAR UBALDO BAEZ BAEZ - 1700

Destino: 1100 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación:

S6LI3

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 de abril a 31 de mayo de 2024

**INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO 7813**

RICARDO ABAD CHACÓN IBARRA
GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7813
OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Elaborado por:
CÉSAR UBALDO BÁEZ
Junio 18 DE 2024



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
1.1 <i>Objetivo General</i>	3
1.2 <i>Objetivos Específicos</i>	3
2. ALCANCE DEL PROYECTO	3
3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	4
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)	4
5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4
5.1. <i>Ejecución Presupuestal Acumulada</i>	4
5.2. <i>Ejecución Presupuestal por Componente de Gasto</i>	5
5.3. <i>Ejecución Reservas Presupuestales</i>	5
6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	6
6.1. <i>Objetivo Específico 1.</i>	6
6.1.1. <i>Producto Servicios de información implementados</i>	6
6.1.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	6
6.2. <i>Objetivo Específico 2.</i>	9
6.2.1. <i>Producto Servicios tecnológicos</i>	9
6.2.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	9
6.2.3. <i>Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto</i>	11
7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	12
7.1. <i>Meta Plan 1. 100% de colegios públicos operando (92)</i>	12
8. CONCLUSIONES	14

Lista de Gráficos

Gráfico 1 Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2024	4
Gráfico 2 Ejecución Presupuestal por componentes a 31 de mayo de 2024 (En millones de pesos)	5

Lista de Tablas

Tabla 1 Ejecución reservas a 31 de mayo de 2024	5
Tabla 2 Producto Objetivo 1	6
Tabla 3 Producto Objetivo 2	9
Tabla 4 Contratos segundo trimestre 2024	11

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 Objetivo General

Fortalecer, modernizar y optimizar la plataforma tecnológica de la SED, que permita la integración, seguridad de los datos y reporte de información de los colegios oficiales del Distrito Capital.

1.2 Objetivos Específicos

Implementar la migración de sistemas de información, así como la renovación de los licenciamientos que soportan la plataforma tecnológica de la entidad en sus procesos misionales, estratégicos y operativos.

Modernizar la infraestructura de TI que permita la implementación de servicios de Conectividad y WIFI para los tres niveles de la entidad (central, local e institucional).

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Dentro de las obligaciones de la Secretaría de Educación del Distrito se tiene la de adelantar planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento. La cobertura de la población objetivo alcanza los 364 colegios, 37.219 docentes y administrativos y 747.029 estudiantes. Cada uno de los actores de la demanda descrita son usuarios de alguna (s) de las soluciones tecnológicas provistas por la Secretaría. Este nivel de la demanda y lo cambiante de sus necesidades, comprometen a la SED a garantizar la cobertura y prestación ininterrumpida de los servicios TIC que la comunidad educativa requiere.

Al iniciar el 2020, la SED no contaba con una plataforma tecnológica actualizada y que hiciera uso de nuevas tecnologías y arquitecturas, lo que incide en la correcta gestión de la información y en la satisfacción de los usuarios de los servicios tecnológicos de la entidad. Las instalaciones físicas de los dos (2) centros de datos (DATA CENTER) no son aptas para albergar los equipos de servidores, y componentes que permiten el funcionamiento de la Red LAN y sus elementos de conectividad, encontrando que no cumplen con los estándares mínimos de almacenamiento y respaldo de las operaciones que soportan la plataforma tecnológica. La transición hacia una infraestructura moderna, confiable y capaz se está realizando, gracias a los recursos aprobados del presente proyecto de inversión.

El proyecto se está desarrollando en dos componentes: 1) Innovación y Migración de la Plataforma TI y 2) Conectividad y Modernización de la Infraestructura TI. El primer componente consiste en dotar y renovar las Aplicaciones y desarrollo de nuevos sistemas de información que soporten los procesos misionales, operativos y estratégicos de la SED en sus tres niveles, así como adelantar la migración de la plataforma tecnológica de la Entidad. Su objetivo, cuyo producto clave son los servicios de información implementados, comprende los sistemas de información que integran o centralizan la gestión de la información dentro de la entidad.

El segundo componente está relacionado con las soluciones de conectividad Wifi implementadas en los tres niveles de la SED y el proceso de modernización y soporte de la plataforma tecnológica

necesario para asegurar la disponibilidad de los servicios TIC que la OTIC provee a la Secretaría. En el segundo componente se completarán las siguientes actividades:

1. Disponer la prestación del servicio de conectividad con enlaces de ancho de banda con velocidades de hasta 512Mb, para las sedes educativas habilitadas.
2. Continuar con la incorporación de nuevas tecnologías a través de la implementación de soluciones Wifi.
3. Gestionar las acciones que permitan la modernización de la infraestructura tecnológica de la Secretaría de Educación y la continuidad de los Servicios de TI en los 3 niveles institucionales (en el Nivel Central, Local e Institucional)

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

N/A

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)


N/A

5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

El Proyecto tiene una asignación presupuestal vigente para el 2024 de \$126.090.396.467, de los cuales se han comprometido \$82.324.308.919 y se han girado recursos por valor de \$11.191.632.553, faltando por ejecutar un saldo de \$43.766.087.548 a corte 31 de mayo de 2024.

5.1. Ejecución Presupuestal Acumulada

Gráfico 1 Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2024

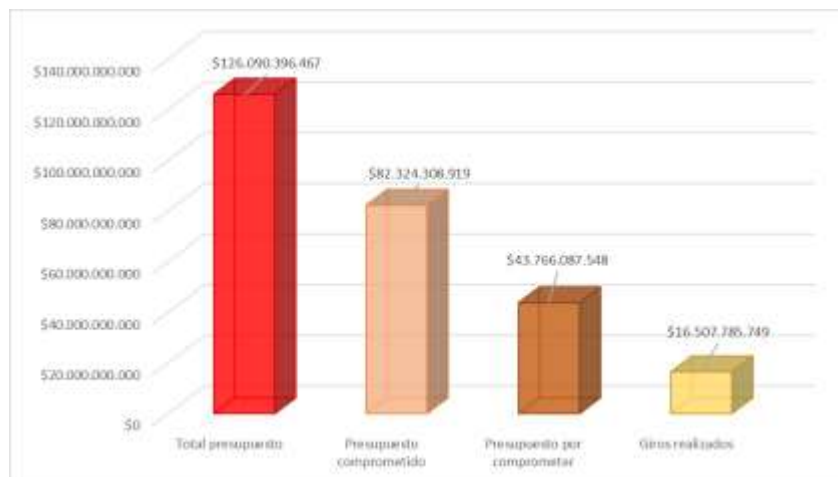

Fuente: Elaboración propia a partir de reporte del sistema Apoteosys

5.2. Ejecución Presupuestal por Componente de Gasto

Frente a los componentes del proyecto, este se desarrolla a través de 2 componentes: 1. INNOVACION Y MIGRACION DE LA PLATAFORMA DE TI, 2. CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI. Los cuales cuentan con una ejecución del 75.1% y 63.8%, respectivamente.

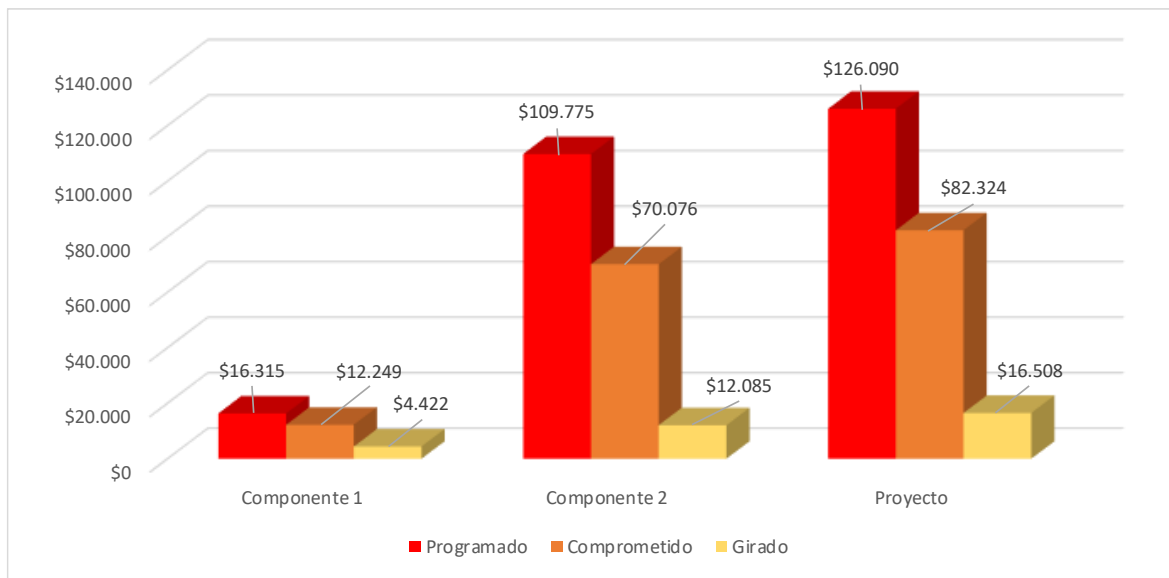


Gráfico 2 Ejecución Presupuestal por componentes a 31 de mayo de 2024 (En millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de reporte del sistema Apoteosys

5.3. Ejecución Reservas Presupuestales

Tabla 1 Ejecución reservas a 31 de mayo de 2024

Componente	Reservas Constituidas	Anulaciones	Reservas Giradas	% de Giro
	a 31/12/2023	31/05/2024	a 31/05/2024	
Componente 1	\$ 812.353.659	\$0	\$707.579.623	87,10%
Componente 2	\$ 16.485.054.802	\$0	\$10.484.052.930	63,60%
Total	\$ 17.297.408.461	\$0	\$11.191.632.553	64,70%

Fuente: Reporte del sistema Apoteosys

6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

6.1. Objetivo Específico 1.

Implementar la migración de sistemas de información, así como la renovación de los licenciamientos que soportan la plataforma tecnológica de la entidad en sus procesos misionales, estratégicos y operativos

6.1.1. Producto Servicios de información implementados

Tabla 2 Producto Objetivo 1

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Servicios de información implementados	10	10	Se actualizó HUMANO a la versión 23.06.031H y se hicieron mejoras sobre MUVI, Apoyo Escolar, SIDRE y SiMeConoces. También, se relanzó el sistema de Primera Infancia. Se garantiza disponibilidad de todos los sistemas de información, incluyendo los 10 sistemas objeto del proyecto de inversión.

Fuente: Elaboración propia

6.1.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.1.2.1. Meta 1:

Dotar y renovar las 10 Aplicaciones y desarrollo de nuevos sistemas de información que soporten los procesos misionales, operativos y estratégicos de la SED en sus tres niveles, así como adelantar la migración de la plataforma tecnológica de la Entidad.

a. Avances y/o Logros:

En el segundo trimestre de 2024 se avanzó con las labores de integración de siguientes sistemas:

1. Las mejoras en **MUVI** permiten un mejor conocimiento de los estudiantes y sus actividades de preferencia. También se garantiza el conocimiento de la normativa de salud y seguridad en el trabajo aplicable a los entornos estudiantiles.
2. Se da cumplimiento a las disposiciones legales, permitiendo la generación oportuna y completa del Certificado de ingresos y retenciones, desde el sistema **HUMANO**.

Lo anterior, complementa la meta de 10 sistemas de información integrados al finalizar el 2023, año en el que se tuvieron los siguientes avances:

1. Con el trabajo conjunto entre la fábrica de software (Contrato CO1.PCCNTR.3133232) y el equipo de Sistemas de Información de la OTIC, se avanzó en la actualización **del Sistema de Apoyo Escolar (SAE)**. Se logró la integración del módulo de Asistencias Técnicas a Colegios y se con la respectiva generación de reportes de este módulo. El módulo de Fotografía ha tenido un lanzamiento inicial. Este sistema también ha tenido ajustes de usabilidad (look and feel) y la adición de mecanismos para la auditoría informática. Se añade, el anuario virtual y el módulo de asignación académica. El relanzamiento del **Sistema de Atención a la Primera Infancia SIAI** facilita el seguimiento y control de las atenciones prestadas a los niños en las Instituciones Educativas.
2. Se diseñó, desarrolló e implementó la plataforma **SISPID** (Premio a la Innovación Docente), que tiene como finalidad registrar, validar y evaluar los mejores "...trabajos de investigación, innovación y/o experiencia pedagógica demostrativa, presentados por las y los docentes y directivos docentes del sistema educativo oficial de Bogotá, D.C". Se crea la marca del Premio a la innovación docente, con el apoyo del área funcional, técnica y el equipo de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, después de casi 17 años se implementa un Sistema para el Premio a la Innovación.
3. La aplicación **SIDRE** se ha implementado y mejorado para visualizar solo las vigencias a las que se les asignó presupuesto. Esta modificación en SIDRE evitan que se comenten errores de gestión presupuestal en las IED y reprocesos por devoluciones de solicitudes de dotación.
4. **HUMANO** ha implementado el módulo de integración con FOMAG, avanzando en el módulo de pensiones y auxilios, que simplifica la solicitud de pensión, al disponer del proceso totalmente en línea. También se hizo la actualización del formato de reporte de ingresos y retenciones, atendiendo a las últimas disposiciones de la DIAN.
5. La construcción de tableros para el docente orientador, junto con la implementación de un lago de datos para **SMECE**. Este lago de datos es una funcionalidad que permite el análisis de información que no tiene relación aparente ni comparte el mismo formato, generando posibilidades de búsqueda y extracción de información, antes insospechadas. Con lo anterior, se obtienen mejores cálculos y presentación de los tableros e indicadores.
6. En la integración **POA-EGD** se desarrolló el módulo para gestionar el equipo auditor, una funcionalidad para administrar el listado de auditores que prestan servicios a la OCI; en la que se realizan consultas, asignaciones y retiros.
7. **SACE** - Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar es una iniciativa que hace parte del Plan de Desarrollo de Bogotá, es un sistema donde se lleva a cabo el seguimiento y monitoreo de los "convenios de cooperación" realizados con entes nacionales e internacionales. Partiendo del diseño de dos formularios web para la Demanda y Registro de la Información histórica para el sistema SACE, y durante el 2021 se dio inicio a la "segunda fase", la cual comprende el diseño, desarrollo e implementación de SACE. Este sistema se lanzó en noviembre de 2021.



8. **Brechas Digitales** que permite llevar el registro y control de los elementos de conectividad asociados a los dispositivos entregados, además de permitir el registro de los préstamos de los Administrativos, Docentes y Contratistas
9. Como parte de las estrategias de acceso y permanencia en la educación postmedia, el equipo de Sistemas de Información implementó **Jóvenes a la U**, a través del cual se cumplirá la meta de 20.000 nuevos cupos en educación superior en línea, con los módulos de inscripción, registro, legalización y seguimiento de beneficiarios.
10. **Vacantes Provisionales** es el sistema que gestiona el proceso de cubrimiento provisional de vacantes sobre la planta Docente, agilizando los procesos de selección y de vinculación de docentes provisionales e impactando en las instituciones educativas que presentan la necesidad de cubrir la ausencia de un docente en las Aulas escolares.

Durante el presente trimestre, la OTIC atendió 3105 solicitudes y requerimientos de sistemas de información, y realizó la creación de 148 micrositos y encuestas web.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

Ninguno

6.2. Objetivo Específico 2.

Modernizar la infraestructura de TI que permita la implementación de servicios de Conectividad y WIFI para los tres niveles de la entidad (central, local e institucional)

6.2.1. Producto Servicios tecnológicos

Tabla 3 Producto Objetivo 2

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Servicios Tecnológicos	651	651	Se garantiza el 100% de los servicios de tecnología para las instituciones y sedes administrativas de la SED, como son conectividad, acceso a sistemas de información de la SED, seguridad digital y comunicaciones vía internet. Dichos servicios se encuentran soportados por un Operador Tecnológico, responsable de mantener los más altos niveles de disponibilidad y el mejor rendimiento posible.

Fuente: Elaboración propia

6.2.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.2.2.1. Meta 2:

Dotar a 651 sedes educativas de conectividad a través de enlaces de internet, dotación de soluciones wifi, así como la modernización de la infraestructura de TI sobre la cual opera la plataforma tecnológica de la entidad.

c. Avances y/o Logros:

CONECTIVIDAD ETB

Durante el segundo trimestre de 2024, se dio continuidad al Contrato Interadministrativo 3766719 de 2022, ejecutando la cuarta modificación a este contrato; mediante el cual se prestaron los servicios de conectividad en los tres niveles institucionales de la Secretaría de Educación, así mismo se prestó el servicio de filtrado de contenido para los enlaces de internet en la Sedes Educativas Distritales como el servicio de monitoreo de los enlaces.

Durante este periodo se realizaron los siguientes procesos en procura de ampliar y mejorar la conectividad en la Entidad:

- 1 sede se realizó la ampliación del enlace de Internet Dedicado a 100M.
- 4 sedes se inició proceso de reactivación del enlace de comunicaciones.
- 78 sedes se gestionó la reducción del enlace de un ancho de banda a 512 M a un nuevo ancho de banda a 256M
- 2 traslados externos de enlace de comunicaciones en sedes educativas urbanas.

IMPLEMENTACION SOLUCIONES WIFI

Frente al proceso de una posible implementación de WIFI en sedes educativas, desde la OTIC se celebran reuniones técnicas con el fabricante de la solución estandarizada e instalada anteriormente para buscar alternativas de crecimiento e integración de nuevas implementaciones, así mismo validaciones de condiciones de servidores de monitoreo e integración en la nube.

CABLEADO ESTRUCTURADO

El proyecto de cableado estructurado cuyo objeto es “REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, FIBRA ÓPTICA, RED ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE RED, EN LOS TRES NIVELES DE LA SED”, el día 8 de febrero del 2024 se da inicio al estudio de mercado, con fecha de finalización 15 de febrero, el presupuesto asignado es de seis mil seiscientos sesenta y seis millones seiscientos veintiséis mil doscientos ochenta y cuatro Pesos (\$6.666.626.284) M/Cte Iva Incluido, de los recursos asignados por SGP-84-2024, durante el mes de marzo se está en proceso de actualización de los documentos estudios del sector y costos, precios techo, anexo técnico, análisis de las cotizaciones, anexo cantidades estimadas.

Adicionalmente, mediante el Operador tecnológico, se han realizado 40 intervenciones menores de cableado estructurado, orientadas especialmente a reparaciones y traslados al interior de cada edificación.

HIPERCONVERGENCIA

La solución de Hiperconvergencia HCI, que facilita la administración de los servidores que alojan los diferentes sistemas de información y sus componentes clave, mediante la distribución de los recursos de hardware (CPU, RAM), cuando los sistemas lo requieran, de forma inmediata y sin que se presente una interrupción de servicios para el usuario final, se encuentra en operación y se cuenta con un equipo de profesionales para el mantenimiento y soporte.

TRANSICIÓN IPV4 A IPV6

El proyecto fue finalizado en octubre de 2023, actualmente se realiza monitoreo al comportamiento de la red, bajo este nuevo protocolo de comunicaciones.

DATA CENTER ALTERNO

La adecuación del datacenter alternativo se está llevando a cabo y para el segundo trimestre de 2024, se completaron las siguientes actividades:

De la fase I que corresponde al suministro e instalación de Módulo Inteligente, Sistema de Control y Extinción de Incendios y Planta Eléctrica; el contratista cuenta con los equipos adquiridos para dar cumplimiento a la FASE I, no obstante, no se ha señalado como recibido por parte de la Entidad, dado que no ha realizado el total de las adecuaciones técnicas, eléctricas y lógicas en sitio, para que los equipos queden instalados. Ya se realizó la instalación de la planta eléctrica, con plancha y cajas de paso. El pendiente de la Entidad (DCCEE) de ductos en el cárcamo de la subestación eléctrica para paso de conductores a la planta eléctrica fue solucionado el 4 de junio de 2024.

De la fase II se ha realizado la instalación de la red eléctrica normal y regulada y las adecuaciones para instalación de canaleta y escalerilla para el paso de conductores eléctricos y lógicos, se han realizado las instalaciones eléctricas desde transferencias automáticas de planta eléctrica, el culminar la instalación eléctrica el contratista debe tramitar el certificado RETIE.

De la fase III que corresponde a traslados, esta puede adelantarse una vez culminadas las fases I y II, se planea hacer una modificación contractual mediante prórroga sin adición de recursos. La fase IV de estabilización se comienza una vez culmine la fase III.

d. Retrasos, Dificultades y Soluciones

Como novedad se presenta trámite de suspensión de la conectividad en 6 sedes educativas, esto en razón a las obras que viene desarrollando la Dirección de Construcciones lo cual requirió la desconexión de la red LAN.

Se ha identificado un alto volumen de fallas en la red de Fibra Óptica del ISP ETB, situación que ha impactado la prestación de servicios de conectividad en las sedes educativas, a esta novedad desde la OTIC se ha requerido a ETB para priorizar la atención a las fallas, también se han realizado mesas de trabajo conjuntas para buscar opciones y alternativas de solución.

6.2.3. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto

Tabla 4 Contratos segundo trimestre 2024

Componente de Gasto	Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. De Contratos al 31/05/2024	Valor Ejecutado
01 INNOVACION Y MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA DE TI	Adquisición de herramientas informáticas para la migración de aplicaciones y desarrollo de nuevos sistemas de información que soporten la gestión del cambio de TI	1	1	\$ 2.215.877.317

Componente de Gasto	Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. De Contratos al 31/05/2024	Valor Ejecutado
	Contar con apoyo profesional, técnico y asistencial que apoye los procesos de modernización, operación y mantenimiento de la plataforma de TI de la entidad	70	69	\$ 4.141.326.832
	Realizar el soporte y la renovación de licenciamientos de los tres niveles (central, local e institucional) de la Secretaría de Educación y los servicios asociados	7	6	\$ 5.891.492.998
02 CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI	Administrar la plataforma tecnológica del Centro de Gestión y centro de cómputo, y brindar servicio de la mesa de ayuda y suministro de bolsa de repuestos y periféricos para los equipos de cómputo de la SED	2	2	\$ 9.989.461.625
	Adquisición de recursos informáticos para la modernización de la infraestructura de TI que soporta la plataforma tecnológica de la entidad	0	0	\$0
	Ampliar e implementar servicios de conectividad y wifi para los tres niveles de la sed (central, local e institucional)	2	1	\$60.086.150.147

Fuente: Elaboración propia y cruce con cifras obtenidas del sistema Apoteosys

7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

7.1. Meta Plan 1. 100% de colegios públicos operando (92)

Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con

mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional.

7.1.1. Avances, logros y compromisos

El proyecto de inversión ha generado durante el segundo trimestre del 2024, los siguientes logros:

Se garantiza el funcionamiento del 100% de las instituciones educativas distritales, en cuanto a la prestación de los servicios tecnológicos. A lo anterior hay que sumar las labores de aumento de velocidad, logrando que se llegue en varias sedes educativas del distrito a 512 Mbps, que aseguran con suficiencia las condiciones para la labor docente y estudiantil en las instituciones educativas.

La adecuación de un data center alternativo, brinda una capa más de protección a la disponibilidad de los servicios de tecnologías de información, previniendo que, frente a desastres naturales, fallos de energía prolongados, ataques terroristas y otras acciones de sabotaje, se cuente con una instalación física que pueda ser puesta en funcionamiento en el momento en que se deje de operar el centro de datos principal.

Se logró la integración de nuevos sistemas de información, realizando en lo corrido del año mejoras significativas en los sistemas MUVI, SAE, HUMANO, SMECE. Al mismo tiempo se da soporte y mantenimiento a las soluciones previamente integradas (Premio a la Innovación SIDRE, POA, SACE, Jóvenes a la U, Brechas Digitales, Vacantes provisionales). Cumpliendo la meta de 10 sistemas de información integrados para el cuatrienio.

7.1.2. Retrasos y soluciones

El proyecto de adecuación del Data center alternativo, presentó retrasos por parte del contratista. Frente a los requerimientos hechos desde la Entidad, el contratista ha presentado un cronograma ajustado y ha intensificado la velocidad de ejecución de las labores, con lo que espera mitigar el impacto en las tres primeras fases del proyecto. Los costos de la cuarta y última fase (Monitoreo y estabilización) serán asumidos en su totalidad por el contratista.

7.1.3. Beneficios

1. Las 651 sedes educativas y los edificios de Nivel Central y el Centro de Innovación cuentan con el servicio de conectividad, garantizando un mínimo de 60MB para las instituciones educativas, permitiendo que más de 780.000 ciudadanos, conformados por estudiantes, docentes y directivos docentes accedan a un servicio de internet de alta calidad.
2. Los 10 sistemas integrados se han construido bajo una arquitectura moderna que facilita la implementación de mejoras y la comunicación con sistemas internos y externos. Al mismo tiempo, aprovechan el nuevo hardware, lo que se traduce en mejores tiempos de respuesta para los usuarios finales, es decir, personal administrativo, docente, contratistas, estudiantes y comunidad en general. Gracias a Asistencias Técnicas, las IED pueden radicar y hacer seguimiento de las solicitudes de necesidades de apoyo administrativo, mediante SIDRE, se facilita la radicación y priorización de necesidades de dotación en las IED, las mejoras en Apoyo

Escolar están orientadas a una mejor administración de la labor docente, la facilidad en el uso y el monitoreo de la solución.

3. Con la transición de IPv4 a IPv6 se obtienen (a) Seguridad mejorada: IPv6 incluye compatibilidad integrada con IPSec, un conjunto de protocolos que proporciona seguridad de red, autenticación y servicios de cifrado. Esto puede ayudar a mejorar la seguridad y la privacidad de los datos transmitidos a través de Internet y (b) Preparación para el futuro: IPv6 está diseñado para satisfacer las necesidades de futuras aplicaciones y tecnologías de red, como Internet de las cosas (IoT), que pueden requerir un gran número de direcciones IP y configuraciones de red especializadas.

8. CONCLUSIONES

1. El proyecto de inversión ha permitido que se lograra la modernización de la infraestructura tecnológica, desde varios frentes: la flexibilización de servidores con la solución de hiperconvergencia HCI, el respaldo de la información con las herramientas de backup, la protección frente a amenazas con la solución de seguridad perimetral y el mejoramiento de las comunicaciones con la incorporación del protocolo IPv6.
2. Dentro de las actividades de administración del data center, por parte del Operador Tecnológico. Se recomienda realizar la actualización de sistema operativo y motor para la gestión de base de datos en varios de los servidores. Se reporta que algunos de ellos emplean como sistema operativo Windows Server 2008, al que Microsoft ya dejó de dar soporte y de generar actualizaciones de seguridad.

FIRMA:



RICARDO ABAD CHACÓN IBARRA
Jefe de Oficina de Tecnología
de la Información y Comunicaciones

Gerente de Proyecto de inversión 7813
