



INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO 7774
“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ D. C.”

VIRGINIA TORRES MONTOYA
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES

Elaborado por:
JHON HENRY HERRERA
LAURA MILENA ÁVILA RUIZ

SEPTIEMBRE DE 2023

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
1.1 Objetivo General.....	3
1.2 Objetivos Específicos	3
2. ALCANCE DEL PROYECTO	3
3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA.....	4
3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada.....	4
3.2 Ejecución Presupuestal por Componente	5
3.3. Ejecución Reservas Presupuestales.....	6
4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	7
4.1. Objetivo Específico 1	7
4.1.1 Producto 1	7
4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1	7
4.1.2.1 Meta 1	7
4.2 Objetivo Específico 2.....	14
4.2.1 Producto 2	14
4.2.1.1. Meta 2	14
4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto.....	15
4.3 Objetivo Específico 3	16
4.3.1 Producto 3	16
4.3.1.2. Meta 3	16
4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto.....	17
5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	18
5.1 Meta Plan	18
5.1.1 Logros, avances y compromisos	18
5.1.2 Retrasos y soluciones	23
5.1.3 Beneficios	23

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Ejecución Presupuestal septiembre 2023

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de septiembre de 2023

Lista de Tablas

Tabla 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de septiembre de 2023

Tabla 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de septiembre de 2023

Tabla 3. Productos

Tabla 4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 *Objetivo General*

Implementar estrategias para prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá D. C.

1.2 *Objetivos Específicos*

- Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.
- Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.
- Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Las líneas de acción del proyecto 7774 se desarrollarán a través de tres componentes:

Componente 1: Educación Integral en Sexualidad:

- ✓ Se fortalecerán los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad de las I.E.D., a partir de la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- ✓ Se realizará acompañamiento técnico pedagógico, dirigido a los colegios oficiales del distrito, urbanos y rurales (399); en específico de 130 colegios durante el 2021.
- ✓ Se brindará asistencia técnica lo cual posibilitará la transferencia de metodologías y desarrollos didácticos.
- ✓ Se desarrollarán sesiones de sensibilización, intercambio de saberes y cualificación a docentes, directivos docentes, orientadores y padres, madres y cuidadores.

Componente 2: Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana:

- ✓ Este componente, parte del reconocimiento de las múltiples causas de los embarazos tempranos en niñas y adolescentes, así como los efectos diferenciados, tanto para quienes viven la situación, como para sus familias y las implicaciones en los contextos escolares.
- ✓ Reconoce que para prevenir este fenómeno es fundamental un trabajo fuerte de articulación interinstitucional, que garantice una atención integral a los y las estudiantes en situación de embarazo o experiencia de maternidad y/o paternidad temprana.

Componente 3: Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

- ✓ Se formulará e implementará la Ruta de Acompañamiento Pedagógico para la definición y actualización de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS a través de la convocatoria de las redes locales de orientadores del distrito.
- ✓ Se realizará acompañamiento, asistencia y seguimiento a demanda en el tema de Sexualidad y Ética del Cuidado.
- ✓ Se desarrollarán acciones de apoyo técnico que contribuyan a la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las I.E.D. rurales y urbanas.
- ✓ Se elaborará y distribuirá material pedagógico que oriente el diseño y ajuste de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS, explicitando el enfoque y abordaje de los derechos sexuales y derechos reproductivos para el contexto escolar.

3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1 Ejecución Presupuestal Acumulada

Para la vigencia 2023 el Proyecto 7774 cuenta con una asignación presupuestal de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$900.000.000 M/cte.), los cuales se encuentran distribuidos en 3 componentes. En el tercer trimestre del año fueron comprometidos recursos por valor de \$ 807.451.000 que corresponden al 89.7% del total asignado. Adicionalmente, en el tercer trimestre del año fueron adelantados desembolsos por valor de cuatrocientos noventa y ocho millones quinientos mil treinta y tres pesos moneda corriente (\$498.533.000 M/cte.).



Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys – Septiembre 30 de 2023

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

3.2 Ejecución Presupuestal por Componente


Teniendo en cuenta los recursos asignados a cada uno de los componentes del Proyecto de Inversión 7774, los recursos comprometidos por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 1. Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de septiembre de 2023

Componente	Asignación Vigente 2023	Recursos Comprometidos	%	Recursos Girados	%
01 Educación Integral en Sexualidad	\$231.603.000	\$206.124.000	89,0%	\$128.284.000	55,4%
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$151.129.000	\$140.900.000	93,2%	\$87.777.000	58,1%
03 Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos	\$517.268.000	\$460.427.000	89,0%	\$282.472.000	54,6%
Total	\$900.000.000	\$807.451.000	89,7%	498.533.000	55,4%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys – septiembre 30 de 2023

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal por Componentes a 30 de septiembre de 2023

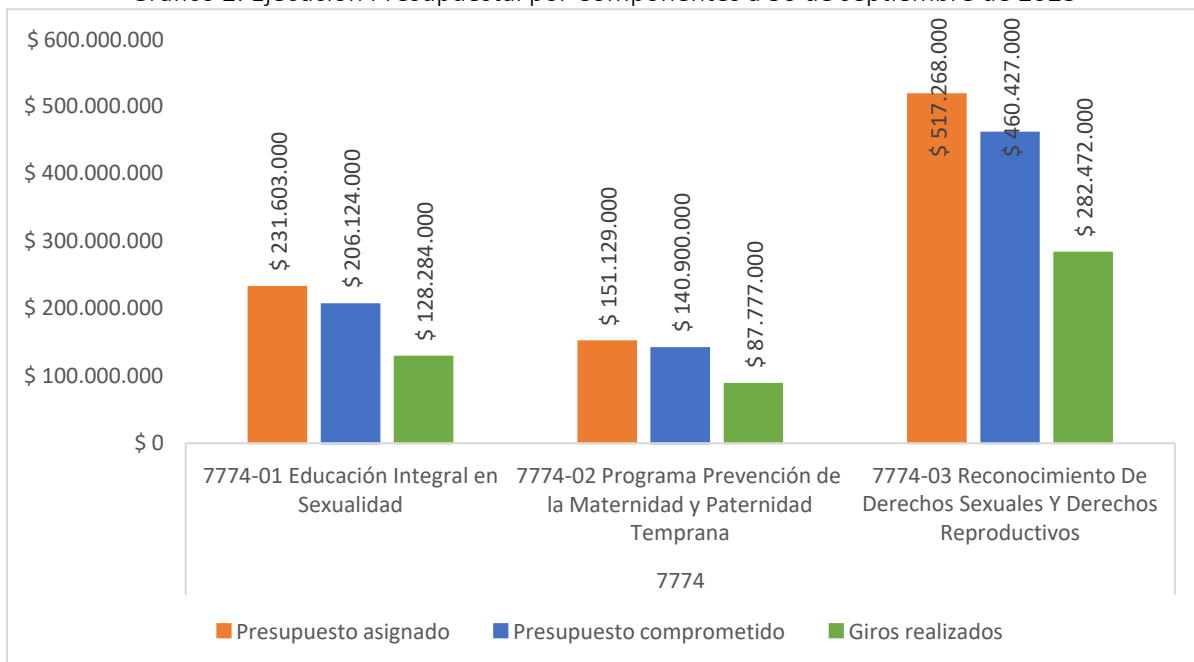

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys – septiembre 30 de 2023

En el componente 1 - Educación Integral en Sexualidad, para el segundo trimestre del 2023 cuenta con una asignación de \$231.603.000, de los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$206.124.000 que representa el 89% de la apropiación disponible, correspondientes a 4 Contratos de prestación de Servicios. De acuerdo con lo anterior, se han girado recursos por valor de \$128.284.000 que representa el 55,4% de la asignación presupuestal vigente.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

En el componente 2 - Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana cuenta con una asignación de \$151.129.000, de los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$140.900.000 que representa el 93% de la apropiación disponible, correspondientes a 2 Contratos de prestación de Servicios. De acuerdo con lo anterior, se han girado recursos por valor de \$87.777.000 que representa el 58,1% de la asignación presupuestal vigente.

En el componente 3 - Reconocimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, para el presente trimestre cuenta con una asignación de \$517.268.000, de los cuales fueron comprometidos recursos por valor de \$460.427.000 que representa el 89% de la apropiación disponible, correspondientes a 9 Contratos de prestación de Servicios. De acuerdo con lo anterior, se han girado recursos por valor de \$282.472.000 que representa el 54,6% de la asignación presupuestal vigente. Adicionalmente, se menciona que hubo una terminación anticipada de un contrato por prestación de servicios profesionales por valor total de \$ 33.520.000, por lo tanto, se liberó un saldo de CRP por valor de \$32.403.000, el cual redujo en el último trimestre el valor comprometido en el componente.

3.3. Ejecución Reservas Presupuestales

Las reservas constituidas para el año 2023 en el proyecto 7774 ascendieron a \$ 14.114.200 de los cuales fueron girados en el primer trimestre el 100% de los recursos. La distribución y ejecución de las reservas presupuestales por cada componente se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No 2. Ejecución reservas presupuestales del Proyecto de Inversión 7774 a 30 de junio de 2023

Componente	Reservas Constituidas 2022	Reservas Giradas	% de Giro
01 Educación Integral en Sexualidad	\$ 5.771.200	\$ 5.771.200	100%
02 Programa Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana	\$ 8.343.000	\$ 8.343.000	100%
Total	\$ 14.114.200	\$ 14.114.200	100%

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotelesys – septiembre 30 de 2023.

Con corte a 30 de septiembre al interior del Proyecto 7774 se constituyeron reservas presupuestales para la vigencia 2023 por valor de \$ 14.114.200, correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales los cuales se detallan por componente a continuación.

Componente	Reservas 2022	Justificación
01 Educación Integral en Sexualidad	\$ 5.771.200	Contratos de prestación de servicios profesionales, que se constituyeron como reserva presupuestal, ya que fue necesario realizar prórroga de estos contratos para cumplir con los objetivos del Proyecto, dado que no existe suficiente personal de planta para adelantar las actividades del Proyecto durante las el mes de febrero de la vigencia 2023 y la Dirección de Inclusión requiere de un equipo profesional y técnico que apoye los procesos de contratación, los requerimientos de los organismos de control y los trámites y gestiones administrativas, financieras y jurídicas.
02 Programa Prevención de la	\$ 8.343.000	Contrato de prestación de servicios profesionales especializados, el cual fue modificado y adicionado con el fin garantizar la ejecución de acciones técnicas

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Maternidad y Paternidad Temprana		y pedagógicas, para la garantía del derecho a la educación con calidad y pertinencia de los grupos de especial protección constitucional.
Total	\$ 14.114.200	

4. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución por cada objetivo específico del proyecto 7774 y sus metas asociadas, señalando las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada meta.

4.1. Objetivo Específico 1.

Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas distrito.

4.1.1 Producto 1: Entes territoriales asistidos técnicamente

Tabla 3. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 1.1: Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia.	130	94	Con corte a 30 de septiembre de 2023, se han acompañado a 94 instituciones educativas de 16 localidades con 327 actividades pedagógicas orientadas a promover la Educación Integral en Sexualidad-EIS para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en el ámbito escolar, con la participación de 593 docentes, orientadores y coordinadores, 104.540 estudiantes y 1.188 padres, madres de familia, acudientes y cuidadores.

Fuente: Informe 7774_SEGUIMIENTO_2023_NCSA_SEPTIEMBRE. La programación en SUIFP es tipo suma (94 IED más 264 que vienen de las vigencias 2020-2022) y en SEGPLAN tipo incremental, por lo cual se acompañaron a 358 IED.

4.1.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo 1

4.1.2.1 Meta 1: Implementar en 399 colegios estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros

Con corte a 30 de septiembre de 2023, se acompañaron a 358 instituciones educativas (de las cuales 264 corresponden a las vigencias 2020-2022 y 94 de vigencia 2023), con la realización de 327 actividades pedagógicas (talleres, conversatorios y ferias) y la participación de 104.540 estudiantes, para fortalecer los proyectos de educación integral en sexualidad en las instituciones educativas de Bogotá D. C.

Información detallada con los logros a septiembre de 2023

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Para el tercer trimestre del 2023, el equipo de profesionales realizó el proceso de acompañamiento pedagógico con 327 actividades pedagógicas en 94 instituciones educativas de las 130 priorizadas para la vigencia 2023, implementando estrategias que promueven la Educación Integral en Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Las acciones y los temas que se desarrollan en la implementación de las estrategias pedagógicas programadas en cada institución educativa distrital para cada población de la comunidad educativa son:

Estudiantes

- REFLEXIONAR SOBRE LAS DESIGUALDADES Y LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD.
Aclarar las categorías y los conceptos asociados a la identidad y diversidad sexual, así como las distintas expresiones de violencia de género, esto con el ánimo de sensibilizar a los estudiantes y las estudiantes sobre la importancia del reconocimiento de la diversidad y el respeto por la diferencia.
- DIÁLOGO CONCEPTUAL PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE
Aclarar que la sexualidad va más allá de las relaciones sexuales y entender cómo se produce el embarazo, cuales son y cómo se utilizan los métodos anticonceptivos, abordando de acuerdo con la edad, los conceptos de Género, Identidad de género, Expresión de Género, Orientación sexual, Sexo biológico, Reproducción, Gestación y Anticoncepción.
- SIGNIFICADOS SOBRE LA MASCULINIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA
Reflexionar sobre las paternidades para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente a partir del cuestionamiento de la masculinidad hegemónica.
- PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MI PROYECTO DE VIDA
Dialogar sobre la diversidad de opciones en torno al proyecto de vida y las distintas dimensiones del ser (religión, familia, preferencias sexuales, laborales, académicas), suscitando la reflexión sobre la necesidad de planear la maternidad, la paternidad, la profesión, la relaciones, el tipo de personas que se desea ser, yendo más allá de lo económico, laboral y educativo.
- RESPONSABILIDAD AFECTIVA Y AMOR ROMÁNTICO
A bordar desde un enfoque de Educación Integral en Sexualidad, la responsabilidad afectiva y los mitos amorosos en los jóvenes, como parte del desarrollo sano y aporte a su definición de proyecto de vida.



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

- **DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE**
Divulgar elementos y conceptos alrededor de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y su importancia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
- **MI CUERPO, MI TERRITORIO: PRÁCTICAS DE AUTORRECONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO Y EL AUTOCUIDADO**
Abordar desde las distintas dimensiones del ser (físico, sexual, cognitivo, afectivo-pisco- social), el reconocimiento del cuerpo, las emociones, las sensaciones y las prácticas de cuidado y autocuidado.

Actividades complementarias

- **SEMILLEROS DE INNOVACIÓN EIS**
Creación de Semilleros de Innovación en Educación Integral para la Sexualidad, con enfoque de género cuyo fin está orientado al fortalecimiento de capacidades de las estudiantes y los estudiantes para la creación de estrategias que permitan abordar situaciones problema alrededor del desarrollo de la sexualidad y la diversidad, en su institución educativa y transformar el entorno escolar de manera colectiva, convirtiéndose en jóvenes líderes en Educación Sexual y Enfoque de Género.
- **FERIAS**
Espacios de articulación interinstitucional para el abordaje de la Educación Integral en Sexualidad como herramienta para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
- **GIRA DISTRITAL "MIS DERECHOS CONOZCO MIS DERECHOS EJERZO" DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 8 (OCTAVO) A 11 (ONCEAVO) GRADO.**
Esta acción lúdico-pedagógica permite acercar el mensaje y la reflexión sobre la importancia de la prevención de embarazo en adolescentes, por medio de una ambientación pedagógica itinerante que convoca a la participación y expresión de los integrantes de la comunidad educativa.

Docentes

- **ARTICULÉMONOS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN LAS IED PRIORIZADAS**
Dialogar en torno a las necesidades y su priorización para el acompañamiento frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad, con énfasis en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en las IED.
- **ORIENTACIONES PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD**

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Aportar en el proceso de implementación de los proyectos de educación en sexualidad de las instituciones educativas, por medio de la construcción conjunta de una herramienta de seguimiento al proyecto.

- **EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL**
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la EIS y los efectos positivos para el autoconocimiento y una mejora de su actitud en lo que respecta a la salud y los comportamientos sexuales y reproductivos.
- **EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y ESTRATEGIAS EN EL AULA**
Dialogar sobre la importancia de implementar estrategias de Educación Integral en Sexualidad en el aula y reconocer diferentes estrategias que los docentes y las docentes han utilizado para realizarlo.
- **ACOMPañAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PEIS**
Asistir a las IED en el proceso de actualización de los PEIS para promover la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
- **DIÁLOGO CONCEPTUAL PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE**
Aclarar que la sexualidad va más allá de las relaciones sexuales, entender cómo se produce el embarazo, cuáles son y cómo se utilizan los métodos anticonceptivos, abordando, de acuerdo con la edad, los conceptos de Género, Identidad de género, Expresión de Género, Orientación sexual, Sexo biológico, Reproducción, Gestación y Anticoncepción.

Los colegios acompañados hasta septiembre de 2023 fueron:

Número de localidad	Establecimiento educativo	Cantidad de estudiantes participantes
1	COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)	2511
1	COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	2065
1	COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	837
1	COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)	1142
1	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	1036
2	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	461
2	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	799
3	COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	1010
3	COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)	919
3	COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	992



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

3	COLEGIO LOS PINOS (IED)	650
3	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	933
4	COLEGIO AGUAS CLARAS (IED)	136
4	COLEGIO ATENAS (IED)	771
4	COLEGIO EL MANANTIAL (CED)	16
4	COLEGIO EL RODEO (IED)	1377
4	COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)	1251
4	COLEGIO GRAN COLOMBIA (IED)	80
4	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	450
4	COLEGIO JUAN REY (IED)	740
4	COLEGIO SAN VICENTE (IED)	1133
5	COLEGIO BRAZUELOS (IED)	633
5	COLEGIO GRAN YOMASA (IED)	1449
5	COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA (IED)	570
5	COLEGIO LOS TEJARES (IED)	839
5	COLEGIO RURAL CHIZACA (CED)	7
5	COLEGIO RURAL LA MAYORIA (CED)	40
5	COLEGIO RURAL LA UNION USME (CED)	7
5	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES (CED)	27
5	COLEGIO RURAL LOS ANDES (CED)	6
5	COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	137
7	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	959
7	COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	1262
8	COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)	668
8	COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)	1775
8	COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	2012
8	COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)	1275
8	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	1837
8	COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)	1414
8	COLEGIO O.E.A. (IED)	2245
8	COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)	1237
8	COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	2380
8	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)	2106
8	COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	1907
10	COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED)	
10	COLEGIO CHARRY (IED)	1668
10	COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	1657



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

10	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	441
10	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	1500
10	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	664
10	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	808
10	COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	740
10	COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	1197
10	COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	1845
10	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	1590
10	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	2136
11	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	1043
11	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	3030
11	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	437
11	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	1875
11	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	1732
11	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	1370
11	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	2954
11	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	2602
12	COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)	647
12	COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	939
12	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	1381
12	COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	885
12	COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED)	623
13	COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	1231
14	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	624
14	COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	1445
14	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	516
14	COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)	976
14	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	1077
16	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	306
16	COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	1007
18	COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	1859
18	COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)	802
18	COLEGIO LA PAZ (CED)	320
18	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	3885
18	COLEGIO PALERMO SUR (CED)	1026
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	1165
18	COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)	535



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

18	COLEGIO SANTA LUCIA (IED)	1069
19	COLEGIO CANADA (IED)	714
19	COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)	729
19	COLEGIO EL NOGAL (IED)	865
19	COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	1627
19	COLEGIO LA JOYA (IED)	836
19	COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	302
19	COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)	1272
19	COLEGIO VILLAMAR (IED)	425
20	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	214

Durante el tercer trimestre también se destacó la ejecución de la Gira Distrital "Mis derechos conozco, mis derechos ejerzo" dirigida a estudiantes de 8vo a 11avo grado en los colegios Técnico Palermo (IED) de la localidad de Teusaquillo, La Estrellita (IED) de la localidad de Usaquén y el Instituto Técnico Industrial Piloto (IED) de la localidad de Tunjuelito. Esta acción lúdico-pedagógica permitió acercar el mensaje y la reflexión sobre la importancia de la prevención de embarazo en adolescentes por medio de una ambientación pedagógica itinerante que convocó a la participación y expresión de los y las personas de la comunidad educativa.

De igual manera se destaca la realización de ferias (encuentros por la sexualidad) y cine foros en los colegios CEDID Ciudad Bolívar (IED), Orlando Fals Borda (IED), Gran Yomasa (IED), Simón Rodríguez (IED), Compartir Recuerdo (IED), Juana Escobar (IED), Técnico Aldemar Rojas Plazas (IED), Rural Quiba Alta (IED).

b. Retrasos, dificultades y soluciones.

Se han presentado algunos casos en donde las instituciones educativas manifiestan no estar interesadas en recibir las actividades propuestas por el proyecto, dado que ya no tienen espacio dentro de su calendario académico, o porque prefieren concentrar el acompañamiento brindado desde la SED en otras problemáticas que consideran más críticas de atender.

Como solución, se ha procedido a acudir a la DILE correspondiente, para que interceda e intente en solicitar el espacio al rector(a) o al orientador(a). Así se ha logrado agendar unos espacios para dar entrada al proyecto. A las instituciones que aún no se ha concertado el agendamiento, se han dejado como pendientes para las metas del 2024.

4.1.2.2 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto Tabla

4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Objeto de Gasto	No. de contratos programados	No. de contratos ejecutados en el segundo trimestre	Valor Ejecutado
Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran durante el desarrollo de las acciones para promover la Educación Integral en Sexualidad en las Instituciones Educativas Distritales.	4	4	\$ 128.284.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys.

4.2 Objetivo Específico 2

Realizar acciones conjuntas con “el programa distrital para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana” para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

4.2.1 Producto 2: Acciones ejecutadas con las comunidades

Tabla 5. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 2.1: Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos.	130	94	A 30 de septiembre en 94 colegios de 16 localidades, se llevaron a cabo 327 estrategias pedagógicas con el fin de incidir en los proyectos de vida de 593 docentes, 104.540 estudiantes y 1.188 padres, madres y cuidadores, con el ánimo de propender por el fortalecimiento del tejido social y de la reducción de brechas, estereotipos y violencias.

Fuente: Informe 7774_SEGUIMIENTO_2023_NCSA_JUNIO La programación en SUIFP es tipo suma (48 IED) y en SEGPLAN constante por lo cual corresponde a 100% de acciones ejecutadas con las comunidades.

4.2.1.1. Meta 2: Articular el 100% de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.

a. Logros

A 30 de septiembre se atendieron el 100% de las solicitudes de apoyo en el fortalecimiento de estrategias y acciones pedagógicas que se realizaron en vigencias anteriores con temáticas que abordan los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente, y el autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado, con el fin de reducir los estereotipos y las brechas culturales y sociales presentes en el contexto escolar, en que corresponden a 28 colegios: Colegio Toberín (IED), Colegio La Victoria (IED), Colegio Chuniza (IED), Colegio Ciudad de Villavicencio (IED), Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto (IED), Colegio Usaquén (IED), Colegio Alberto Lleras Camargo (IED), Colegio Heladia Mejía (IED), Colegio Antonio Baraya (IED), Colegio Estrella del Sur (IED), Liceo Contadora, Colegio Luis Ángel Arango (IED), Colegio Cedit Ciudad

*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ*

Bolívar (IED), Colegio Abel Rodríguez Céspedes (IED), Colegio Gloria Valencia de Castaño (IED), Colegio La Arabia (IED), Colegio Los Alpes (IED), Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED), Colegio Orlando Fals Borda (IED), Colegio Rodrigo Arenas Betancourt (IED), Colegio San José de Castilla (IED), Colegio Arborizadora Alta (IED), Colegio Ciudad de Bogotá (IED), Colegio General Santander (IED), Colegio Integrado Eduardo Caballero Calderón (IED), Integrada La Candelaria (IED), Colegio Rafael Uribe Uribe (IED) y el Colegio Gonzalo Arango (IED). De igual manera, se han propiciado espacios de articulación con otras entidades del distrito para llevar a cabo cuatro encuentros o ferias de sexualidad en los colegios Juana Escobar, Aldemar Rojas Plazas, San Cristóbal y el Rural Quiba Alta en el marco de la Semana Andina.

Información detallada con los logros a septiembre de 2023

Se atendieron las solicitudes de apoyo en el fortalecimiento de estrategias y acciones pedagógicas que se realizaron en vigencias anteriores para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente de los siguientes establecimientos: Colegio Toberín (IED), Colegio La Victoria (IED), Colegio Chuniza (IED), Colegio Ciudad de Villavicencio (IED), Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto (IED), Colegio Usaquén (IED), Colegio Alberto Lleras Camargo (IED), Colegio Heladia Mejía (IED), Colegio Antonio Baraya (IED), Colegio Estrella del Sur (IED), Liceo Contadora, Colegio Luis Ángel Arango (IED), Colegio Cedit Ciudad Bolívar (IED), Colegio Abel Rodríguez Céspedes (IED), Colegio Gloria Valencia de Castaño (IED), Colegio La Arabia (IED), Colegio Los Alpes (IED), Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED), Colegio Orlando Fals Borda (IED), Colegio Rodrigo Arenas Betancourt (IED), Colegio San José de Castilla (IED), Colegio Arborizadora Alta (IED), Colegio Ciudad de Bogotá (IED), Colegio General Santander (IED), Colegio Integrado Eduardo Caballero Calderón (IED), Integrada La Candelaria (IED), Colegio Rafael Uribe Uribe (IED) y el Colegio Gonzalo Arango (IED), los cuales expresaron la necesidad de implementar estrategias de educación integral en sexualidad, para lo cual se acordó una agenda de trabajo y se implementaron estrategias pedagógicas dirigidas a estudiantes con énfasis en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Se generaron espacios de articulación y coordinación para llegar a las instituciones educativas con la en el marco de la Semana Andina.

b. Retrasos y Dificultades

Aunque se ha incrementado la cantidad de solicitudes de acompañamiento pedagógico por parte de las instituciones educativas en temas sobre la Educación Integral en Sexualidad, durante este período no se evidencian dificultades.

4.2.1.2. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto Tabla

4. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. de Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
005 Prestar apoyo y/o asistencia técnica a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en el desarrollo de las actividades que contribuyan al acompañamiento para la prevención, atención y seguimiento del embarazo temprano en niñas, adolescentes y jóvenes en contexto escolar.	2	2	\$ 87.777.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apotelesys.

4.3 Objetivo Específico 3

Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

4.3.1 Producto 3: Instituciones y entidades asistidas técnicamente

* Tabla 5. Productos

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Producto 3.1: Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas.	130	94	A 30 de septiembre, en 94 colegios se implementaron 327 estrategias pedagógicas con la comunidad educativa para el reconocimiento de sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde participaron 593 docentes, 104.540 estudiantes y 1.188 padres, madres y cuidadores en 48 colegios de 16 localidades.

Fuente: Informe 7774_SEGUIMIENTO_2023_NCSA_SEPTIEMBRE. La programación en SUIFP es tipo suma y en SEGPLAN tipo incremental por ello el logro en SPI se reporta como 98 y en SEGPLAN el acumulado que es de 358.

4.3.1.2. Meta 3: Acompañar a 399 colegios en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.

a. Logros:

A 30 de septiembre se logró un porcentaje de avance del 90,86% de la meta, lo que equivale a un acompañamiento a 358 colegios distritales con estrategias pedagógicas que propenden por el reconocimiento de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

Las estrategias encaminadas a docentes y padres de familia facilitan la integración del proyecto con las acciones dirigidas a estudiantes, lo que incide directamente en la institución educativa para el

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

reconocimiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos como elemento primordial para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente. Adicionalmente se han brindado intervenciones en 28 colegios más como continuidad y fortalecimiento al acompañamiento realizado en vigencias anteriores.

Información detallada con los logros a septiembre 2023

El acompañamiento a las comunidades educativas permite articular el proyecto educativo de sexualidad de cada institución educativa con las acciones propuestas por el proyecto, incidiendo directamente en la institución educativa, en el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como elemento primordial en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.

Los temas dirigidos a padres, madres, acudientes y cuidadores son:

- **SEXUALIDAD EN FAMILIAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD**
Generar un espacio de diálogo con padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, para la construcción y el fortalecimiento de herramientas en Educación Sexual y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de toda persona, independientemente de su discapacidad.
- **HABLEMOS DE LA SEXUALIDAD EN FAMILIA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE**
Incentivar el acercamiento de los padres, madres y cuidadores a sus hijos e hijas, afianzando los conocimientos y las herramientas familiares para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente.
- **PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MI PROYECTO DE VIDA**
Dialogar sobre la diversidad de opciones en torno al proyecto de vida de las personas y el apoyo familiar necesario para entender el propósito de la prevención del embarazo.

b. Retrasos y dificultades

En este período no se evidencian retrasos.

4.3.1.3 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del proyecto

Tabla 6. Contratos realizados para el cumplimiento de la meta.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Objeto de Gasto	No. De contratos Programados	No. De Contratos Ejecutados en el trimestre	Valor Ejecutado
006 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones para la implementación, seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de Educación Integral en Sexualidad en las instituciones educativas distritales urbanas y rurales.	6	6	\$ 189.496.000
007 Prestar servicios y/o apoyo a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones en las actividades que se requieran para el fortalecimiento de los Proyectos de Educación Integral en Sexualidad PEIS.	3	3	\$ 92.976.000

Fuente: Ejecución presupuestal Sistema Apoteosys

5. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

5.1 Meta Plan (74): Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de práctica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores.

5.1.1 Logros, avances y compromisos:


A 30 de septiembre se logró avanzar en un 23,55% de colegios en el acompañamiento a las instituciones educativas durante la vigencia 2023; esto equivale a 94 colegios de 16 localidades donde se realizaron actividades como talleres, conversatorios y eventos donde participaron 104.540 estudiantes, 593 docentes y 1.188 padres de familia. Dentro de las actividades pedagógicas impartidas se encuentran: "Diálogo conceptual para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Mi cuerpo, mi territorio: Prácticas de autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado", "Responsabilidad afectiva y amor romántico", "Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y su importancia en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "Educación Integral en Sexualidad y Estrategias en el Aula", "Prevención del embarazo adolescente para la construcción de mi proyecto de vida", "Hablemos de la sexualidad en familia para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente", "EIS para la prevención de violencia sexual", "Reflexionar sobre las desigualdades y la violencia basada en género, como parte de la E.I.S.", que se enfocan en temáticas sobre la prevención del embarazo temprano y subsiguiente, autorreconocimiento para el cuidado y el autocuidado, y los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Se muestra como sigue, algunas evidencias fotográficas de las actividades realizadas con la comunidad educativa en los colegios:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ



Gira Distrital en el Colegio Técnico Palermo (IED) de la localidad de Teusaquillo.

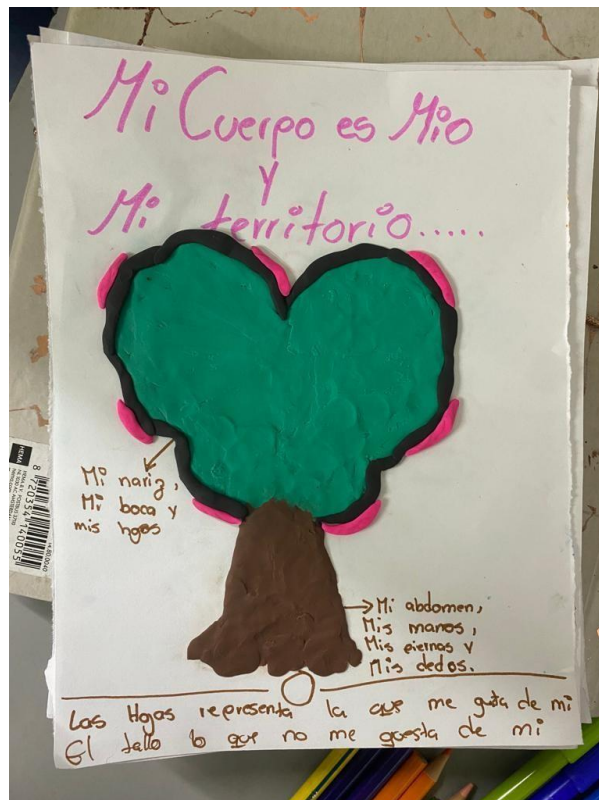

Taller "Mi cuerpo, mi territorio" en Colegio El Salitre - Suba (IED)




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ



Feria EIS en el Colegio Simón Rodríguez (IED) de la localidad de Chapinero

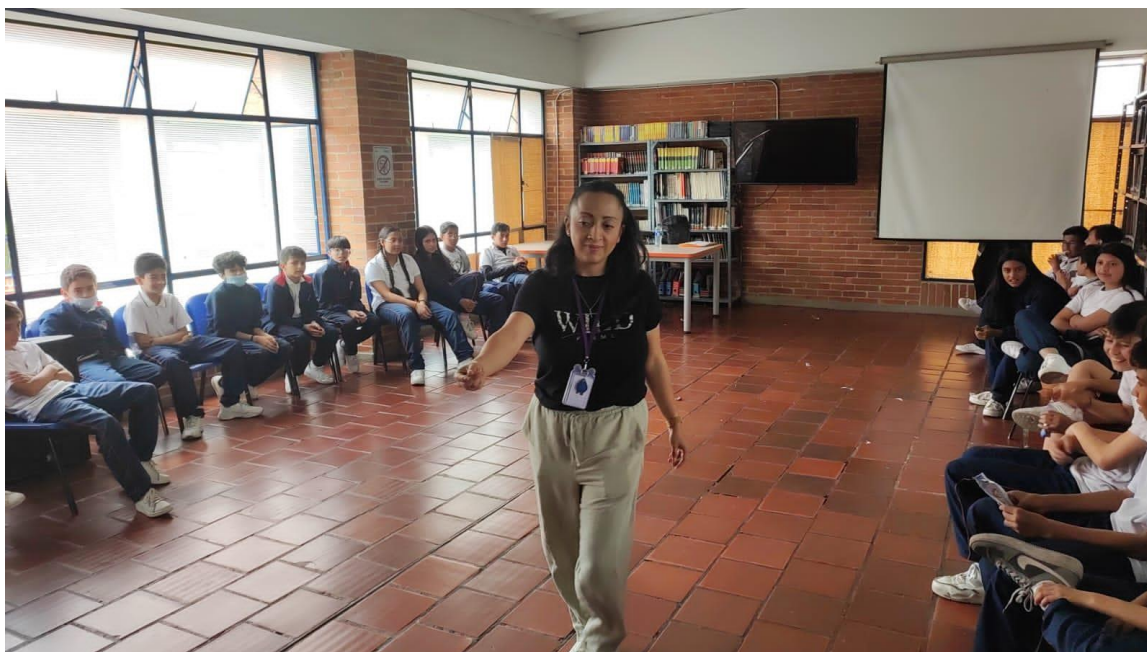

Taller de la profesional de acompañamiento en el Colegio Compartir Suba (IED)



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ



“Sexualidad al tablero” en el Colegio Ciudad de Bogotá (IED)



Actividades con enfoque diferencial en el Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto de la localidad de Tunjuelito



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ



Gira Distrital en el marco de la Semana Andina en el Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto



Taller “Hablemos de sexualidad en familia” para padres y madres en el Colegio San Ignacio (IED) de la localidad de Bosa.



IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

Se lleva un logro acumulado de la meta Plan de Desarrollo de 89,7% que equivale a 2,5% en 2020, 30% en 2021, 33,6% en 2022 y 23,55% en 2023. En número de colegios corresponde a 358 colegios así: 10 colegios en 2020, 120 en 2021, 134 en 2022 y 94 en 2023.

5.1.2 Retrasos y soluciones:

Se han presentado algunos casos en donde las instituciones educativas manifiestan no estar interesadas en recibir las actividades propuestas por el proyecto, dado que ya no tienen espacio dentro de su calendario académico, o porque prefieren concentrar el acompañamiento brindado desde la SED en otras problemáticas que consideran más críticas de atender.

Como solución, se ha procedido a acudir a la DILE correspondiente, para que interceda e intente en solicitar el espacio al rector(a) o al orientador(a). Así se ha logrado agendar unos espacios para dar entrada al proyecto. A las instituciones que aún no se ha concertado el agendamiento, se han dejado como pendientes para las metas del 2024.

5.1.3 Beneficios:

Se logró establecer las necesidades de las IED frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto.

El acompañamiento pedagógico que se ha realizado aporta a la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se obtiene como primer beneficio, una efectiva articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación. Se han beneficiado 48823 estudiantes, 519 docentes y 340 padres de familia.

Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

Además, el trabajo de prevención se reflejará en la ciudad con la disminución de embarazos tempranos y subsiguientes en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, priorizando en estudiantes un plan de vida que involucra la culminación de la formación en educación media y su vínculo a la educación media, tecnológica o superior, generando a futuro, inserción laboral y generación de proyectos productivos en beneficio de la ciudad.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO Y SUBSIGUIENTE EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ

CONCLUSIONES

El acompañamiento brindado por la Secretaría de Educación Distrital a colegios distritales mediante la ejecución del proyecto de inversión 7774 denominado “Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D. C.” ha logrado adelantar un proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad, aportando al cumplimiento de la meta programada en el Plan de Desarrollo Distrital y la establecida para la vigencia 2023.

El proceso se inicia con el acercamiento a las Direcciones locales donde se presenta el proyecto a las directivas de los colegios para posteriormente llegar a cada uno de los colegios que han sido priorizados, de acuerdo con los reportes de embarazo en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación hasta llegar a 399 IED en el cuatrienio.

Mediante el desarrollo de proyecto de inversión se logró responder a las necesidades de las Instituciones Educativas Distritales (IED) frente al tema de la Educación Integral en Sexualidad y trazar una ruta de acompañamiento que permita prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población objetivo del proyecto.

El acompañamiento pedagógico realizado en las I.E.D. aporta a la prevención de la maternidad temprana y subsiguiente y la disminución en la tasa de embarazos tempranos, en la población estudiantil de las instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá. En este sentido, se presentó una efectiva articulación e intercambio de saberes entre las distintas I.E.D. de cada localidad y el Equipo de Educación Integral en sexualidad de la Secretaría de Educación. Se destaca la participación e interés de los padres, madres y cuidadores de los estudiantes de los colegios acompañados, en el tema de la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, ofreciéndoles herramientas que les permiten realizar un acompañamiento oportuno y acertado a sus hijos e hijas.

El impacto de este proyecto para la ciudad se verá reflejado en la disminución de embarazos tempranos y subsiguiente en la población estudiantil, promoviendo la priorización en los adolescentes y jóvenes de la construcción de proyectos de vida que les permitan la culminación de estudios en educación media y el acceder a la educación tecnológica y superior con la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos, sus familias y su comunidad.



VIRGINIA TORRES MONTOYA

Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones

Gerente del Proyecto

Elaboró: Jhon Herrera, Profesional Universitario, Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.

Consolidó y revisó: Laura Milena Ávila, Contratista Profesional, Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.

Aprobó: Virginia Torres Montoya, directora de Inclusión e Integración de Poblaciones.
